


# **ADAC: Road to HANA**


## **Org-Chart Realize-Phase**

*Stand 10/2025*

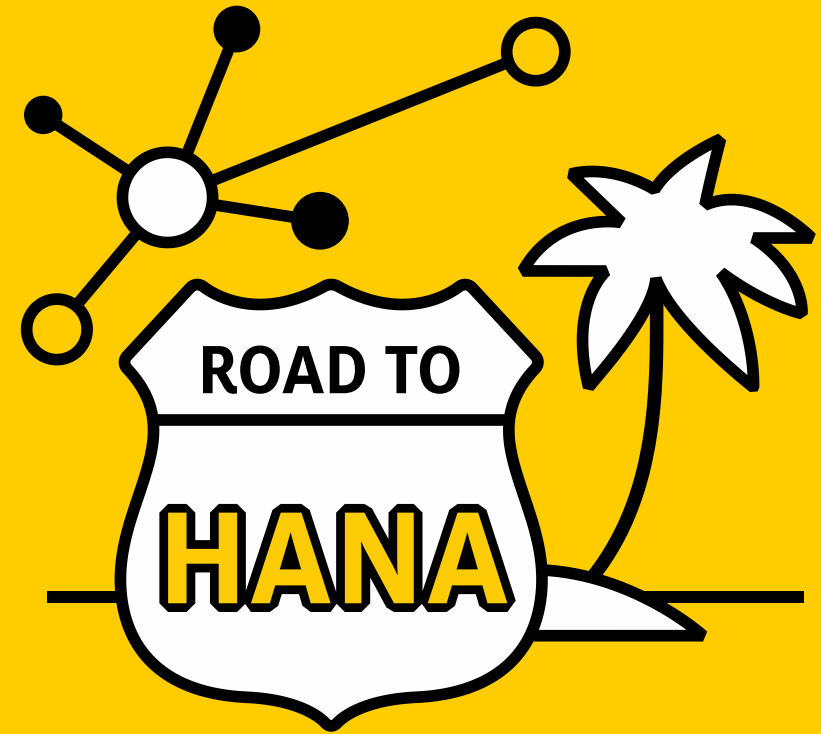

# ADAC: Road to HANA – Org-Chart Realize-Phase (Stand 11/2025)

## Programm Road to HANA

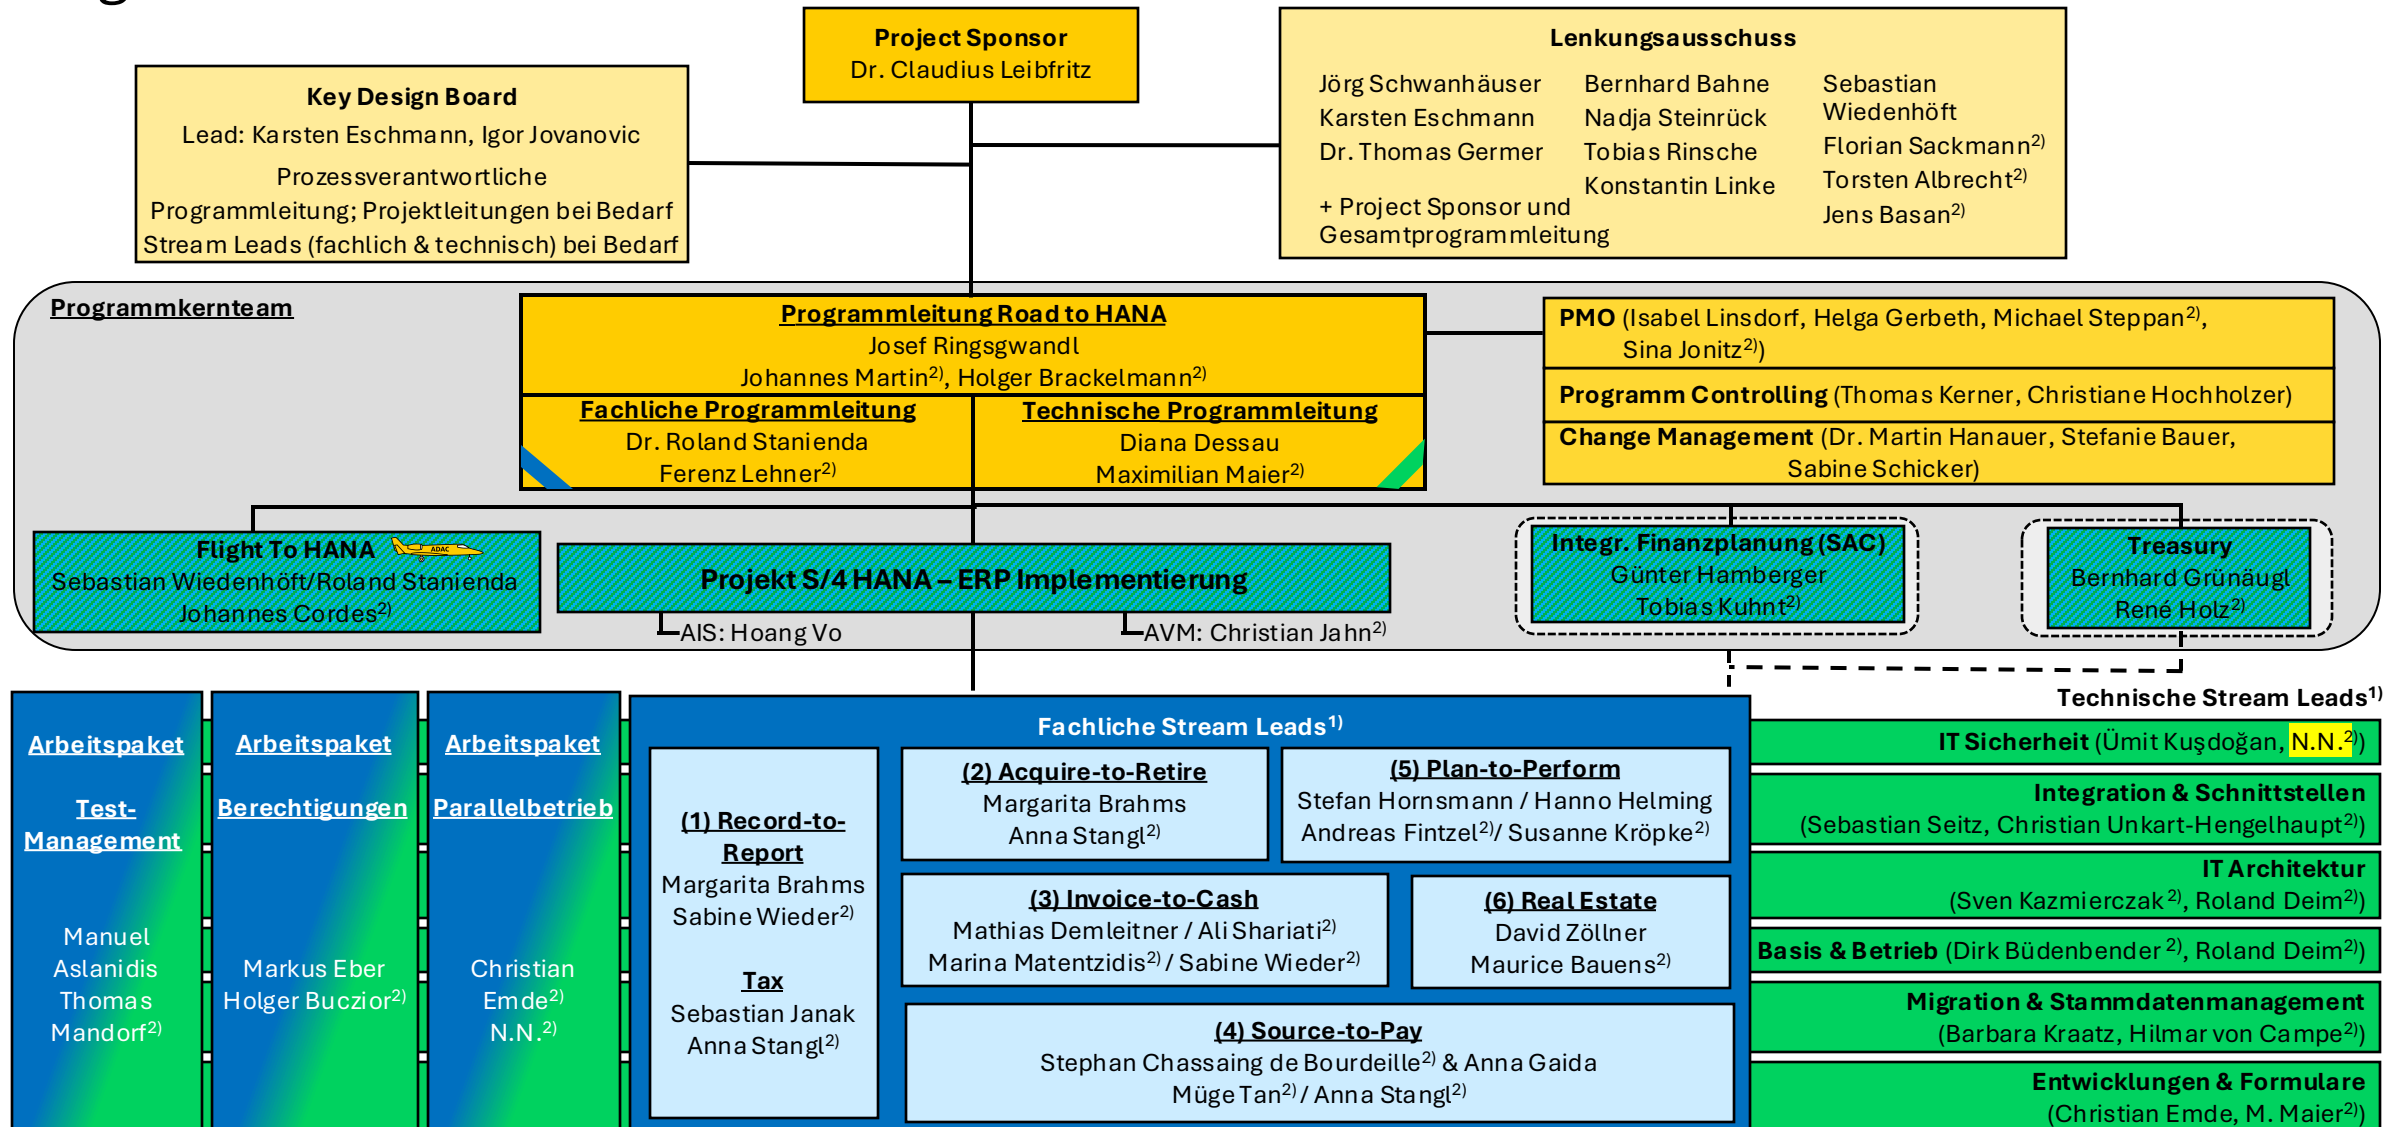

<sup>1)</sup> Jeder Stream wird durch best. „Subject Matter Experts“ bzw. IT-Modulverantwortliche unterstützt; zudem werden teilw. noch weitere ext. Berater für Restarbeiten der techn. Konzeption eingesetzt

<sup>2)</sup> Externe Kolleginnen & Kollegen


<sup>3)</sup> Kommissarischer Lead

# ADAC: Road to HANA – Org-Chart Realize-Phase (Stand 07/2024)

Projekt Integrierte Finanzplanung (SAC) – MVP 2


To be updated (MVP2)

G. Hamberger

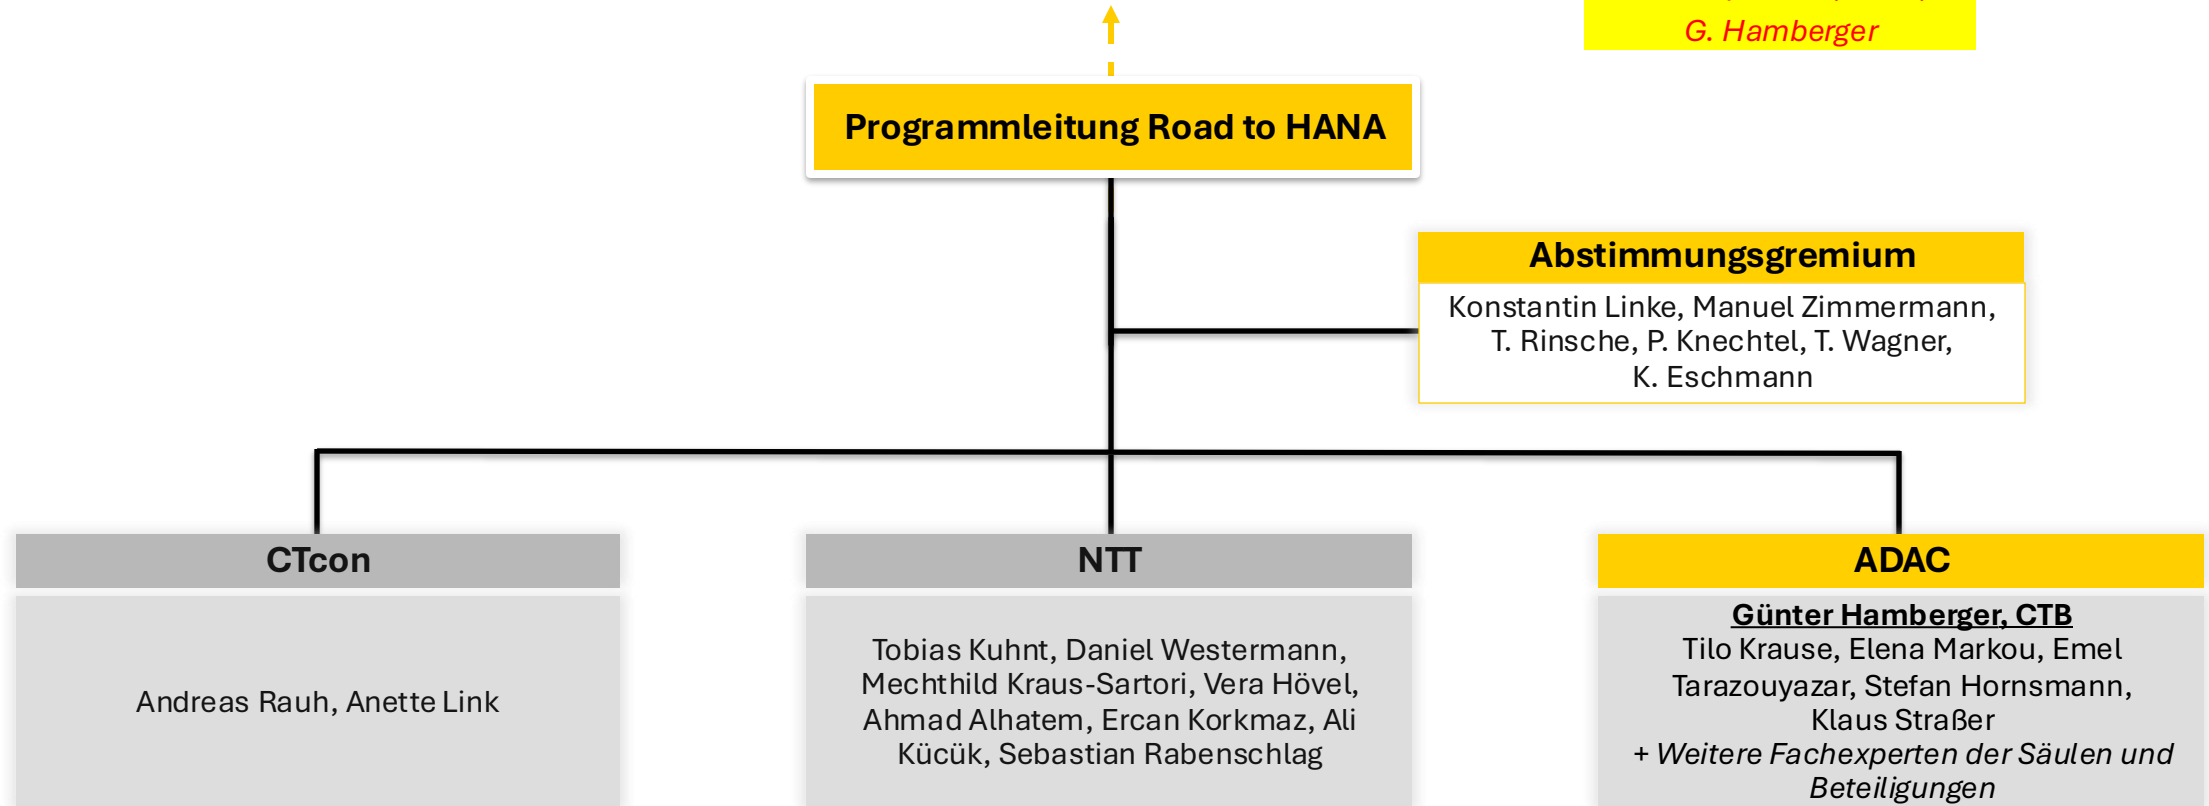

# ADAC: Road to HANA – Org-Chart Realize-Phase (Stand 05/2025)

*Teil-Projekt Treasury*

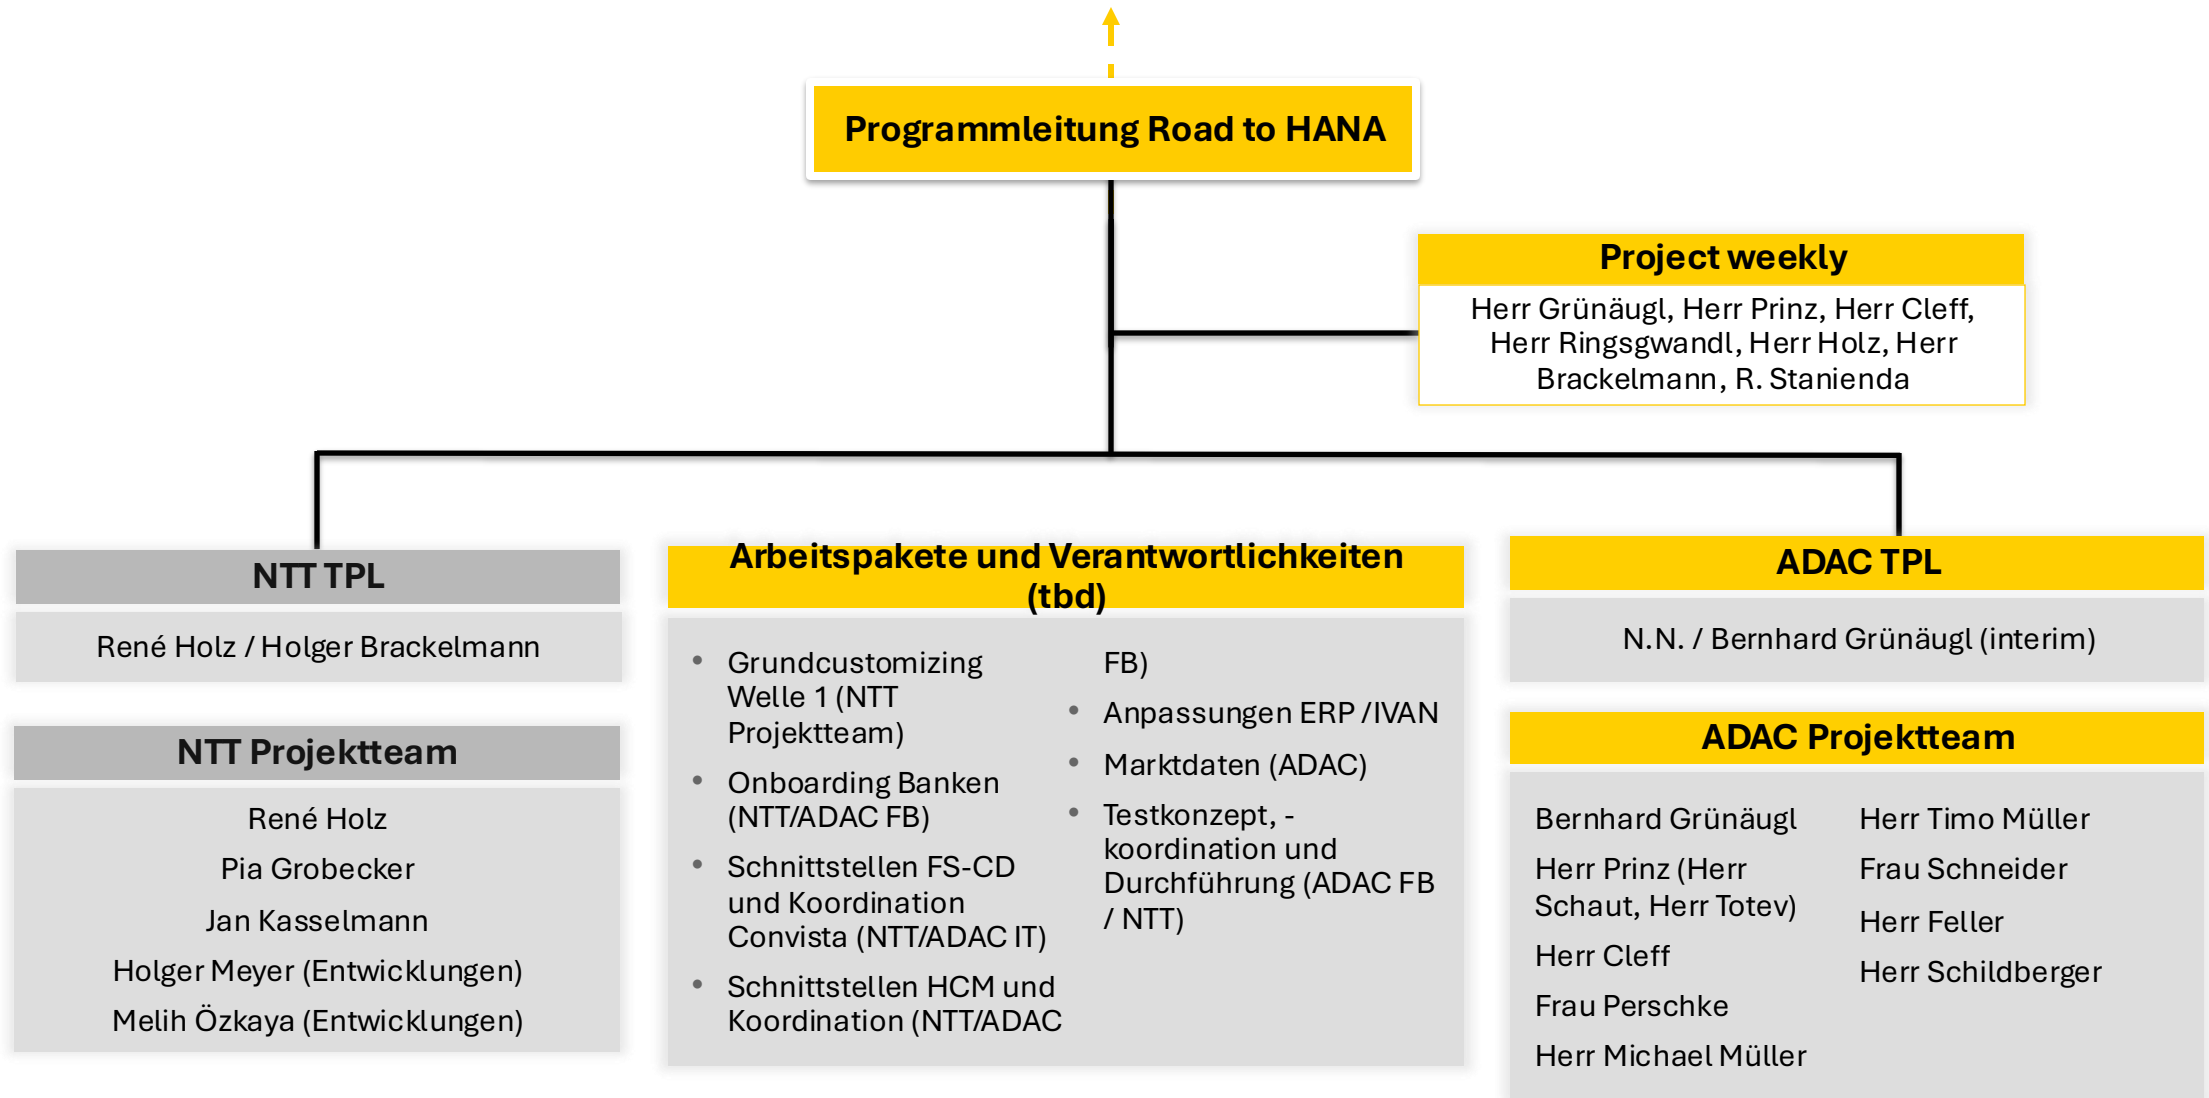

# ADAC: Road to HANA – Org-Chart Realize-Phase (Stand 09/2024)

## *Übersicht ADAC IT-Modulverantwortliche*

### IT-Kollegen/innen IT-Modulverantwortliche

Andreas Leitner, IEA

Emil Totev, IEA

Johannes Schaut, IEA

Klaus Straßer, IEP

Peter Haisch, IEA


Richard Schildberger, FNZ

Volker Niemann, IEA

# ADAC: Road to HANA

## Org-Chart Realize-Phase

*Rollenbeschreibungen:  
Leadfunktionen (fachlich, technisch & AP)  
& explizite NTT-Aufgaben*

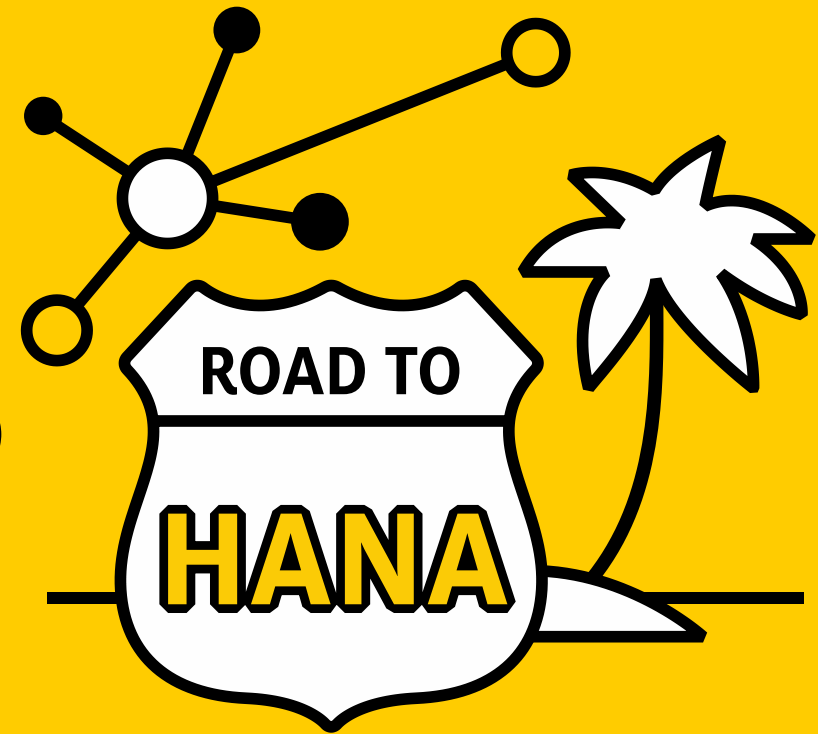

# ADAC: Road to HANA – Realize-Phase

## Rollensteckbrief Fachlicher Stream Lead

### Rolle:

Der **fachliche Stream Lead** ist für Definition, Planung, Tracking und Verwaltung seines jeweiligen (End-to-End) Prozesses bzw. seines Prozessbereichs entlang aller Säulen verantwortlich und gibt dem Prozess Stream die Richtung vor, um die festgelegten Ziele zu erreichen. Er ist verantwortlich, dass die definierten Aufgaben des Streams (Tracking in SAP Cloud ALM) fristgerecht erledigt werden. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen technischen Stream Leads sowie den Arbeitspaket Leads essentiell. Der fachliche Stream Lead ist befugt Entscheidungen zu treffen, die ausschließlich den eigenen Stream betreffen. Besonders weitreichende sowie streamübergreifende Entscheidungen müssen dem Key Design Board vorgestellt und in Abstimmung mit der/dem jeweiligen Prozessverantwortlichen getroffen werden. Im Zuge der Realize-Phase ist insbesondere eine enge Zusammenarbeit mit den Gesellschaftsvertretern (AIS & AVM) von großer Bedeutung.

### Aufgaben & Verantwortung

-  • Verantwortet säulenübergreifend den End-to-End-Prozess im Sinne der Road to HANA - Programmziele und treibt dabei proaktiv und gemeinschaftlich mit NTT (teilw. noch mit Q\_PERIOR) die jeweils relevanten Themen voran und stellt sicher, dass diese in ausreichender Tiefe bearbeitet werden.
-  • Stellt proaktiv sicher, dass die Übergabe der Explore-Ergebnisdokumente an NTT vollständig erfolgt und beantwortet etwaige Rückfragen.
-  • Treibt proaktiv den Abschluss der offenen Themen des verantworteten E2E-Prozesses mit NTT voran, die in den abgenommenen Ergebnisdokumenten der Explore-Phase (Kapitel 7) beschrieben sind.
-  • Er unterstützt den NTT-Lead bei der Definition und dem Tracking der wichtigsten Meilensteine, Aktivitäten und Risiken des Themengebietes (Excel-Programmplan & SAP Cloud ALM). Die übergreifenden Programmplanung wird durch die Programmleitung festgelegt.
- Delegiert bestimmte Aufgaben/Aktivitäten seines Bereichs sowie deren Verantwortungen an SMEs und – sofern nötig – befähigt sie, diese durchzuführen (in Abstimmung mit der fachlichen Programmleitung).
- Nimmt an den durch NTT oder durch die Programmleitung organisierten Workshops/Terminen sowie Iterations-Sprints und Testzyklen teil und/oder stellt sicher, dass eine Stellvertretung bzw. geeignete fachliche Kollegen/innen (SMEs) teilnehmen. Er Validiert zudem die Workshop-Protokolle, die durch die NTT-Berater/innen erstellt worden sind (Confluence).
- Bindet die Gesellschaftsvertreter proaktiv ein und stellt sicher, dass deren Anforderungen entsprechend berücksichtigt werden. Es wird für 2024 neben den Pilotgesellschaften AVM & AIS auch die Einbindung weiterer Gesellschaften empfohlen (v.a. VES). Zudem ist voraussichtlich auch die ADN zu berücksichtigen.
-  • Steht für Rückfragen der technischen Stream Leads und der Arbeitspaket Leads zur Verfügung und treibt proaktiv übergreifende Themen voran - insbesondere hinsichtlich der Arbeitspakete „Schnittstellen“, „Berechtigungen“ und „Testmanagement“.
- Trifft Entscheidungen oder führt Entscheidungen herbei, die den End-to-End-Prozess betreffen und erstellt - sofern notwendig – gemeinschaftlich mit NTT (teilw. noch Q\_Perior) Entscheidungsvorlagen für das Key Design Board oder andere Gremien (gemeint sind Entscheidungen, die nicht auf Streamebene getroffen werden können sowie solche, die mit Aufwandsverschiebungen einhergehen oder die eine Veränderung der Organisation bewirken).
- Präsentiert die Statusberichte folgend der festgelegten Meeting/JF-Struktur und bezieht dabei, sofern notwendig, die IT-Kollegen/innen sowie die Arbeitspaket Leads ein. Die initiale Erstellung der Statusreports erfolgt grundsätzlich durch die jeweiligen NTT-Berater.
- Eskaliert fachliche Themen an die fachliche Programmleitung.
- Steht für Testings im Zuge des Lift&Shift-Ansatzes und später der S/4-Einführung (v.a. ab Iteration 2) zur Verfügung (folgend der kommunizierten Timeline).
- Verantwortet SAP Testings aus fachlicher Sicht (in enger Abstimmung mit AP „Testmanagement“) und nimmt die vorgenommenen SAP S/4 Customizing-Einstellungen ab – außer es sind andere Kollegen/innen für die Testrollen des Streams definiert.

# ADAC: Road to HANA – Realize-Phase

## Rollensteckbrief Technischer Stream Lead



### Rolle:

Der **technische Stream Lead** stellt sicher, dass das technische Know-How aus dem jeweiligen Themengebiet gezielt in die verschiedenen Prozessbereiche (End-to-End-Prozesse) sowie in das Gesamtprogramm ADAC Road to HANA einfließt. Dabei muss sie/er sicherstellen, dass die notwendigen Kollegen/innen an den entsprechenden Workshops bzw. Terminen teilnehmen und bei der Ergebnisausarbeitung bzw. den Systemeinstellungen eingebunden sind – dies beinhaltet explizit auch die Koordination bzw. den gezielten Einsatz der IT-Modulverantwortlichen. Er trägt zudem die Verantwortung für das Erreichen der stream-spezifischen Meilensteine bzw. für die fristgerechte Erledigung der Aufgaben (Tracking in SAP Cloud ALM). Übergeordnetes Ziel des technischen Stream Leads ist es, die S4 Implementierung in enger Zusammenarbeit mit den NTT-Beratern/innen proaktiv und bestmöglich voranzutreiben und dabei die jeweiligen technischen Anforderungen des ADAC zu berücksichtigen. Hierbei ist weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit den Arbeitspaket Leads sowie den fachlichen Stream Leads essentiell.



### Aufgaben &

#### Verantwortung



- Verantwortet säulen- und End-to-End-Prozess-übergreifend das jeweilige technische Fachgebiet im Sinne der Road to HANA - Programmziele und treibt dabei proaktiv und gemeinschaftlich mit NTT die jeweils relevanten Themen voran.
- Er unterstützt den NTT-Lead bei der Definition und dem Tracking der wichtigsten Meilensteine, Aktivitäten und Risiken des Themengebietes (Excel-Programmplan & SAP Cloud ALM). Die übergreifenden Programmplanung wird durch die Programmleitung festgelegt.
- Nimmt an den durch NTT oder durch die Programmleitung organisierten Workshops/Terminen sowie Iterations-Sprints und Testzyklen teil und/oder stellt sicher, dass eine Stellvertretung bzw. geeignete technische Kollegen/innen (IT-Modulverantwortliche) teilnehmen. Er validiert zudem die Workshop-Protokolle, die durch die NTT-Berater/innen erstellt worden sind (Confluence).
- Stellt proaktiv sicher, dass alle relevanten, technischen Themen in den Workshops/Terminen in ausreichender Tiefe diskutiert, vorangetrieben und die definierten Ergebnisse erzielt werden. Dies gilt insbesondere auch für Schnittstellenthemen, bei denen ein proaktiver Austausch mit den betroffenen fachlichen und technischen Stream Leads bzw. IT-Modulverantwortlichen oder Arbeitspaket Leads erforderlich ist.
- Delegiert bestimmte Aufgaben/Aktivitäten seines Bereichs sowie deren Verantwortungen an IT-Modulverantwortliche und – sofern nötig – befähigt sie, diese durchzuführen (in Abstimmung mit der technischen Programmleitung).
- Trifft Entscheidungen (im Austausch mit den IT-Modulverantwortlichen) oder führt Entscheidungen herbei, die das jeweilige technische Themengebiet betreffen und erstellt - sofern notwendig – gemeinschaftlich mit NTT & den IT-Modulverantwortlichen Entscheidungsvorlagen für das Key Design Board oder andere Gremien.
- Präsentiert die Statusberichte folgend der festgelegten Meeting/JF-Struktur und bezieht dabei, sofern notwendig, fachliche Kollegen/innen sowie die Arbeitspaket Leads ein. Die initiale Erstellung der Statusreports erfolgt durch die jeweiligen NTT-Berater.
- Eskaliert technische Themen an die technische Programmleitung.
- Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit mit den fachlichen Stream Leads sowie den Arbeitspaket Leads. Bindet die Gesellschaftsvertreter proaktiv ein und stellt sicher, dass deren Anforderungen entsprechend berücksichtigt werden. Es wird für 2024 neben den Pilotgesellschaften AVM & AIS auch die Einbindung weiterer Gesellschaften empfohlen (v.a. VES). Zudem ist voraussichtlich auch die ADN zu berücksichtigen.
- Sicherstellung, dass die Ziele der Projektphase aus technischer Sicht gemeinschaftlich erreicht werden, die vereinbarten Liefergegenstände vorliegen und somit die Realize-Phase erfolgreich abgeschlossen werden kann.
- Insgesamt ist er angehalten, das jeweilige Themengebiet proaktiv voranzutreiben, notwendige Abstimmungen (auch über den Stream hinaus) zu initiieren (in engem Austausch mit NTT), die Dokumentation der Ergebnisse sicherzustellen und offene Themen nachzuhalten.
- In Bezug auf das Testing nimmt er eine unterstützende Funktion ein. Lead beim Arbeitspaket „Testmanagement“



# ADAC: Road to HANA – Realize-Phase

## Rollensteckbrief Arbeitspaket Lead

### Rolle:

Der **Arbeitspaket Lead** arbeitet eng mit den verschiedenen fachlichen und technischen Stream Leads sowie weiteren ADAC-Stakeholdern zusammen und stellt sicher, dass die definierten Meilensteine des Arbeitspaketes erreicht und die definierten Aufgaben erledigt (Tracking in SAP Cloud ALM) werden und leistet so einen essenziellen Beitrag zum Erfolg des Road to HANA-Programms. Die verschiedenen Arbeitspakete werden in der Realize-Phase durch NTT-Berater unterstützt und mitunter geführt. Analog zu den technischen Streams handelt es sich bei den verschiedenen Arbeitspaketen um Querschnittsfunktionen, die sowohl die technischen als auch die fachlichen Streams tangieren. Dabei ist der Arbeitspaket-Lead verantwortlich, dass eine übergreifende Koordination und Bearbeitung erfolgt.

### Aufgaben &

#### Verantwortung

-  • Verantwortet säulen- und End-to-End-Prozess-übergreifend das jeweilige Themengebiet im Sinne der Road to HANA - Programmziele und treibt dabei proaktiv und gemeinschaftlich mit NTT die jeweils relevanten Themen voran.
-  • Er unterstützt den NTT-Lead bei der Definition und dem Tracking der wichtigsten Meilensteine, Aktivitäten und Risiken des Themengebietes (Excel-Programmplan & SAP Cloud ALM). Die übergreifenden Programmplanung wird durch die Programmleitung festgelegt.
- Nimmt an den durch NTT oder durch die Programmleitung organisierten Workshops/Terminen und Iterations-Sprints und Testzyklen teil und/oder stellt sicher, dass eine Stellvertretung bzw. geeignete Kollegen/innen teilnehmen. Er Validiert zudem die Workshop-Protokolle, die durch die NTT-Berater/innen erstellt worden sind (Confluence).
- Delegiert bestimmte Aufgaben/Aktivitäten seines Bereichs sowie deren Verantwortungen an IT-Modulverantwortliche und/oder SMEs und – sofern nötig – befähigt sie, diese durchzuführen (in Abstimmung mit der fachlichen und/oder technischen Programmleitung).
-  • Stellt proaktiv sicher, dass alle relevanten Themen in den Workshops/Terminen in ausreichender Tiefe diskutiert, vorangetrieben und die definierten Ergebnisse erzielt werden.
- Trifft Entscheidungen oder führt Entscheidungen herbei, die das jeweilige Themengebiet betreffen und erstellt - sofern notwendig – gemeinschaftlich mit NTT Entscheidungsvorlagen für das Key Design Board oder für andere Gremien.
- Präsentiert die Statusberichte folgend der festgelegten Meeting/JF-Struktur und bezieht dabei, sofern notwendig, fachliche Kollegen/innen sowie die Arbeitspaket Leads ein. Die initiale Erstellung der Statusreports erfolgt durch die jeweiligen NTT-Berater.
- Eskaliert kritische Themen an die fachliche und/oder technische Programmleitung.
-  • Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit mit den fachlichen sowie mit den technischen Stream Leads und mit den zuständigen NTT-Beratern.
- Insgesamt ist er angehalten, das jeweilige Themengebiet proaktiv voranzutreiben, notwendige Abstimmungen (auch über stream- und arbeitspaketübergreifend) zu initiieren (in engem Austausch mit NTT), die Dokumentation der Ergebnisse sicherzustellen und offene Themen nachzuhalten.

# ADAC: Road to HANA – Realize-Phase

## Rollensteckbrief IT-Koordinatoren

### Aufgaben & Verantwortung



#### **Fachliche Steuerung IT-naher Themen**

- Sammeln, Strukturieren und Priorisieren von Anforderungen
- Sicherstellen korrekter Berechtigungen & Rollen
- Klären fachlicher Aspekte bei IT-Änderungen



#### **Kommunikation & Schnittstellenfunktion**

- Bindeglied zwischen Fachbereich, AIS, Externen und Projektteams
- Multiplikator für fachbereichsspezifische IT-Prozesse und Systemnutzung



#### **Qualitäts- & Prozesssicherung**

- Unterstützung bei Tests (E2E, User-Tests, Abnahmen)
- Monitoring der Systemnutzung (z. B. korrekte Anzeige von Buchungskreisdaten)
- Sicherstellen fachlich korrekter Datennutzung



#### **Unterstützung im operativen Tagesgeschäft**

- Ansprechpartner für Systemfragen
- Begleitung bei Onboardings und Berechtigungsprozessen (wie in Road-to-HANA-Mails ersichtlich)

# Explizite Aufgaben des NTT Data-Stream-Leads

## „Rollensteckbrief“ NTT-Lead

### NTT DATA-Stream-Lead

- Er treibt proaktiv offene Themen des jeweiligen Bereichs voran und initiiert die notwendigen Workshops/Abstimmungstermine (auch streamübergreifend).
- Er erstellt Entscheidungsvorlagen (in Abstimmung mit den ADAC-Leads), sofern Gremienentscheidungen erforderlich sind (z.B. bei unausweichlichen Abweichungen zum SAP-Standard).
- Er eskaliert kritische Themen rechtzeitig an die NTT Data-Projektleitung – sobald die Gefahr eines Projektverzugs entsteht.
- Als Implementierungs-KnowHow-Träger legt er die Meilensteine, Aktivitäten und Inhalte der Iterationen fest – immer in enger Abstimmung mit den ADAC-Counterparts und der Programmleitung.
- Er setzt das Konzept aus der Explore-Phase im ADAC SAP S/4 HANA-System um (Customizing).
- Er plant die Tests der Iterationen – zusammen mit dem Arbeitspaket „Testmanagement“.
- Er führt die vorab definierten Tests durch, dokumentiert die Ergebnisse und stößt ggf. Nachbesserungen an.
- Er entwirft einen Schulungsplan für die Endanwender, und bereitet die Schulungen vor und erstellt die Endanwenderdokumentation.
- Im Zuge der Iterationen führt er die ADAC-Kollegen/innen durch die S/4-Prozesse und ermöglicht dabei ein „Learning-by-Doing“.
- Er begleitet das Belegdesign (Ausdruck von Geschäftsbelegen wie Rechnungen, Mahnungen usw. im Firmendesign).
- Er erstellt Protokolle zu den Workshops/Abstimmungen und initiiert die Ergänzung und Freigabe durch die ADAC-Counterparts.
- Er befüllt die Status-Reports initial und stimmt die Inhalte mit den ADAC-Counterparts ab.
- Er befüllt die SAP Cloud ALM-Bereiche (Anforderungen, Aktivitäten etc.) des jeweiligen Themengebiets und bezieht hier die ADAC-Counterparts eng mit ein.
