



Road to HANA – Welle 2

„KickOff“ im neuen Projekt Setup

vorge stellt im WhatsNext am 13.4.2026

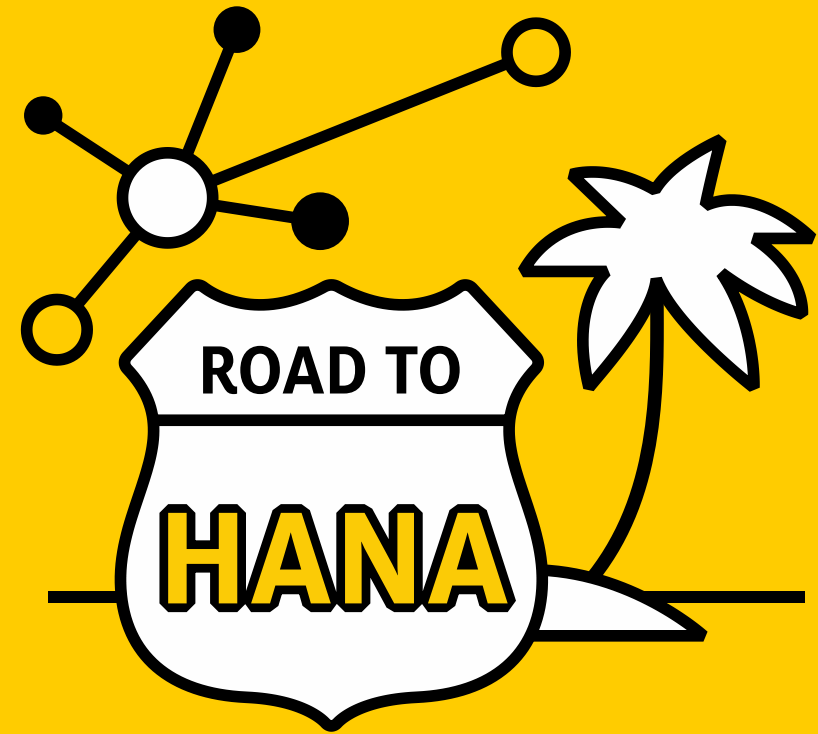

Inhalte

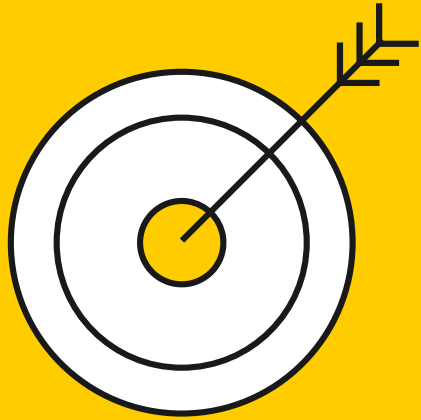

1. **Scope & Rahmenwerk**
2. Programmorganisation, Rollen & Verantwortlichkeiten
3. Spielregeln
4. Eure Fragen

Welle 2 Scope

Finale Entscheidung muss zeitnah getroffen werden



Protokoll vom Termin am 06.03.2026 – Prüfauftrag 11 bzw. 9 Gesellschaften:

[Welle 2 Planung - Prüfauftrag Scope Welle 2 | 2026-03-06 - S4 Hana Global - Confluence](#)



Ursprünglicher Welle-2-Scope:

	Gesellschaft
1	SE Holding
2	GKS (Passau)
3	ACS
4	FDL
5	AMR
6	RSR
7	RSB
8	Unterstützungskasse
9	ADAC Stiftung Sport
10	ADAC Stiftung
11	ADAC Aquico GmbH

- Ein De-Scoping für Welle 2 hat unmittelbare Auswirkungen auf die weitere R2H-Wellen-Planung – insbesondere auf die umfangreiche Welle 3 mit dem e.V. und der Versicherung!
- Es besteht das Risiko, dass eine zusätzliche Welle nach dem 01.01.2028 eingeplant werden muss (unabhängig von der LRG)!

P2P – CO:

- | | | |
|-----|---|---|
| GKS | X | → 9 Gesellschaften kritisch (inkl. GKS) |
| | | → 11-10 Gesellschaften <u>nicht</u> leistbar |
| AMR | X | → Bewertung gem. <u>aktueller</u> Ressourcen-Planung |
| RSB | X | → Gr. Aufwand für techn. Konzeption (Steuerungsmodelle) |

I2C – FI & SD:

- | | | |
|-----|---|---|
| AMR | X | → AMR mit zahlreichen neuen Prozessen |
| | | → Bewertung gem. <u>aktueller</u> Ressourcen-Planung |
| | | → In Kombination mit DRC, RE-FX-Integration, AVM GoLive + Hypercare <u>nicht</u> leistbar |

S2P – FI:


- | | | |
|-----|---|--|
| AMR | X | → AMR auch im S2P-Bereich komplex |
| | | → Bewertung gem. <u>aktueller</u> Ressourcen-Planung |
| | | → Im Hinblick auf weitere 2026-Themen kritisch |

Finaler Welle-2-Scope:

	Gesellschaft
1	SE Holding
	GKS (Passau)
2	ACS
3	FDL
	AMR
4	RSR
	RSB
5	Unterstützungskasse
6	ADAC Stiftung Sport
7	ADAC Stiftung
8	ADAC Aquico GmbH
9	+ ADAC DML

Road to HANA – Roadmap 2026

Uns erwarten zahlreiche Themen, die detailliert geplant und abgestimmt werden müssen

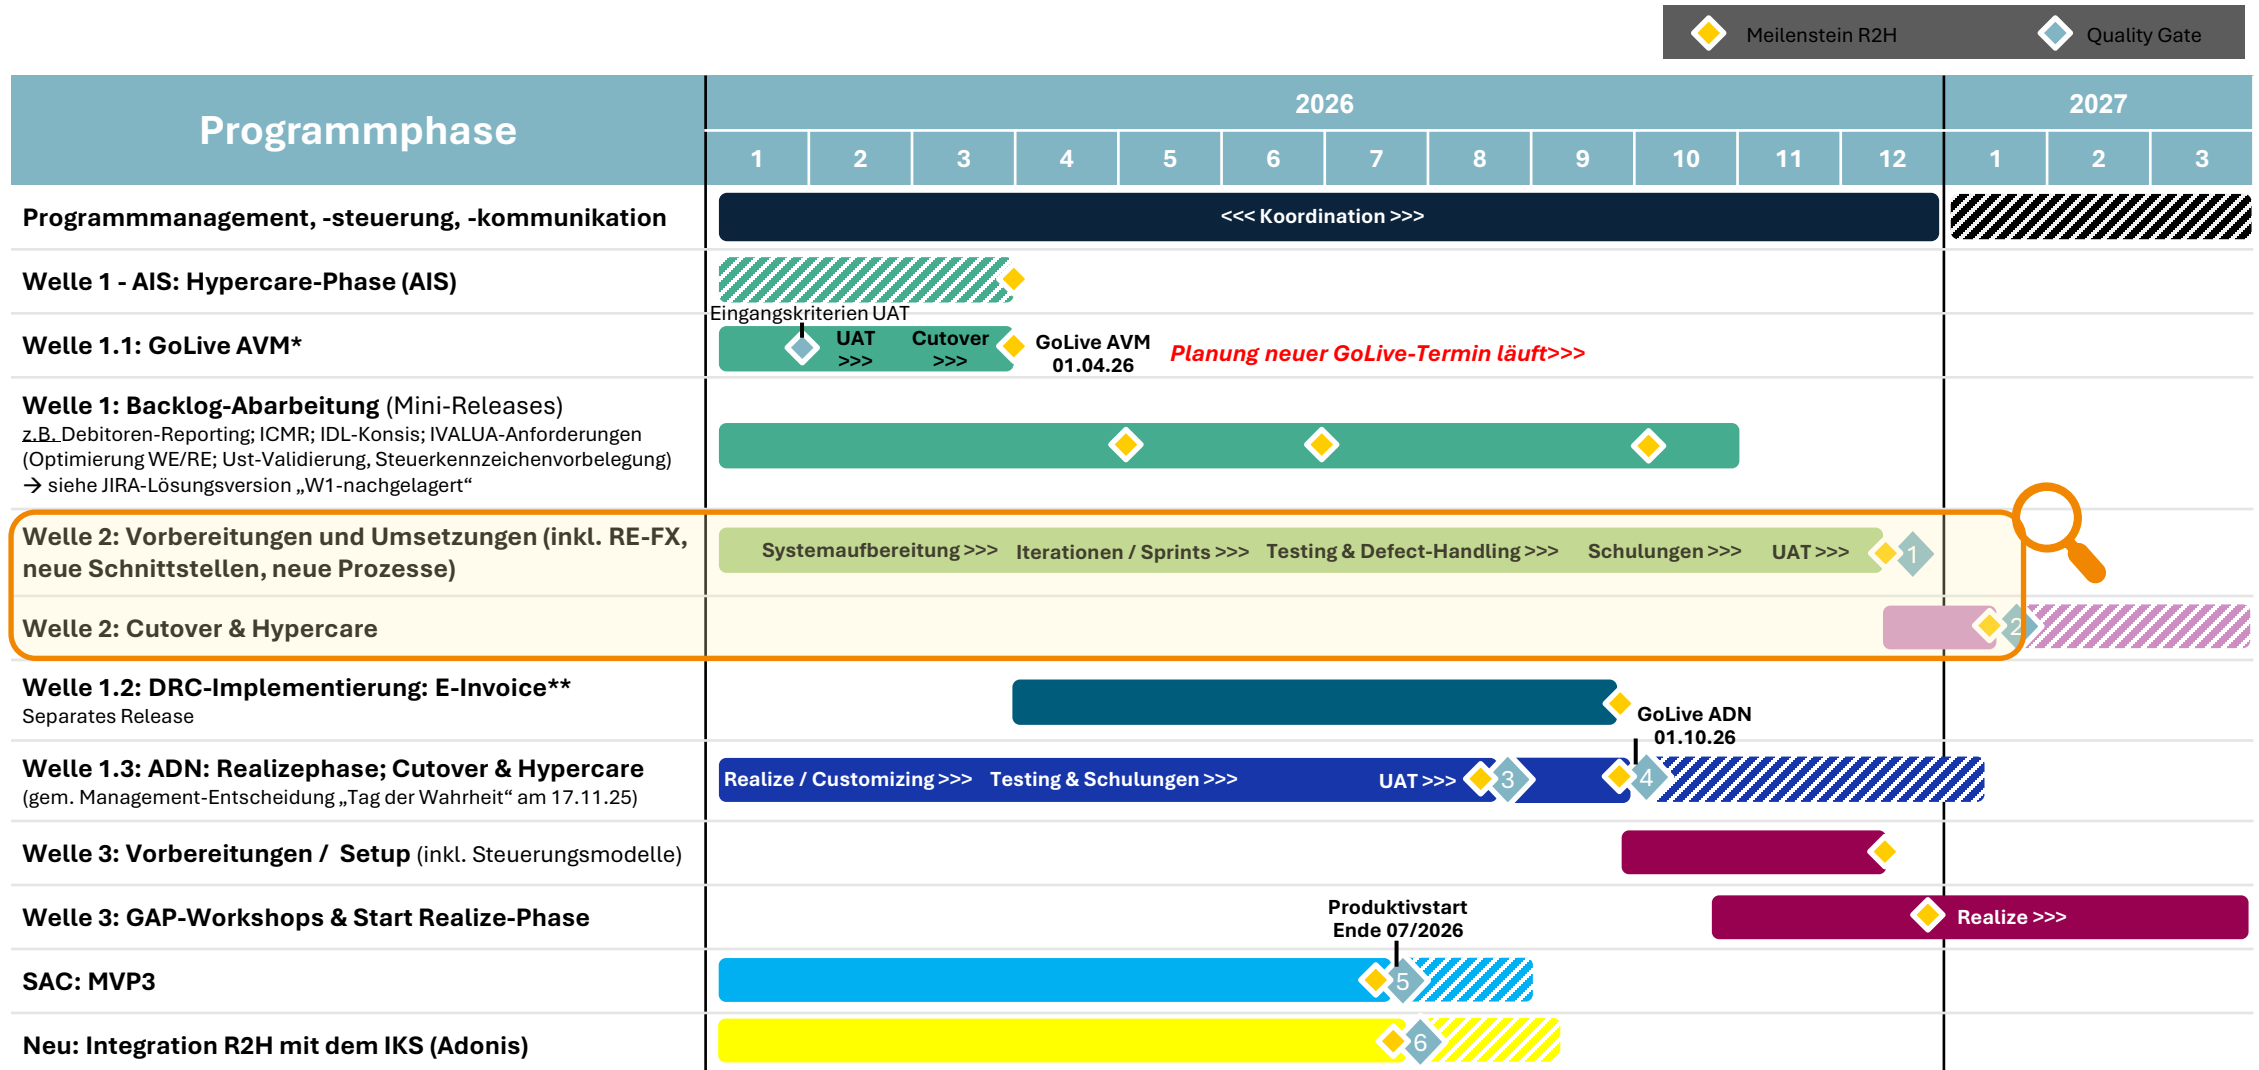

*GoLive wurde verschoben

**Genaue Timeline derzeit im separaten Teilprojekt in Ausarbeitung




- 2 I-Tests → kompakt und an R2H-2026-Timeline angepasst
- UAT Go/NoGo-Entscheidung Anfang November
- Einordnung DRC / E-Invoicing noch offen



R2H - Planung Welle 2 - 2026

Prämisse: 1 konsolidierter GoLive für Welle 2 zum 01.01.2027

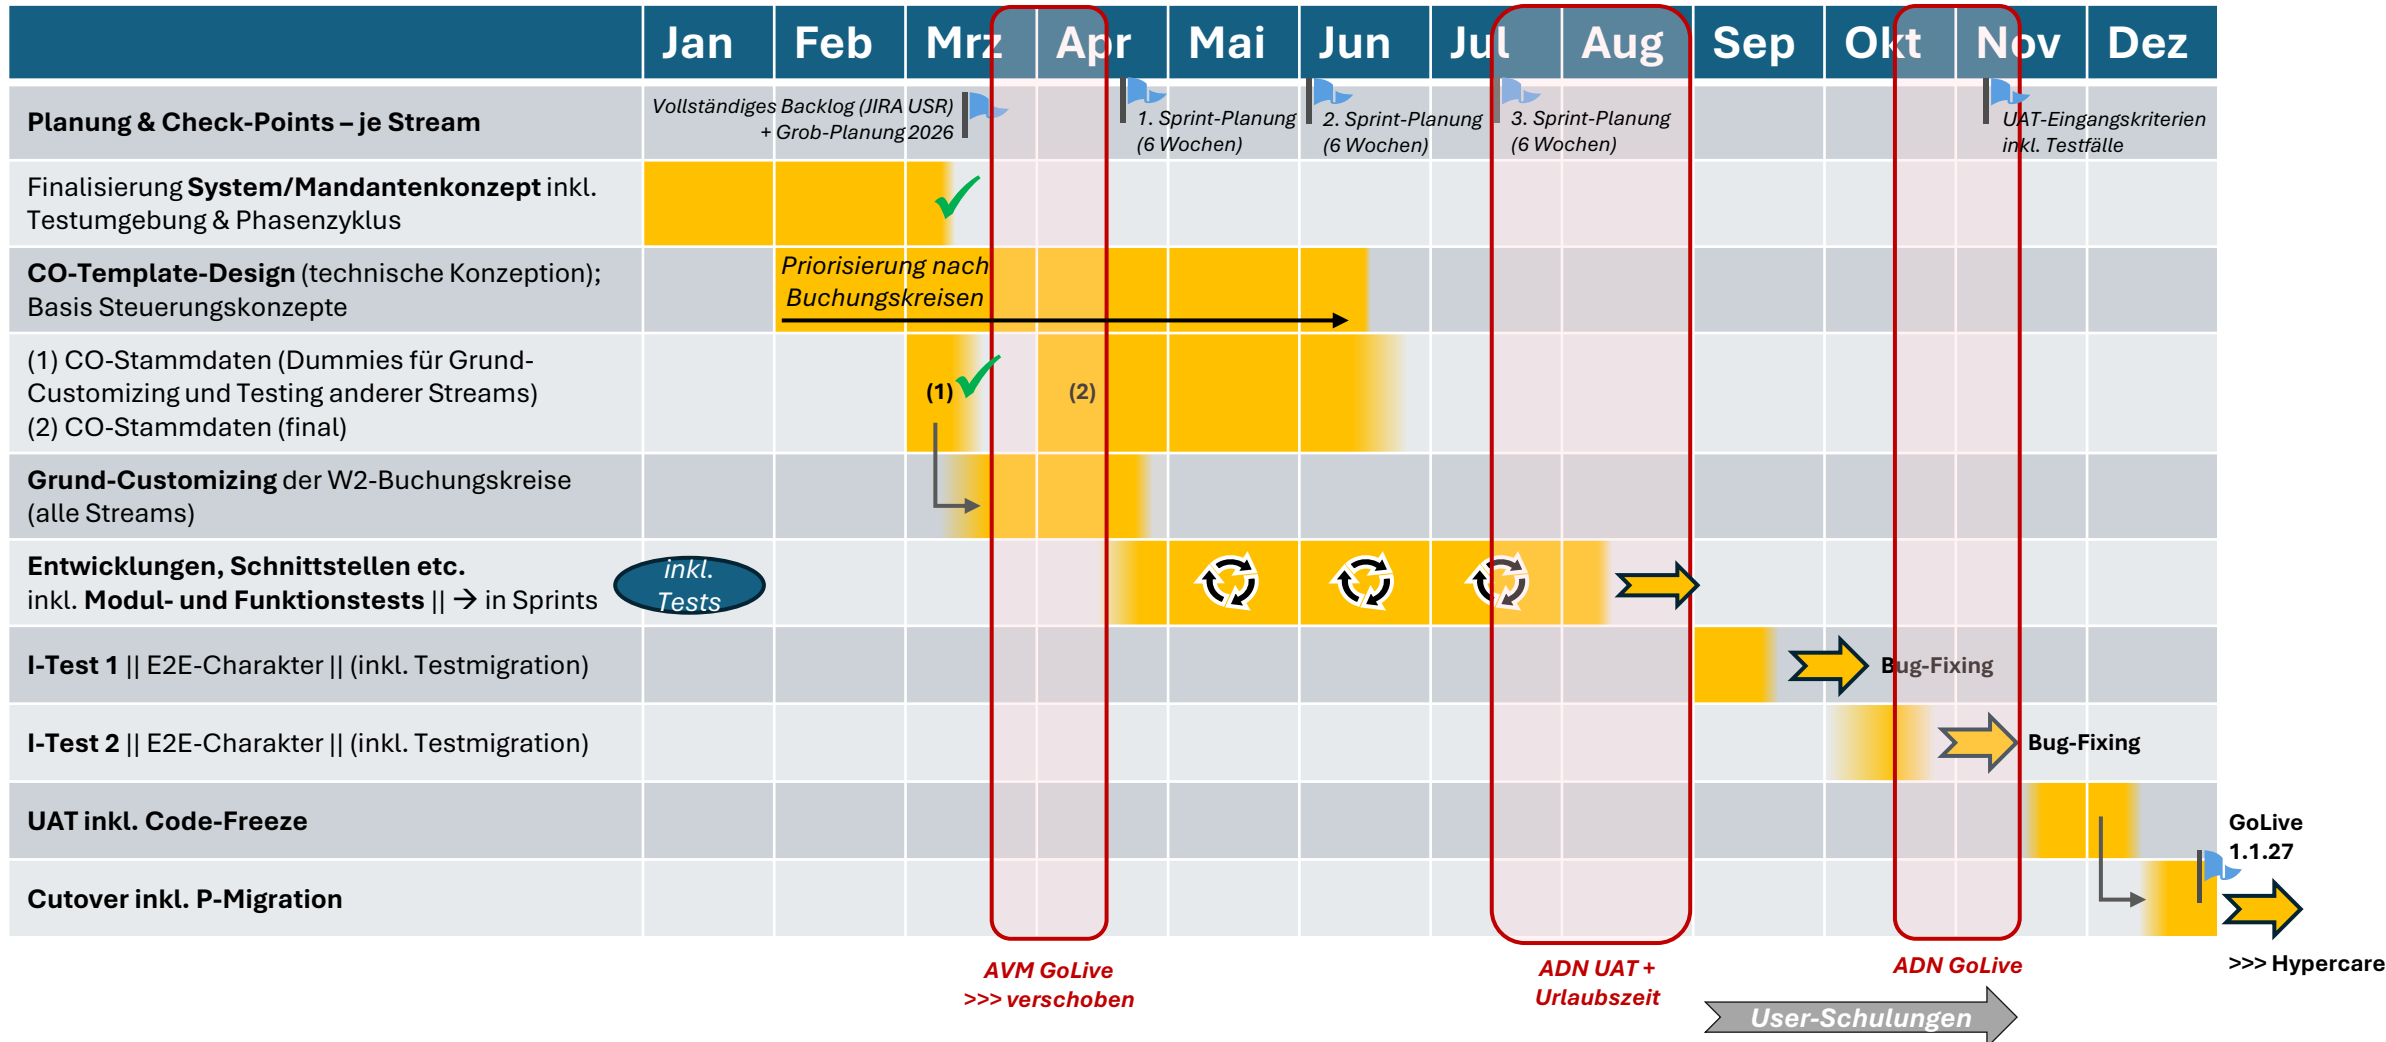

Sprint Termine

auf einen Blick

- › Eine Übersicht über die nächsten größeren Termine findet ihr hier:
[Welle 2 - S4 Hana Global – Confluence](#)

Nächste Meilensteine und Events

Datum	Meilenstein
	Abschluss Grundcustomizing (Sprint #0)
21. Apr. 2026	Start Sprint #1
5. Mai 2026	All Hands Meeting
22. Mai 2026	Ende Sprint #1 & Start Sprint #2
3. Juli 2026	Ende Sprint #2
7. Juli 2026	Start Sprint #3
14. Aug. 2026	Ende Sprint #3




Zukünftiges Rahmenwerk für die Welle 2 Aktivitäten

Spielregeln für gute Zusammenarbeit, Transparenz & Steuerung



- Jeder „Sprint“ beinhaltet nicht nur Entwicklungs-Tätigkeiten sondern zudem Modul- und Funktionstests
→ am Ende eines „Sprints“ soll der gesamte Sprint-Scope bereit für Integrationstests bzw. den UAT sein!
- Folgend der W2-Planung erreichen wir so noch vor der „Sommer-Urlaubszeit“ eine wichtige Wasserstandsmeldung und können die weitere Planung ggf. anpassen (sofern erforderlich)!
- Detailabstimmungen zwischen Streams und Buchungskreisen müssen bilateral und eigenständig über die Stream-Leads koordiniert werden, wobei die „Gesellschaften“ jeweils einen zentralen Ansprechpartner benennen!
- Sämtliche Testing-Aktivitäten (Vorbereitung, Durchführung, Dokumentation) sind mit dem Testmanagement abzustimmen (Manuel Aslanidis) und vollständig in JIRA zu dokumentieren!
- Die High-Level-W2-Planung berücksichtigt sowohl die Sommerurlaubszeit als auch die bereits fest terminierten Parallel-Aktivitäten der R2H-2026-Roadmap (z.B. ADN-GoLive)!
- Kommt jederzeit auf die Programmleitung zu, wenn ihr Anpassungsbedarfe oder Optimierungsmöglichkeiten seht – gemeinsam zum Ziel!

Inhalte

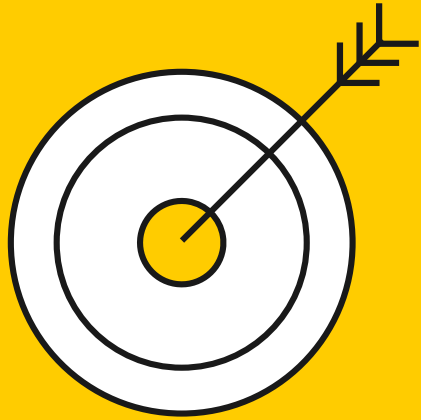


1. Scope & Vorgehen
- 2. Programmorganisation, Rollen & Verantwortlichkeiten**
3. Spielregeln
4. Eure Fragen


Welle 2 – Planungsdokumente/Werkzeuge

1


High-Level-Welle 2-Planung

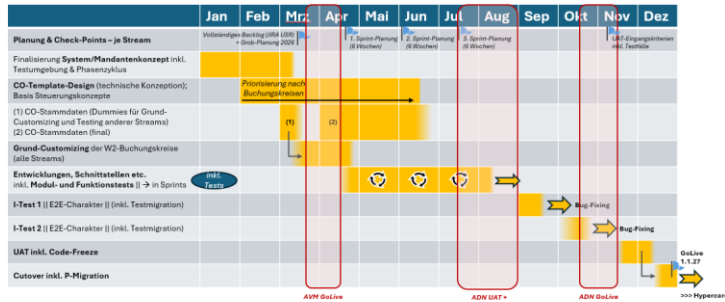

2

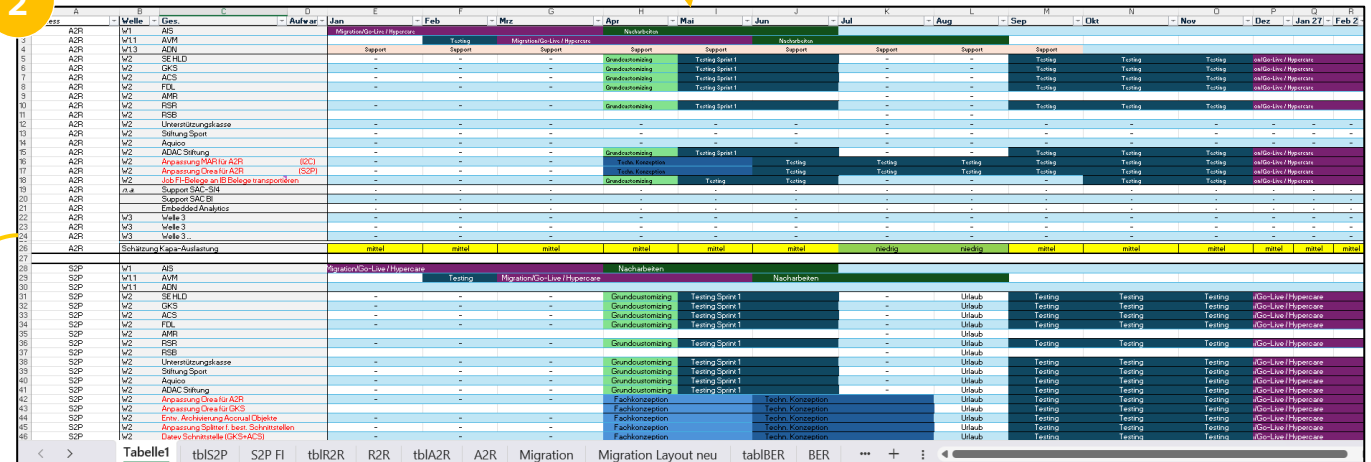

3

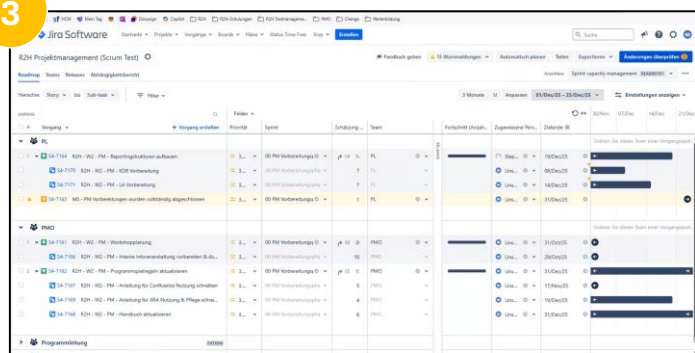

JIRA-Sprint-Planning:

- User Stories werden in Sprints abgearbeitet (inkl. Testing)
- Ressourcen-Verfügbarkeit
- USR müssen spezifiziert sein

Derzeit werden die Detail-Planungen der einzelnen Streams in einer übergreifenden **Welle-2-Excel-Planungsdatei** konsolidiert:


- Identifizierung von Unstimmigkeiten und frühzeitige Anpassung (z.B. zeitliche Bearbeitung einzelner Gesellschaften)
- Tieferlegung der High-Level-Welle 2-Planung
- Basis für die Sprint-Planungen (JIRA)

Road to HANA: Org-Chart *(Stand 04/2026) - Draft*

Programm Kernteam

Product Owner & Workstream Leads

Gesellschaften

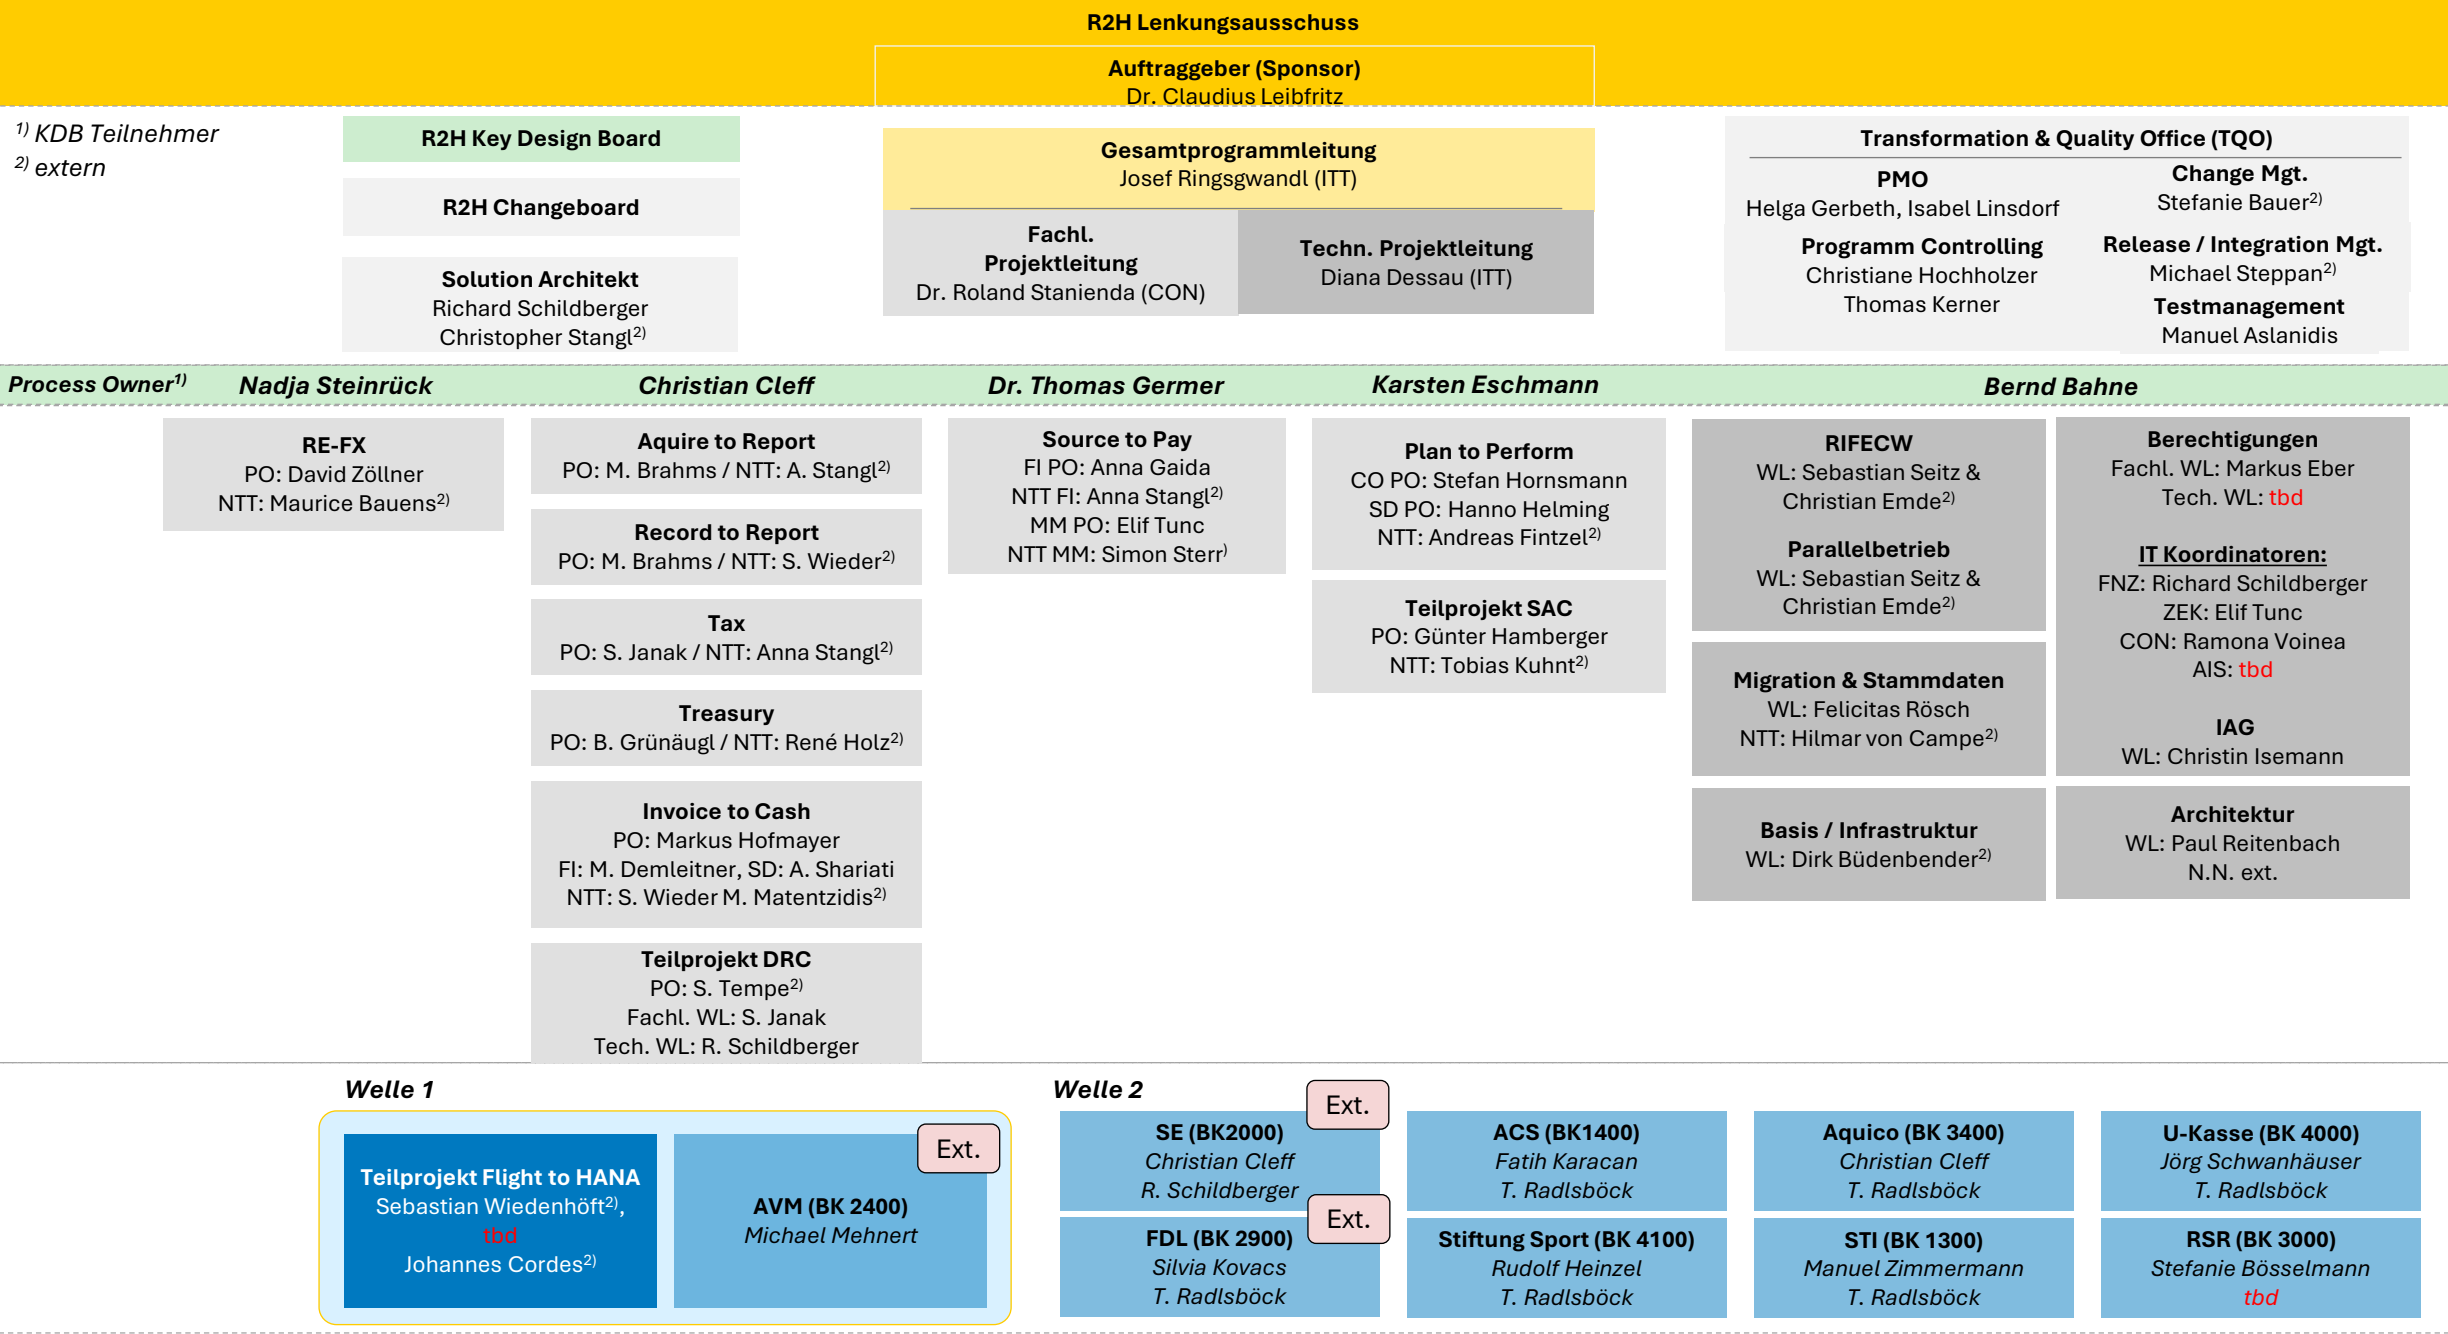

Rollen & Verantwortlichkeiten

Aktualisierung

Die existierenden Rollenbeschreibungen und Verantwortlichkeiten wurden an das aktuelle SetUp angepasst.

Die detaillierten Beschreibungen findet ihr hier:

 [R2H OrgChart & Rollen - S4 Hana Global - Confluence](#)



NTT Ressourcen / Verfügbarkeiten

Die Aktualisierung der Ressourcen erfolgt regelmäßig (3 Monate im Voraus) zwischen der PL und dem NTT Operations Manager (Herr Kemper).



Gremien R2H 2026



Zentrale Postfächer immer mit einladen
→ sol-de-ADAC-RoadToHana
→ [Road to HANA@adac.de](mailto:Road_to_HANA@adac.de)
→ Meetingmatrix: [hier](#)



Lenkungsausschuss

Ca. 1 Mal pro Monat

- Bericht aktueller Programmstatus
- Kritische Themen mit Management-Entscheidungs- und/oder Support-Bedarf
- Budget- / Scope Änderungen

Voraussetzung: KDB Entscheidung liegt vor

Bitte Folienvorlagen beachten!



Key Design Board

2-Wöchentlich
Montags (entfällt, wenn es keine Themen gibt)

- Entscheidungen zu Budget, Scope und Änderungen

Voraussetzung: Folienvorgabe beachten

Folien sind bis Donnerstagsmittags vorzubereiten.



Change Board

2-Wöchentlich
Montags

Abstimmung von:

- Änderungswünsche von noch R3 Gesellschaften
- Änderungswünsche von bereits S/4 Gesellschaften
- und deren Auswirkungen auf das R2H Programm, das neue System und zukünftige Releases

Terminstruktur

aus dem R2H Postfach gesteuert



Zentrale Postfächer immer mit einladen
 → sol-de-ADAC-RoadToHana
 → Road_to_HANA@adac.de

Termin	Beschreibung / Ziel	Teilnehmerkreis
<u>Sprint Planning</u> (zum Start eines Sprints)	Ziel ist es, für die nächsten 6 Wochen ein gemeinsames Sprint Ziel und entsprechende Aufgaben zu priorisieren und zu definieren sowie die Ressourcen-Verfügbarkeit abzusichern. Vorab sind die Stream Leads angehalten den Sprint-Scope zu definieren, in dem die User Stories in JIRA entsprechend gelabelt werden. Die Stream Leads stellen deren Scope kurz vor; im Anschluss soll ein aktiver streamübergreifender Austausch stattfinden. Ziel → Abgestimmter, realistisch umsetzbarer Sprint-Scope Moderiert wird der Termin vom Release Manager.	Alle Stream Leads, Solution Architekten, Release Manager, Testmanagement, Gesellschaftskoordinatoren, Programmleitung und PMO Optional: IT Koordinatoren
<u>Sprint Review Meeting</u> (zum Ende eines Sprints)	Ziel ist es die Ergebnisse des jeweiligen Sprints durch die Stream Leads vorzustellen (wurde der Sprint-Scope vollständig bearbeitet inkl. Testing) und identifizierte Herausforderungen bzw. Lessons Learned zu teilen, sodass eine Sprint-Optimierung erfolgen kann. Auf Stream-Ebene (mit PL & Testmanagement) finden regelmäßige Check-Up-Termine während der Sprints statt. Ende des Sprint Reviews ist eine „Abnahme“ der Arbeitspakete → Dokumentation in JIRA! Nicht vollständig abgeschlossene USR werden in den Folge-Sprint übernommen! Moderiert wird der Termin von Release Manager.	Alle Stream Leads, Solution Architekten, Release Manager, Testmanagement, Gesellschaftskoordinatoren, Programmleitung und PMO Optional: Gesellschaftsvertreter, Process Owner und IT Koordinatoren
Weeklys Streams & PL & Testmanagement (während der Sprints)	Im Rahmen dieser Termine blicken Programmleitung, Testmanagement und Stream Leads gemeinsam auf das jeweilige Kanban Board und challengen den aktuellen Sprint-Fortschritt. Folgende Leitfragen helfen, den Termin zu koordinieren: Was wurde bereits bearbeitet/ getestet? Was wird in den nächsten Tagen bearbeitet? Was sind mögliche Hindernisse? Welche Unterstützung / Entscheidungen seitens PL, Testmanagement oder anderer Streams benötige ich? Moderiert wird der Termin von der fachl. PL.	Programmleitung, Testmanagement, Product Owner und Stream Leads

Programmsteuerung & Reporting

Jira = Tool der Wahrheit

- Die Basis für die Programmsteuerung und das (Management) Reporting bildet der aktuelle (User Story) Status im Projekttool Jira.
- Dies erfordert...
 -dass User Stories jederzeit den aktuellen Status abbilden.
 - ⚠ ➤ ...dass User Stories ausreichend beschrieben sind inkl. **fachlicher und technischer Spezifikation** → Ziel: Ein unabhängiger Dritter muss verstehen, wann eine USR vollständig erfolgreich abgeschlossen/getestet ist, also welches konkrete Ergebnis erzielt werden muss!
 - ...dass alle Pflicht-Felder von Anfang an und zu jeder Zeit gepflegt sind → siehe: [2026-02-23&24_Welle 2 Planung WrapUp & NextSteps.pptx \(Folie 9 & nachfolgende Folie\)](#).
 - ...dass Hindernisse / weiterführende Informationen in der User Story dokumentiert und/oder verlinkt sind.
 - ...dass jede User Stories mit Testfällen und / oder Testplänen über den Verknüpfungstyp „tested by“ verknüpft sind.
 - ...dass Defects mit den entsprechenden User Stories verlinkt sind.
 - ...dass blockierende Abhängigkeiten mithilfe des „is blocked by“ Verknüpfungstyp erkenntlich sind.
- Mithilfe des Stichwort-Feldes und den Stichwörtern „Sprint#0“, „Sprint#1“, „Sprint#2“ und „Sprint#3“ werden die User Stories den jeweiligen Sprints zugeordnet und im Kanban Board automatisch gefiltert (siehe auch nachfolgende Folie).
 - Direkte Links zum jeweiligen Sprint Kanban Board sind hier zu finden: [Welle 2 - S4 Hana Global – Confluence](#)
- Im Rahmen der fachl. / techn. Weeklys reporten die Product Owner und Work Stream Leads den aktuellen Status, sowie mögliche kritische Themen und Risiken an die PL. Kaskadenförmig konsolidiert diese den Programmstatus und übernimmt das Reporting in Richtung ADAC Management. Die Programmleitung informiert die Product Owner und Work Streams zu ggfs. neu getroffenen Entscheidungen / Änderungen aus Gremien.

Vorgaben für das Jira Backlog

*Pflichtfelder für den initialen Aufbau / Import von **User Stories (US)***

- Ziel ist es, das Jira Backlog zunächst **in Excel vorzubereiten und dann zu importieren**. Damit der Import möglichst effizient klappt, müssen bitte die rechts stehenden Felder angegeben werden (in Excel als Spalten)!
[2026-02-23&24 Vorbereitung Welle 2 Planung Validierung bestehender JiraObjekte.xlsx](#)
- Eine User Story soll vom **Umfang** her so geschnitten und formuliert sein, dass Sie innerhalb von **max. 5 Tagen** abgeschlossen werden kann. Ist der geschätzte Aufwand > 5 Tage, sollte die User Story in zwei oder mehr User Stories aufgeteilt werden.
- **Customizing Aktivitäten** werden ebenfalls als User Story abgebildet.
- Sollten **EPICS** fehlen, dann diese bitte im Tabellenreiter “fehlende EPICS” ergänzen, damit wir sie noch anlegen können.




Die User Stories bilden die Grundlage der Programmsteuerung (durch PL) sowie des Testmanagement!

Darüber hinaus dürft ihr euch gerne mithilfe von „**Aufgaben**“ oder „**Sub-Tasks**“ selbst organisieren.

Jira Feld	Bedeutung / Hinweis
Zusammenfassung (Titel)	Namenskonvention: W2 Stream BKXX – Titel Bitte einen aussagekräftigen Titel verwenden!
Autor	Ersteller des Vorgangs (am besten initial WS Lead)
Bearbeiter	Verantwortlicher, die initial die Bearbeitung der US startet. Bearbeiter können im Verlauf der Zeit wechseln.
Fachl. Ansprechpartner	Person, die bei Rückfragen kontaktiert werden kann und die die User Story „abnimmt“ / auf „Fertig“ setzt.
Komponenten (in Excel auf mehrere Spalten aufgeteilt)	Hier müssen alle Streams markiert werden, die an der Umsetzung der US beteiligt sind.
Beschreibung	Es muss eine aussagekräftige Beschreibung des Arbeitspakets sowie Kriterien für die Abnahme vorhanden sein. Es muss für einen dritten Außenstehenden nachvollziehbar sein, worum es geht.
Lösungsversionen	Es muss das jeweilige Release ausgewählt werde (W2).
Buchungskreis	Bitte ein x bei den betroffenen Buchungskreisen setzen.
Priorität	Bitte bei den US, die im Laufe der ersten 6 Wochen bearbeitet werden sollen, die Priorität „2. High“ vermerken.
EPIC Name & EPIC Link	Bitte den zugehörigen Epic Namen und Link (Epic Nummer) eintragen
Stichwort	Wichtig für die Sprints → „Sprint#0“, „Sprint#1“, „Sprint#2“ und „Sprint#3“

Inhalte

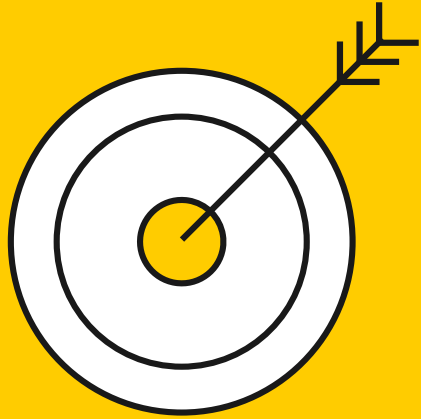

1. Scope & Vorgehen
2. Programmorganisation, Rollen & Verantwortlichkeiten
- 3. Spielregeln**
4. Eure Fragen

Unsere Spielregeln im Road to HANA

für effiziente Zusammenarbeit & Transparenz

Dokumentation

- › Sämtliche Dokumentationen & Arbeitsdokumente werden in Teams abgelegt.
- › Termine und Workshops werden in Confluence protokolliert, insbesondere Entscheidungen werden transparent festgehalten (s.   [R2H Übersicht über Entscheidungen - S4 Hana Global – Confluence](#))
- › Jeder kennt und hält sich an die folgenden (Jira & Confluence) Guidelines: [Jira & Confluence Guidelines für das Road to HANA Programm - S4 Hana Global – Confluence](#)
- › **User Stories** sowie **Anforderungen** werden in ausreichendem Umfang beschrieben und rechtzeitig eingeplant – dies erfolgt ausschließlich in Jira.


Terminmanagement

- › Terminwünsche für Workshops werden in die Workshopplanungsliste eingetragen und vom PMO koordiniert (am besten Terminwünsche grob im Team abstimmen):  [W2 - Workshopplanung - S4 Hana Global - Confluence](#)
- › Termine werden mit Agenda / Ziel eingestellt und ein geeigneter Teilnehmerkreis gewählt. Im Falle von Verhinderung wird sofern möglich eine Vertretung geschickt.
- › Kleinere Abstimmungsrunden werden bilateral durch die Stream Leads initiiert und das R2H-Postfach wird hinzugeladen.
- › Wichtige Informationen aus Terminen werden seitens der Streamleads an alle weiteren Beteiligten weitergegeben.

Organisatorisches

- › Verfügbarkeiten werden ca. 6 Wochen im Voraus in der Anwesenheitsplanung eingetragen:   [Anwesenheitsplanung - S4 Hana Global – Confluence](#)
- › Jeder Stream pflegt die im Stream beteiligten AnsprechpartnerInnen auf der Streamübergreifenden Confluence Seite (bspw. [W2 - 02 Projektmanagement - S4 Hana Global – Confluence](#)) und benennt Vertreter.
- › Die Beantragung sämtlicher Systemzugriffe erfolgt über das definierte Onboarding Formular per Mail ans PMO.
- › Während eines Sprints wird fokussiert an den ausgewählten Arbeitspaketen gearbeitet.

Inhalte

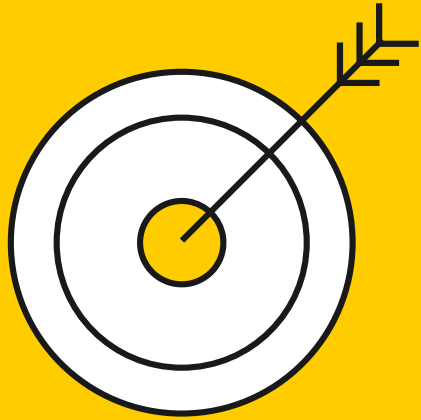

1. Scope & Vorgehen
2. Programmorganisation, Rollen & Verantwortlichkeiten
3. Spielregeln
- 4. Eure Fragen**

