

Report nach IPMA ICB 4.0

**IPMA® LEVEL B - Certified Senior Project Manager**

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Name, Vorname                                  | Seitz, Sebastian                       |
| Titel des Dokuments:                           | Report_Seitz_Sebastian_19871112_V1.pdf |
| Eingereicht zur Zertifizierungsrunde IZR/ OZRD | Z 25-8030-2024-06-11                   |
| Datum:                                         | 30. April 2026 17:25:56                |
| Version:                                       | 1.0                                    |

| Version | Datum         | Änderung               | Seite/n |
|---------|---------------|------------------------|---------|
| 1.0     | 01.April 2026 | Erstellung des Reports | alle    |

München, den 30. April 2026

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                        |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Management-Zusammenfassung</b>                                      | <b>1</b>   |
| 1.1      | Wie ist das Projekt in das eigene Unternehmen eingebettet? . . . . .   | 1          |
| 1.2      | Eigene Rolle im Unternehmen und im Projekt . . . . .                   | 1          |
| 1.3      | Kurze Beschreibung zum Projekteinhalt . . . . .                        | 1          |
| 1.4      | Management und Führung . . . . .                                       | 2          |
| 1.5      | Wesentliche Herausforderungen und Risiken im Projekt . . . . .         | 2          |
| <b>2</b> | <b>Beschreibung der Management-Herausforderungen</b>                   | <b>2</b>   |
| 2.1      | PM-Pflichtelemente . . . . .                                           | 2          |
| 04.03.02 | Governance, Strukturen und Prozesse . . . . .                          | 2          |
| 04.03.03 | Compliance, Standards und Regularien . . . . .                         | 4          |
| 04.03.04 | Macht und Interessen . . . . .                                         | 6          |
| 04.04.05 | Führung . . . . .                                                      | 7          |
| 04.05.01 | Projektdesign . . . . .                                                | 8          |
| 04.05.02 | Anforderungen und Ziele . . . . .                                      | 10         |
| 04.05.03 | Leistungsumfang und Lieferobjekte . . . . .                            | 12         |
| 04.05.04 | Ablauf und Termine . . . . .                                           | 12         |
| 04.05.05 | Organisation, Information und Dokumentation . . . . .                  | 14         |
| 04.05.06 | Qualität . . . . .                                                     | 15         |
| 04.05.07 | Kosten und Finanzierung . . . . .                                      | 16         |
| 04.05.08 | Ressourcen . . . . .                                                   | 19         |
| 04.05.09 | Beschaffung . . . . .                                                  | 21         |
| 04.05.10 | Planung und Steuerung . . . . .                                        | 22         |
| <b>3</b> | <b>Erklärung betreffend die eigenständige Ausführung dieser Arbeit</b> | <b>23</b>  |
| <b>A</b> | <b>Anhang</b>                                                          | <b>A-1</b> |
|          | Endnoten . . . . .                                                     | A-1        |
|          | Abkürzungsverzeichnis . . . . .                                        | A-2        |
|          | Glossar . . . . .                                                      | A-4        |
|          | Grafiken . . . . .                                                     | A-5        |
|          | Tabellen . . . . .                                                     | A-11       |

## Abbildungsverzeichnis

|    |                                                             |      |
|----|-------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Organigramm R2H Projekt . . . . .                           | A-5  |
| 2  | Programmschulung R2H im MyIT-Portal . . . . .               | A-6  |
| 3  | Interfaces und Integrationen von R2H . . . . .              | A-7  |
| 4  | Detailansicht des implementierten BFA-Modells . . . . .     | A-7  |
| 5  | Statusfolie Juni 2025 SST Stand . . . . .                   | A-8  |
| 6  | COP GU RICEFW . . . . .                                     | A-9  |
| 7  | Organigramm F2H Projekt . . . . .                           | A-9  |
| 8  | Zielbild der ERP-SAP-Umgebungslandschaft . . . . .          | A-10 |
| 9  | Testpläne SST . . . . .                                     | A-10 |
| 10 | Initiierung Betriebsübergabe . . . . .                      | A-10 |
| 11 | Initiierung und Übergabe . . . . .                          | A-11 |
| 12 | UAT W1.1 Datendokumentation . . . . .                       | A-12 |
| 13 | ADN SST FI Architekturbild . . . . .                        | A-13 |
| 14 | ADN SST FI Versions- und Iterationsplan . . . . .           | A-13 |
| 15 | ADN SST FI Versions- und Iterationsplan Erklärung . . . . . | A-15 |
| 16 | Anregungen W2 und Lessons Learned W1 . . . . .              | A-16 |
| 17 | GU-Ramp-Up Dokumentation Stream I2C RICEFW+PB . . . . .     | A-17 |

## Tabellenverzeichnis

|   |                                                                                  |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Abkürzungsverzeichnis . . . . .                                                  | A-3  |
| 2 | Glossar . . . . .                                                                | A-4  |
| 4 | MyIT Statusübersicht RICEFW ende HC . . . . .                                    | A-11 |
| 6 | Wellenzuordnung der Buchungskreise Road to HANA (R2H) Stand 01.05.2026 . . . . . | A-14 |

# 1 Management-Zusammenfassung

## 1.1 Wie ist das Projekt in das eigene Unternehmen eingebettet?

Der Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) ist mit rund 23 Millionen Mitgliedern der führende Verkehrsclub Europas. Die Tochtergesellschaft ADAC IT Service GmbH (AIS) fungiert dabei als zentraler IT-Dienstleister und verantwortet die gesamte Infrastruktur sowie die digitale Transformation des Konzernverbunds.<sup>1</sup> In einem Umfeld, das jährlich eine dreistellige Anzahl an IT-Projekten bewältigt, stellt das Programm R2H das strategische Kernvorhaben dar. Ziel ist die Ablösung des 25 Jahre alten SAP ERP R/3 (R/3)-Systems durch SAP S/4HANA (S/4), um durch Prozessoptimierung und Automatisierung die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sowie die regulatorische Konformität des Gesamtkonzerns sicherzustellen. Die Einbettung des Projekts in die AIS unterstreicht die Relevanz einer modernen IT-Plattform als Enabler für die Geschäftsmodelle des ADAC.

## 1.2 Eigene Rolle im Unternehmen und im Projekt

Als Projektmanager (PM) innerhalb des Bereichs IT-Transformation Office (ITT) wurde mir die Position des Workstream Lead (WSL) für den Bereich Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, Forms, Workflows (RICEFW) übertragen. In dieser Schlüsselfunktion für ERP-Systeme verantwortete ich die IT-seitige Umsetzung sämtlicher kundenindividueller Entwicklungsobjekte, Schnittstellen und komplexen Workflows. Meine Rolle zeichnet sich durch eine hohe Management-Verantwortung in einer komplexen Matrixorganisation aus: Ich führte lateral ein Team aus internen Mitarbeitenden der Finanz- und IT-Abteilungen sowie externen Experten aus sieben verschiedenen Zulieferunternehmen. Über die fachliche Steuerung hinaus oblag mir die Budgetverantwortung innerhalb des Workstreams sowie das Reporting an die technische Programmleitung und den internen Führungskreis der AIS. Die Position erforderte ein hohes Maß an Stakeholder-Management, um die Interessen der verschiedenen Unternehmenseinheiten mit den technischen Lieferzielen zu synchronisieren.

## 1.3 Kurze Beschreibung zum Projekteinhalt

Das Programm R2H ist mit einem Budget von 80 Mio. Euro und dem Ziel der Migration der 44 Rechnungskreise aus dem R/3 ins S/4 bis zum Jahr 2028 das bisher geplant umfangreichste Transformationsprojekte der Unternehmensgeschichte. Die Komplexität ergibt sich maßgeblich aus der über zwei Jahrzehntelangen Historie des Altsystems und der zentralen Bedeutung des Hauptbuchs für die Bilanzierung und Steuerung des Konzerns. Um diese Risiken zu beherrschen, wurde ein iterativer Wellenansatz gewählt, der einen parallelen Betrieb von R/3 und S/4 während der Migrationsphase vorsieht. Die Einbindung zahlreicher SAP-Komponenten wie Multi-Bank Connectivity (MBC) und Application Interface Framework (AIF) sowie die Neuintegration von Tochtergesellschaften wie der ADN erhöhten die technischen und organisatorischen Abhängigkeiten. Diese Vielschichtigkeit der Stakeholderlandschaft – vom Konzernvorstand bis zu den Regionalclubs – erforderte eine stringente Koordination der Liefergegenstände über alle Projektphasen hinweg.

## 1.4 Management und Führung

Die Steuerung des Workstreams basierte auf einer kompetenzbasierten Führung und der Etablierung einer belastbaren Projekt-Governance. Aufgrund der Komplexität der Liefergegenstände verfügte ich über weitreichende Befugnisse zur Repriorisierung von Aufgaben und zur Einleitung von Stabilisierungsmaßnahmen bei Lieferverzug. Ein wesentlicher Fokus meiner Führungstätigkeit lag auf dem Skill-Management: Ich validierte kontinuierlich die Kompetenzen der Teilprojektleitenden und förderte durch gezieltes Coaching in Bereichen wie Anforderungsmanagement und Architekturverständnis ein einheitliches Qualitätsniveau. Zur strukturellen Absicherung des Projekterfolgs führte ich ein übergreifendes Governance-Modell für RICEFW und AIF ein, welches klare Rollen, Verantwortlichkeiten und Qualitätsstandards für alle internen und externen Beteiligten definierte. Diese Maßnahmen stellten sicher, dass der Workstream trotz der heterogenen Teamzusammensetzung agil und lieferfähig blieb.

## 1.5 Wesentliche Herausforderungen und Risiken im Projekt

Im Projektverlauf stellte insbesondere die Diskrepanz zwischen dem ursprünglich propagierten Greenfield Approach (GFA) und der tatsächlichen Komplexität der Altsystem-Integration eine zentrale Herausforderung dar. Ich begleitete maßgeblich den strategischen Schwenk hin zu einer realistischen Auslieferungsplanung im Rahmen eines Brownfield Approach (BFA) gegenüber der Außenwelt und steuerte die daraus resultierenden Scope-Anpassungen durch konsequentes Risikomanagement. Eine weitere kritische Hürde war der Mangel an historischem End-to-End (E2E)-Prozesswissen im Fachbrereiche (FB) und fehlendem internen S/4-Konw-How in der S/4, dem ich durch den gezielten Aufbau spezialisierter Ressourcen und Wissensformate entgegenwirkte. In Krisensituationen, etwa bei qualitativen Defiziten externer Partner, sicherte ich durch moderierte Klärungsrunden und eine transparente Change-Kommunikation die Stabilität des Gesamtprogramms. Die aktive Gestaltung des Wandels hin zu einer Public Cloud Ready (PCR)-Architektur war dabei entscheidend, um die Akzeptanz der neuen Prozesse bei den betroffenen Stakeholdern zu festigen und Konflikte frühzeitig zu neutralisieren.

# 2 Beschreibung der Management-Herausforderungen

## 2.1 PM-Pflichtelemente

### 04.03.02 Governance, Strukturen und Prozesse

Das Programm R2H (80 Mio. € über 8 Jahre, Transformation von 44 ADAC-eigenen Buchungskreis (BK) von R/3 zu S/4) ist eines der komplexesten Vorhaben beim ADAC. Als Leiter des Workstream (WS) RICEFW musste ich in einer komplexen Matrixorganisation mit begrenzten Ressourcen und sieben externen Zulieferern Governance-Strukturen etablieren. Anfangs fehlte ein Regelwerk zur einheitlichen Steuerung, Abnahme und Integration der über 400 RICEFW-Objekte.

#### **04.03.02.01 Die Grundlagen des Projektmanagements und deren Einführung kennen**

Als WSL etablierte ich belastbare Governance-Strukturen für einheitliche Qualität und Termintreue bei 7 Zulieferern und 400 Objekten trotz geringem Projektmanagementreifeegrad (PMR).

Ich definierte ein Ressourcen, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Informierte (RASCI)-basiertes Governance-Modell mit standardisierten Prozessen, Quality-Gates und Dokumentationsstandards. Implementierte wöchentliche Gremien (AIS-Jour Fixe (JF), R2H-JF, Flight to HANA (F2H)-Schnittstellen-JF) und steuerte den Übergang von Ad-hoc zu Meilenstein-basiertem Management.

Der PMR stieg signifikant mit klaren Verantwortlichkeiten. Die Governance ermöglichte kontrollierte Führung der Implementierung durch Build, Test und Transport und reduzierte Reibungsverluste. Das WS Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, Forms, Workflows und Parallelbetrieb (WSR) blieb lieferfähig und unterstützte die termingerechte Migration.

Die frühe Etablierung von Governance war entscheidend für Transparenz und Koordination. In zukünftigen ähnlich komplexen Szenarien werde ich noch stärker auf regelmäßige Retrospektiven setzen, um Governance-Anpassungen agile vornehmen zu können.

#### **04.03.02.02 Die Grundlagen des Programmmanagements und deren Einführung kennen**

Nach Etablierung der Governance-Strukturen sicherte ich operativ die Einhaltung bei sieben Zulieferern durch Mechanismen zur frühzeitigen Erkennung von Abweichungen in einem wenig standardisierten Umfeld.

Ich führte systematisches Controlling mit SMART Key Performance Indicators (SMART KPIs) (Reduktionsquote, Clean-Core-Konformität) ein und etablierte Review-Cycles gegen Standards. Bei Schwachstellen (z.B. AIF-Einführung) passte ich den Scope an und forderte Nachbesserungen ein.

Die Lieferqualität stabilisierte sich. Frühzeitige Identifikation verhinderte Engpässe im kritischen Pfad. Die Akzeptanz stieg durch verlässliche Planung und reduzierte Krisen; Governance bewährte sich als aktives Führungsinstrument.

Die Einführung standardisierter KPIs war ein Schlüsselfaktor für Transparenz und Liefersicherheit. In zukünftigen Programmen werde ich KPI-Definition noch früher einbinden, um Monitoring von Tag 1 zu ermöglichen.

#### **04.03.02.04 Das Projekt mit den Supportfunktionen in Einklang bringen**

Aufgrund seines Volumens und der Beteiligung von sieben externen Partnern stellte das Programm R2H hohe Anforderungen an die Supportfunktionen des ADAC und der AIS. Meine Aufgabe war es, eine nahtlose Zusammenarbeit mit der Abteilung Zentraleinkauf (ZEK), der Juristische Zentrale (JUR) und der Controlling (CON) sicherzustellen, um die operativen Lieferbedarfe des WS RICEFW rechtlich und betriebswirtschaftlich abzusichern und Verzögerungen durch administrative Flaschenhälse zu vermeiden.

Ich initiierte einen engen Abstimmungsprozess mit dem ZEK, um Leistungsbeschreibungen und Ausschreibungen nach meinen Governance-Standards zu präzisieren. Mit der Rechtsabteilung sicherte ich Datenschutz, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und Datensicherheit bei Anbindung externer Teams. Mit dem Projekt-Controlling etablierte ich Budget-Monitoring für die RICEFW-

Umsetzung. Implementierte Prozess für zeitnahe Leistungsbestätigung, um Rechnungsprüfung auf Basis qualitätsgeprüfter Deliverables zu ermöglichen.

Administrative Prozesse wurden synchron zum Projektfortschritt gehalten; keine Verzögerungen bei Beauftragung oder Bezahlung, was Motivation und Liefertreue stärkte. Compliance gegenüber konzernweiten Vorgaben vollumfänglich gewahrt durch Einbindung von JUR, ZEK, CON, Abteilung Digitalrecht (JDR), Rechtsabteilung (REC) und ADAC Compliance Service GmbH (COM). Damit habe ich nachgewiesen, dass ich komplexe IT-Projekte in administrative Rahmenbedingungen integrieren und diese als Enabler nutzen kann.

#### **04.03.02.05 Das Projekt mit den Entscheidungs- und Berichterstattungsstrukturen sowie den Qualitätsanforderungen der Organisation in Einklang bringen**

Aufgrund seiner Natur mit basaler Relevanz für die GoB, der Beteiligung von sieben externen Partnern und aller Konzernunternehmen stellte das Programm R2H hohe Anforderungen an Entscheidungs- und Berichtsstrukturen samt Qualitätsanforderungen. Als WSL stellte ich nahtlose Datenbelieferung im S/4 sicher und etablierte adäquate Berichtsstrukturen und Qualitätsanforderungen.

Da mein Counterpart des Generalunternehmer (GU) im WS Schnittstellen (SST) die definierten Anforderungen an wöchentliche Statusberichte nicht erfüllte, definierte und implementierte ich Berichtsstrukturen und Qualitätsanforderungen eigenständig (vgl. Abbildung 5). Gestaltete sie GoB-konform und entscheidungsrelevant. Implementierte Qualitätssicherungsprozess für gelieferte RICEFW-Objekte zur Zuverlässigkeit der Berichte (vgl. Abbildung 9).

Statusberichte entsprechen Programmleiter (PL)-Anforderungen und liefern relevante Informationen in benötigter Tiefe, Qualität und adressatengerecht. Qualitätssicherung verbesserte Qualität und Aktualität, erleichterte Entscheidungsfindung auf Managementebene. Nachweis: Fähigkeit, Berichtsstrukturen und Qualitätsanforderungen eigenständig zu definieren und zu implementieren.

Rückblickend hätte ich Anforderungen klarer definiert und kommuniziert, um Missverständnisse zu vermeiden. Regelmäßige Feedbackschleifen mit Stakeholdern wären hilfreich gewesen. Zukünftig kläre ich Standards frühzeitig und arbeite eng mit Stakeholdern zusammen, um optimale Entscheidungsunterstützung zu gewährleisten.

#### **04.03.03 Compliance, Standards und Regularien**

Besonders herausfordernd war die Ausgangslage im WSR: Die initial ermittelten mehr als 400 RICEFW-Objekte umfassten tiefgreifende Eingriffe in zentrale GoB-relevante Geschäftsprozesse, rund 160 initial identifizierte Schnittstellen, zusätzliche manuelle Datenflüsse und strukturelle IT-Architekturänderungen. Dadurch waren technische, rechtliche, datenschutzrechtliche, sicherheitsrelevante und betriebswirtschaftliche Vorgaben unmittelbar betroffen.

##### **04.03.03.01. Die für das Projekt gültigen Rechtsvorschriften identifizieren und einhalten**

Als WSL RICEFW identifizierte und bewertete ich relevante gesetzliche, regulatorische und konzerninterne Vorschriften (Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), Digital Operational Resilience Act (DORA), Kritische Infrastrukturen (KRITIS), GoB/Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und



Datenerfassung (GoBD), Compliance, Sicherheitsrichtlinien, PCR-Anforderungen SAP, luftfahrttechnische Regularien für Aero-Dienst Nürnberg GmbH (ADN)) und überführte sie in ein verbindliches Steuerungsmodell. Ziel: Auditierbares, reproduzierbares Compliance-Management über sieben Zulieferer.

Bestellte programmweites Rechts- und Standardregister, konsolidierte Regularien und ließ es durch JUR, COM, JDR und IT-Sicherheit (ITSEC) validieren. Definierte Checkpoints mit regulatorischer Klassifizierung, Prüfungen (Archivierung, Logging), Clean-Core-Bewertungen und GoBD-Prüfpunkten. Alle RICEFW-Objekte durchliefen Compliance-Check; 100% Checks für Welle 1 vorhanden. Keine kritischen Verstöße in User Acceptance Testing (UAT), Cutover-Quality-Gate und Wirtschaftsprüfer (WP)-Prüfung. PCR-Qualität nicht erreicht wegen Wechsels zu GFA; als Technical Debt (TD) dokumentiert, Refactoring abgestimmt.<sup>2</sup> Nachweis: Fähigkeit, regulatorische Anforderungen systematisch zu identifizieren und einzuhalten.

Zukünftig Einbezug von Rechts- und Compliancefunktionen in frühe Backlog-Refinements verlagern, um Anforderungen rechtssicher einzuordnen.

#### **04.03.03.02. Alle für das Projekt relevanten Verhaltensregeln und Berufsvorschriften identifizieren und einhalten**

Als WSL RICEFW identifizierte ich relevante Verhaltensregeln und Berufsvorschriften (Arbeitszeit, Arbeitsschutz, Betriebsvereinbarungen, Datenschutz, SAP-Standards, Code of Conduct) und überführte sie in ein Governance-Modell. Ziel: Einhaltung sicherstellen, Gesundheit schützen, Lieferfähigkeit erhalten.

Strukturierte Identifikation mit Human Resources (HR), Rechtsabteilungen (REC, JUR, JDR), langjährigen Mitarbeitenden und Program Management Office (PMO). Implementierte Arbeitszeit-Governance mit Kernarbeitszeit Montag-Donnerstag 09:00-17:30. Ergänzte Definition of Done (DoD) um Compliance-Prüfpunkte. Einführte abgestuftes Kommunikationsmanagement. Dokumentierte Risiken im Register. Alle Vorschriften eingehalten; keine Verstöße im Verlauf der Produktivsetzungen. Verbesserte Zusammenarbeit und Arbeitsumfeld. Prüfung von produktionsnahen Datennutzung erhöhte Sensibilisierung für Compliance-Risiken.

Frühzeitige Einbindung von HR, Legal, IT-Security und Betriebsrat (BR) beibehalten. Einführung automatisierter Dashboards und Standardisierung von Templates zur Effizienzsteigerung.

#### **04.03.03.05 Für das Projekt relevante fachliche Standards und Tools beurteilen, nutzen und weiterentwickeln**

Als WSL beurteilte, nutzte und entwickelte ich fachliche Standards und Tools weiter (SAP-Entwicklungs- und Transportstandards, Toolstrategie, BFA für Schnittstellen, Ablösung SAP CALM zu JIRA/Confluence). Ziel: Konsistentes, effizientes Vorgehensmodell mit Qualität, Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Effizienz.

Systematische Analyse und Bewertung nach Kriterien (Skalierbarkeit, Integrationsfähigkeit, Governance-Konformität, Nutzbarkeit). Migrationspfad für JIRA/Confluence, Governance-Regeln, Abstimmung mit Partnern. Etablierte Austauschformate (Show-and-Tell, Lessons-Learned, Workshops). Schulungen via MyIT-Portal (MyIT) (vgl. Abbildung 2). Kombination aus Governance, Enablement und

Verbesserungsprozess.

Steigerung von Qualität, Effizienz, Konsistenz; termingerechter Go-Live der AIS. Reduzierte Fehler durch Standards in Integration Suite (IS), Stonebranch Universal Automation Center (UAC), ADAC Datenportal (DP) (vgl. Abbildung 4). Höhere Transparenz und Rückverfolgbarkeit durch JIRA/Confluence. BFA als tragfähig für Schnittstellenharmonisierung. Wissensaustausch professionalisierte Arbeitsweise und Übernahme in angrenzende Streams.

Frühzeitige Strategie entscheidend. Wechsel hätte durch frühere Stakeholder-Einbindung beschleunigt werden können.<sup>3</sup> Kommunikationsstrategie hätte Akzeptanz von AIF gesteigert. Zukünftig: Frühe Toolentscheidungen, iterative Abstimmungen, kontinuierliche Weiterentwicklung als Governance-Prozess.

#### **04.03.04 Macht und Interessen**

Die manigfaltigkeit der Stakeholder aus den 44 betroffenen Gesellschaften, die Vielzahl der betroffenen Geschäftsprozesse, die angedachte Komplexität der IT-Architekturänderungen sowie die Vielzahl (> 150) der Schnittstellen und Datenflüsse und die unvermeidlichen Umwelteinflüsse (ADN) und unterschiedlichen Gremien führten zu einem komplexen Geflecht von Machtverhältnissen und Interessenkonflikten. Es gab zahlreiche interne Stakeholder mit stark konträren Interessen, die von differierenden technischen und fachlichen Anforderungen an das S/4 reichten.

##### **04.03.04.01. Persönliche Ambitionen und Interessen Dritter und deren potenzielle Auswirkungen auf das Projekt beurteilen sowie diese Kenntnisse zum Nutzen des Projekts einsetzen**

Als WSL RICEFW identifizierte ich systematisch persönliche Ambitionen, Interessen und Einflussmechanismen aller Stakeholder (formale Rollen, informelle Netzwerke, Machtverhältnisse, Motivationen). Analytierte potenzielle Auswirkungen und nutzte dieses Wissen für Projekterfolg. Ziel: Verständnis der Interessenlage, frühzeitige Risikerkennung, Chance-Nutzung.

Strukturierte, mehrstufige Stakeholderanalyse (formale Hierarchien, informelle Strukturen). Umfeldanalyse in Entwicklungsabteilung Enterprise Systeme (IEA) und Entwicklungsabteilung Enterprise Systeme (IEB), Auswertung von Projekt- und Organisationsdokumenten (R/3, Lift & Shift (LnS)), bilaterale Gespräche mit Schlüsselpersonen (Geschäftsführung AIS, Abteilung Finanzen (FNZ), Programmumfeld). Entwickelte Strategien zur Einbindung von Stakeholdern, steuerte Erwartungen bzgl. Ressourcenmangel (Parallelbetrieb (PB), R/3/S/4, IS-Know-How).

Stakeholder-Analyse ermöglichte Betriebsverantwortlichen der AIS (IEA, IEB) frühzeitig die Notwendigkeit der Ausschreibung des Plattformbetriebs an externe Partner zu verdeutlichen. Sicherte Unterstützung der Geschäftsführung.

Intensive und kontinuierliche Stakeholder-Analyse war entscheidend für Navigation komplexer Machtverhältnisse und Interessenkonflikte. Zukünftig: Praxis beibehalten, Erkenntnisse stärker in Projektkommunikation und Planung integrieren, proaktiv auf Konflikte reagieren.

#### **04.03.04.03. Persönlichkeiten und Arbeitsstile Dritter beurteilen und zum Nutzen des Projekts einsetzen**

Als WSL RICEFW beurteilte ich Persönlichkeiten und Arbeitsstile von Teammitgliedern und Stakeholdern und nutzte diese strategisch. In diesem komplexen Projektumfeld mit divergierenden Interessen und Machtpositionen war es entscheidend, diese Dynamiken zu verstehen und gezielt einzusetzen.

Identifizierte Stakeholdergruppen (Betriebsverantwortliche AIS—IEAs, IEBS, Geschäftsführung ADAC, Projektteams R/3/S/4) und analysierte Interessen, Machtpositionen und Einfluss. Nutzte Interviews, Workshops und Analysen. Entwickelte Kommunikations- und Interaktionsstrategie. In UAT bezog Betriebsverantwortliche frühzeitig ein, adressierte Bedenken. Unterstützte FB beim Rahmenwerk für Datenhoheit im Testmandanten (vgl.?? und ??).

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern; kanalisierte unstrukturierte Anfragen des FB in konsistente Ausführungsreihenfolge. Klare Verantwortlichkeiten minimiert Konflikte. Projektziele erreicht durch strategische Stakeholder-Interaktion.

Erkenntnis: Verständnis von Persönlichkeiten und Arbeitsstilen ist essentiell für Zusammenarbeit und Projekterfolg. Proaktive, empathische Stakeholder-Interaktion baut Vertrauen und sichert Veränderungsakzeptanz. Zukünftig: Fähigkeiten weiter einsetzen zur effektiven Stakeholder-Dynamik-Verwaltung.

#### **04.04.05 Führung**

Der WSR war als Matrixorganisation mit internen Mitarbeitenden (AIS, FNZ) und sieben externen Zulieferern strukturiert. Ohne disziplinarische Befugnisse war die Zusammenarbeit vollständig durch laterale Führung geprägt. Die initiale Analysephase unterschätzte die tatsächliche Komplexität der gewachsenen R/3-Landschaft: Individualentwicklungen, Sonderlösungen und fehlendes Know-how führten zu erheblichen Risiken (Terminplanung, Ressourcen, Stabilität). Programmplanung musste aufgrund hoher WS-Abhängigkeiten mehrfach angepasst werden. Welle 1 wurde in vier Unterwellen (1.0, 1.1, 1.2, 1.3) aufgeteilt, was Druck auf Koordination, Priorisierung und Parallelbetrieb erhöhte. Entscheidend waren nicht nur technische Lieferobjekte, sondern insbesondere Führung eines heterogenen, verteilten Projektumfelds, um Programmziele zu erreichen, Risiken zu beherrschen und Stabilität für Produktivsetzungen zu sichern.

##### **04.04.05.01. Initiative ergreifen und proaktiv mit Rat und Tat zur Seite stehen**

Als WSL verstand ich meine Aufgabe als proaktive Führung in komplexem, heterogenem Projektumfeld. Angesichts hoher Schnittstellen-Abhängigkeiten, dynamischer Programmplanung und Parallelbetrieb-Herausforderungen (R/3/S/4) war frühzeitige Initiative entscheidend für Risikobeherrschung, Systemstabilität und Koordination.

Entwickelte Konzept für Testdaten-Beschaffung aus Produktivbetrieb und Synchronisationsplan für Parallelbetrieb. Nutzte proaktives Risiko-/Eskalationsmanagement für Datenverarbeitung in S/4. Setzte intensive Kommunikation ein für Informationsaustausch und Akzeptanzförderung (vgl. Abbildung 5). Maßnahmen konnten nicht alle Herausforderungen beseitigen; Führung musste kontinuierlich angepasst werden. Enge Zusammenarbeit mit Partnern und Stakeholdern sicherte Stabilität und Zielerreichung. Risiken in S/4-Datenverarbeitung führten zu Verzögerungen.

Zukünftig: Bündelung in einem Projekt und frühzeitige Anforderungen (Kontextdiagramm, Schnittstellenbeschreibung) reduzieren Parallelbetrieb-Risiken. Proaktive Führung war entscheidend für Ziele und Stabilität.

#### **04.04.05.02. Ownership übernehmen und Commitment zeigen**

Im komplexen Projektumfeld mit hohen Schnittstellenabhängigkeiten, dynamischer Programmplanung und PB-Herausforderungen (R/3/S/4) war es entscheidend, Ownership für Gesamtkoordination des Cut Over Plan (COP) zu übernehmen, inklusive Migrationszeitpunkte. Hohes Engagement förderte Zusammenarbeit und proaktives Handeln.

Entzog Counterpart auf GU-Seite Verantwortung für COP-Koordination aufgrund unzureichender Planungstiefe und übernahm sie selbst (vgl. Abbildung 6 und Abbildung 17). Etablierte regelmäßige Abstimmungsmeetings mit Stakeholdern zur Fortschrittsverfolgung und Lösungsentwicklung für GFA/S/4 und BFA. Nutzte intensive Kommunikation für Akzeptanzförderung.

Ownership-Übernahme und Commitment sicherten COP-Koordination und förderten Zusammenarbeit. Resultat: Detailliertere COP, abgestimmte Deliverables, schnellere Problemlösung. Produktivsetzung S/4, Migration BK 3800 und HyperCare (HC) nahezu reibungsfrei hinsichtlich RICEFW-Objekte, trotz PB-Herausforderungen.

Operative COP-Übernahme in Detailtiefe nicht mehr möglich als WSR-PM; künftig Auswirkungsanalyse für Parallelbetrieb und COP in allen WSR-Umsetzungen.

#### **04.04.05.05. Entscheidungen treffen, durchsetzen und überprüfen**

Als WSR-PM musste ich schwere Entscheidungen treffen, durchsetzen und kontinuierlich überprüfen. Angesichts Komplexität, Stakeholder-Vielfalt und PB-Herausforderungen (R/3/S/4) waren klare Entscheidungen entscheidend für Systemstabilität und Zielerreichung.

Übernahm COP-Koordination (wie zuvor beschrieben). Entschied Auflösung Vertragsbeziehung mit externem Partner für COP, um Führung sicherzustellen.

Entscheidung führte zu detaillierterer COP, abgestimmten Deliverables, schnellerer Problemlösung. Gesamtverantwortung für technischen Programmpart RICEFW und PB ab Welle 1.1 in meiner Rolle gebündelt.

Vertragsumgestaltung und Nicht-Nachbesetzung Co-Streamlead ermöglichten klare Verantwortung und schnellere Entscheidungen, positiv für Fortschritte. Mehrbelastung für mich durch technische Steuerung. Zukünftig: Verantwortlichkeiten klar definieren und delegieren für nachhaltige Führung.

#### **04.05.01 Projektdesign**

Die Ausgangslage für das Projektdesign war durch die Tragweite der Transformation geprägt: Alle im R/3 geführten BK sollten innerhalb von acht Jahren aus dem historisch gewachsenen, heterogenen R/3-System in ein modernes, standardisiertes S/4-System überführt werden. Das Umfeld war gekennzeichnet durch zahlreiche Stakeholder, komplexe Abhängigkeiten der über 400 zu entwickelnden RICEFW-Objekte und die Forderung, den laufenden Betrieb während der Transformation aufrechtzuerhalten. Zusätzliche Scope-Anpassungen wie die Neueinführung von SAP als Enterprise Resource Planning

(ERP) bei ADN, die Nutzung von MBC für Bankkommunikation und die Einführung von DRC zur Sicherstellung der E-Invoice im Business-to-Business (B2B)-Umfeld verstärkten die Komplexität. In diesem Kontext war ein Projektdesign erforderlich, das technische, organisatorische, prozessuale und kulturelle Herausforderungen gleichermaßen adressierte, um die Transformation erfolgreich umzusetzen.

#### **04.05.01.01. Erfolgskriterien anerkennen, priorisieren und überprüfen**

In dem langlaufenden, komplexen Projektumfeld mit hohen Abhängigkeiten, zahlreichen Stakeholdern und parallel laufendem Betrieb von R/3 und S/4 war es meine Aufgabe, E2E-übergreifende Erfolgskriterien aktiv zu steuern. Ich konzentrierte mich nicht nur auf die technische Steuerung der RICEFW-Liefergegenstände, sondern lenkte den Fokus auch auf die fachlichen, technischen und organisatorischen Ziele des Programs.

In enger Abstimmung mit den Stakeholdern definierte, priorisierte und überprüfte ich die Erfolgskriterien entlang der E2E-Prozesskette. Als PM integrierte ich diese Kriterien in die tägliche Projektarbeit und stellte sicher, dass sie von allen Beteiligten verstanden und verfolgt wurden. Dazu gehörte auch der bewusste Verzicht auf den AIF-Ansatz zugunsten von Code Conversion (CC) als gezielte TD, um die priorisierten Kriterien zu erfüllen. Die wichtigsten Kriterien waren: vollständige und fehlerfreie Abdeckung der fachlichen Kernprozesse der Buchungskreise, Einhaltung technischer Qualitätsstandards für RICEFW-Objekte, Minimierung von Störungen in der HC-Phase sowie organisatorische Absicherung des Parallelbetriebs.

Die konsequente Fokussierung auf priorisierte Erfolgskriterien sicherte den technischen Erfolg von Cut Over Durchführung (COD), HC und der Teilübergabe des S/4 in den Linienbetrieb sowie die Erfüllung fachlicher Stakeholder-Anforderungen. Der laufende Betrieb blieb während der Projektlaufzeit stabil. Die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Kriterien ermöglichte flexible Reaktionen auf Veränderungen und hielt das Projekt auf die wichtigsten Ziele ausgerichtet.

Die Erfahrung zeigt, dass klare Definition und Priorisierung von Erfolgskriterien in komplexen Projekten entscheidend sind. Erfolgskriterien müssen integraler Bestandteil von Planung und Durchführung sein, damit alle Aktivitäten auf die übergeordneten Ziele ausgerichtet sind. Die fortlaufende Überprüfung und Anpassung der Kriterien ist erforderlich, um auf Veränderungen im Projektumfeld zu reagieren und den Fokus zu halten.

#### **04.05.01.02. Lessons Learned aus – und mit – anderen Projekten überprüfen, anwenden und austauschen:**

Im komplexen Umfeld mit Parallelbetrieb von R/3 und S/4 war aktiver Austausch mit anderen Projekten entscheidend, um Lessons Learned zu nutzen und eigene zu teilen. Ziel: Vereinheitlichung der Umgebungslandschaft in der ERP-Welt (vgl. Abbildung 8).

Als Product Owner (PO) aus vorangegangenen Projekten (In-/Exkasso (In/Ex)) brachte ich wertvolle Einblicke ein. Suchte regelmäßig Austausch mit anderen Teams, bewertete Übertragbarkeit und teilte eigene Erkenntnisse.

Gemeinsam gestaltete Umgebungslandschaft für ERP-Welt, die fachliche und technische Anforderungen aus diversen Projekten abbildet, inklusive Sub-Ledger (SL) und General Ledger (GL).<sup>4</sup> Berücksichtigte

Stakeholder-Bedürfnisse. Moderierte Workshops zur Konfliktlösung. Austausch verhinderte Fehler, förderte bewährte Praktiken und innovative Lösungen.

Grundlegende Klärung der Umgebungslandschaft nur durch aktiven Austausch möglich. Unternehmensweite Standardisierung wünschenswert, um Komplexität zu reduzieren.<sup>5</sup>

#### **04.05.01.05 Konzept für die Projektdurchführung entwerfen, überwachen und anpassen**

Nach der Vorstandentscheidung des ADAC, die ADN als BK in das F2H-Projekt zu integrieren, war eine Anpassung des Projektdurchführungskonzepts erforderlich. Ziel war es, die neuen ADN-Schnittstellen zu berücksichtigen und die Zusammenarbeit aller Parteien auf einer einheitlichen Systembasis zu sichern.

Die Anbindung der ADN an die ERP-Systeme des ADAC war neuartig; etablierte Prozesse oder Best Practices fehlten. Deshalb entwickelte ich ein neues Durchführungs-Konzept, das die speziellen Anforderungen und Herausforderungen der ADN-Integration umfasst. Die Entscheidung fiel auf die Nutzung der für das Hauptprojekt R2H geplanten AIF-Schnittstellentechnik für die ADN-Schnittstellen. Zur Risikominimierung arbeitete das F2H-Projekt mit kürzeren Iterationen und einem agilen Projektmanagementtool. Ziel war die frühzeitige Implementierung und Prüfung der ADN-Schnittstellen. Regelmäßige Abstimmungen stellten sicher, dass alle Partner informiert waren und Probleme frühzeitig adressiert werden konnten.

Die Anpassung des Durchführungs-Konzepts ermöglichte die erfolgreiche Berücksichtigung der ADN-Integration. Das Projektmanagementtool erlaubte kontinuierliche Überwachung der Schnittstellenentwicklung und gezielte Anpassungen. Dieser Zuschnitt findet auch im Hauptprojekt R2H für die Welle 1.2 ff. Anwendung.

Die Integration der ADN war technisch, organisatorisch und menschlich herausfordernd, weil die ADN eine S/4-Anbindung nicht bevorzugte. Aufgrund eines schwachen Mandats konnte ich die ADN-Anbindung nicht durchsetzen.

Dennoch sicherte das angepasste Konzept eine erfolgreiche Integration der ADN ohne größere Verzögerungen oder Probleme. Wünschenswert wäre gewesen, die ADN-Anbindung von Beginn an als festen Projektbestandteil zu berücksichtigen, um eine nahtlosere Integration und frühere Problemlösungen zu ermöglichen.

#### **04.05.02 Anforderungen und Ziele**

Die Anforderungen und Ziele des WSR wurden durch die Ausgangslage, Rahmenbedingungen, Stakeholder-Interessen und die Führung des S/4-Programms geprägt. Als WSL analysierte ich diese Einflussfaktoren systematisch und nutzte sie als Basis für die Ableitung und Steuerung der Projektziele und Anforderungen. Die Vorstandentscheidung des ADAC, die ADN als BK in das F2H-Projekt zu integrieren, erweiterte den Implementierungsumfang erheblich und erhöhte die fachliche sowie technische Komplexität deutlich.

#### **04.05.02.01 Hierarchie der Projektziele definieren und entwickeln**

Neben den bestehenden Herausforderungen durch den Parallelbetrieb von R/3 und S/4 erforderte die Integration der ADN zusätzliche Anpassungen. Diese betrafen nicht nur Technik, sondern auch Zusammenarbeit, Zeitplanung, Abstimmungsprozesse und Umgebungsgestaltung. Ich passte Anforderungen und Ziele des Projekts an, um die zeitkritische Integration der ADN trotz des bevorstehenden Lebensendes der bisherigen ERP-Lösung umzusetzen, ohne die übergeordneten Ziele des S/4-Programms zu kompromittieren.

Die Anbindung der vier Vorsysteme der ADN an die ERP-Systeme des ADAC war neuartig; etablierte Prozesse fehlten. Deshalb entwickelte ich ein neues Konzept für die Projektdurchführung, das die speziellen Anforderungen der ADN-Integration berücksichtigt. Dazu gehörte die Entscheidung, die für das Hauptprojekt R2H geplante AIF-Schnittstellentechnik für die ADN zu nutzen und ein separates Projekt F2H mit eigenem Budget und Ressourcen zu starten, um die Integration gezielt zu fokussieren und Risiken beherrschbar zu machen.

Die Anpassung von Anforderungen, Zielen und Projektdurchführung ermöglichte die erfolgreiche Berücksichtigung der ADN-Integration. Das Projektmanagementtool erlaubte kontinuierliche Überwachung der Schnittstellenentwicklung und gezielte Anpassungen. Dieser Zuschnitt findet im Hauptprojekt R2H für Welle 1.2 ff. Anwendung.

Aufgrund des schwachen Mandats konnte ich die ADN-Anbindung nicht von Anfang an als festen Bestandteil des Projekts durchsetzen. Dennoch sicherte das angepasste Konzept eine erfolgreiche Integration der ADN ohne größere Verzögerungen oder Probleme. Ich hätte die ADN-Anbindung früher als festen Projektbestandteil verankern sollen, um eine nahtlosere Integration und frühere Problemlösungen zu ermöglichen.

#### **04.05.02.03 Anforderungen und Abnahmekriterien priorisieren und darüber entscheiden**

Die Anbindung der SST an S/4 war im RUP nicht vorgesehen. Ich definierte, priorisierte und entschied über Anforderungen und Abnahmekriterien für die SST-Integration, um die erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen, ohne die Ziele des S/4-Programms zu gefährden.

Im Rahmen einer CC ohne AIF entwickelte ich ein angepasstes Projektdurchführungskonzept, das die SST-Integration als festen Projektbestandteil verankerte. Dadurch konnten die Anforderungen und Abnahmekriterien für den FB vordefiniert, priorisiert und in das Projektmanagementtool überführt werden (vgl. Abbildung 9).

Mein Dashboard im Projektmanagementtool ermöglichte die kontinuierliche Überwachung der Schnittstellenentwicklung und proaktives Eingreifen bei Planabweichungen. So wurde die SST-Integration in Welle 1.0 erfolgreich umgesetzt. Die von mir verantworteten RICEFW-Objekte blieben im Zeitplan für Welle 1.1 und den anstehenden Integrationstest 1 (IT1), ein wichtiger Meilenstein für die Integration der SSTs in S/4.

Aufgrund der zweiten Verschiebung des Go-Live-Termins für den BK 2400 und der Verschiebung von Welle 1.0 besteht nun die Chance, Anforderungen und Abnahmekriterien für den FB weiter zu verfeinern. Damit kann sichergestellt werden, dass die Integration nicht nur technisch erfolgreich umgesetzt wird, sondern auch Prozesswissen in den Betrieb überführt und das S/4-Programm langfristig entlastet.

### **04.05.03 Leistungsumfang und Lieferobjekte**

Der Leistungsumfang wurde durch drei strategische Vorstandsentscheidungen geprägt: AIF-Verschiebung, Aufspaltung von Welle 1.0 und Integration der ADN als BK. Dies erweiterte den Umfang und erforderte neue Abstimmungsprozesse zwischen Parteien und technischer RICEFW-Umsetzung.

#### **04.05.03.01 Lieferobjekte definieren**

Nach der Entscheidung zur Anbindung der ADN an S/4 im Rahmen des F2H-Projekts war es meine Aufgabe, die Lieferobjekte für diese Anbindung zu definieren. Dazu gehörte die Identifikation notwendiger Komponenten, Schnittstellen und Datenflüsse sowie die Erarbeitung eines Zielbildes für die Gesamtintegration.

Ich führte eine detaillierte Analyse der bestehenden Systeme und Prozesse durch und arbeitete eng mit den technischen Teams zusammen, um die Schnittstellen und Datenflüsse zu identifizieren (vgl. Abbildung 13). Mit den Stakeholdern erstellte ich ein umfassendes Dokument, das die Lieferobjekte, ihre Funktionen und Beziehungen zueinander beschreibt.

Das Dokument diente als Grundlage für die weitere Planung und Umsetzung der ADN-Anbindung. Es sicherte ein gemeinsames Verständnis der Anforderungen und Ziele ab und erleichterte die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Teams während der Implementierungsphase.

Die strukturierte Definition der Lieferobjekte sicherte eine effiziente und nachvollziehbare Umsetzung der ADN-Anbindung. Dies trug wesentlich dazu bei, dass das Projekt im Zeitplan und Budget geblieben ist. Diese Vorgehensweise werde ich als Best Practice in zukünftigen Wellen des S/4-Programms anwenden.

#### **04.05.03.02 Leistungsumfang strukturieren**

Meine Aufgabe war es, den Leistungsumfang der ADN-S/4-Anbindung in überschaubare Arbeitspakete zu unterteilen, Abhängigkeiten zu identifizieren und Aufgaben zu priorisieren.

Ich analysierte die E2E-Lieferkette und identifizierte die erforderlichen Komponenten und Schnittstellen. Basierend auf der Customer Journey (CJ) strukturierte ich den Leistungsumfang in Arbeitspakete, definierte ihre Abhängigkeiten und priorisierte sie nach fachlicher Bedeutung, Implementierungslogik und verfügbaren Ressourcen.

Der Leistungsumfang des WSR wurde in drei Hauptblöcke strukturiert: Business Technology Platform (BTP), AIF und minimales ADN-spezifisches Customizing in S/4. Dies ermöglichte eine effiziente Planung und Umsetzung mit klar definierten Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten.

Die klare Strukturierung der Arbeitspakete mit definierten Verantwortlichkeiten verbesserte die Kommunikation und hielt den RICEFW-Anteil im Zeitplan. Eine intensivere Abstimmung mit den Vorsystemen hätte die Qualitätstreue weiter verbessern können; dies werde ich in zukünftigen Projekten verstärken.

#### **04.05.04 Ablauf und Termine**

Der WSR wurde im iterativen, phasenorientierten S/4-Programm durchgeführt. Aufgrund der abhängigen Natur der RICEFW-Objekte erforderte dies eine abgestimmte Zeitplanung und kontinuierliche Überwachung.



**04.05.04.01 Aktivitäten definieren, die nötig sind, um das Projekt (ab)liefern zu können**

Meine Aufgabe war es, alle notwendigen Aktivitäten zur Anbindung der ADN an S/4 zu definieren, ihre Abfolge zu planen und Verantwortlichkeiten zuzuweisen.

Basierend auf dem Architektur- und Kontextdiagramm (vgl. KCI 04.05.03.02) leitete ich alle erforderlichen Aktivitäten ab. Ich arbeitete eng mit technischen Teams und Stakeholdern zusammen, um Abhängigkeiten zu identifizieren und einen realistischen Zeitplan zu erstellen.

Der Projektplan definiert alle notwendigen Schritte mit klaren Verantwortlichkeiten und Abhängigkeiten (vgl. Abbildung 14 und Abbildung 15). Dies ermöglichte effiziente Koordination und hielt das Projekt im Zeitplan.

Die strukturierte Definition der Aktivitäten war ein Erfolgsfaktor zur Beherrschung der technischen, fachlichen und zeitlichen Komplexität. Eine intensivere Abstimmung mit den Vorselektoren hätte die Termintreue weiter verbessern können; dies werde ich in zukünftigen Projekten verstärken.

**04.05.04.03 Vorgehensweise für Termine und Phasen, ggf. Sprints festlegen**

Meine Aufgabe war es, die Vorgehensweise zur Festlegung von Terminen, Phasen und Sprints im WSR zu definieren und mit dem S/4-Programm zu synchronisieren.

Nach meinem Einstieg im Januar 2025 analysierte ich die bisherige Terminplanung und Phasenstruktur, um eine Synchronisation der RICEFW-Aktivitäten mit den fachlichen S/4-Anforderungen sicherzustellen.

Eine mit dem S/4-Programm synchronisierte Terminplanung mit klarer Phasenstruktur wurde etabliert und ermöglichte effiziente Projektplanung mit definierten Meilensteinen.

Die initialen Phasenlängen waren zu lang für flexible Anforderungsreaktionen. Für Welle 2 schlug ich verkürzte Sprintzyklen (2-3 Wochen) vor, um Flexibilität zu erhöhen (vgl. Abbildung 16).

**04.05.04.05 Fortschritt anhand des Terminplans überwachen und notwendige Anpassungen vornehmen**

Meine Aufgabe war es, den Fortschritt des Terminplans zu überwachen und bei Abweichungen steuernd einzugreifen, um die Anbindung der SST an S/4 und R/3 im Rahmen des PB zu sichern.

Nach Finalisierung des Welle 1-Scope im Juni 2025 und trotz offener E2E-Aktivitäten übernahm ich zusätzlich das Fortschrittsmonitoring. Durch regelmäßige Prüfungen des Projektzeitplans, frühzeitige Risikoidentifikation und enge Teamkoordination leitete ich notwendige Anpassungen ein (vgl. Abbildung 5).

Verzögerungen wurden frühzeitig erkannt und gezielt koordiniert. Der Welle-1-Zeitplan blieb trotz bestehender Herausforderungen intakt, und die technische Umsetzung der SST-Anbindung an S/4 und R/3 wurde vorangetrieben.

Die kontinuierliche Fortschrittsüberwachung war entscheidend für die Stabilität des Zeitplans. Künftig werde ich das Monitoring noch früher auf alle E2E-Aktivitäten ausweiten, um Anpassungen früher in den Plan einzuspielen.

#### **04.05.05 Organisation, Information und Dokumentation**

Der WSR erforderte klare Organisationsstrukturen mit transparentem Informationsfluss und konsistenter Dokumentation zur Bewältigung der Projektkomplexität und Koordination der S/4-Programmbeteiligten (WS, mehrere Firmen, R2H, F2H, BK, Steering Committee (STC)) und Stakeholder.

##### **04.05.05.01 Bedürfnisse der Stakeholder bezüglich Information und Dokumentation beurteilen und bestimmen**

Meine Aufgabe war es, die Stakeholder-Bedürfnisse bezüglich Information und Dokumentation zu ermitteln und eine passende Kommunikations- und Dokumentationsstrategie zu entwickeln.

Basierend auf den formellen S/4-Programmvorgaben (vgl. Abbildung 9 und Abbildung 5) integrierte ich gezielt informelle Kommunikationsbedürfnisse durch situationsgerechte Meetings, offenen Informationsaustausch und Raum für Interaktion.

Die Informationsinitiativen wurden positiv bewertet. Externe Kollegen hoben Teamzusammenhalt und gutes Miteinander hervor, trotz großer Themenbandbreite.

Interne Kollegen waren teilweise von der Informationsmenge und Transparenzanforderungen überfordert. Eine differenziertere Information nach Zielgruppen hätte dies mildern können; dies werde ich künftig berücksichtigen.

##### **04.05.05.03 Infrastruktur, Prozesse und Informationssysteme aufbauen**

Gerade für die Koordination der RICEFW-Entwicklung im WSR war es entscheidend, eine geeignete Infrastruktur, Prozesse und Informationssysteme aufzubauen, um die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Parteien zu erleichtern und die Transparenz zu erhöhen.

Hierzu etablierte ich Jira/Confluence als zentrale Projektmanagementplattform, die als Single Source of Truth für alle Projektinformationen diene. Ich definierte klare Prozesse für die Zusammenarbeit, Kommunikation und Dokumentation, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten Zugriff auf aktuelle Informationen hatten und effektiv zusammenarbeiten konnten (vgl. Abbildung 16).

Die Einführung von Jira/Confluence verbesserte die Transparenz und Zusammenarbeit erheblich. Alle Projektinformationen des WSR waren zentral verfügbar, was die Kommunikation erleichterte und die Effizienz steigerte. Die klare Prozessdefinition trug dazu bei, Missverständnisse zu vermeiden und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Parteien zu fördern (vgl. Abbildung 12).

Eine zentrale Projektmanagementplattform mit klar definierten Prozessen war aufgrund der sieben unterschiedlichen Firmen und der Stakeholder-Vielfalt mit unterschiedlichen Interessen entscheidend für die erfolgreiche Koordination der RICEFW-Entwicklung.

##### **04.05.05.04 Organisation des Projekts implementieren, überwachen und anpassen**

Meine Aufgabe war es, die Organisation des WSR zu implementieren, kontinuierlich zu überwachen und bei Bedarf anzupassen, um eine effiziente Projektabwicklung und erfolgreiche Koordination der RICEFW-Entwicklung sicherzustellen.

Ich brachte eine Zusammenfassung der Getrennten WS SST und Entwicklungen in WSR ein. Zudem wurde das durch den GU völlig vernachlässigten PB und COP mitintegriert (vgl. Abbildung 16).

Die Implementierung der neuen Projektorganisation ermöglichte eine klare Strukturierung der Verantwortlichkeiten und eine effiziente Koordination der Aktivitäten. Durch die kontinuierliche Überwachung konnten Anpassungen zeitnah vorgenommen werden, um Herausforderungen zu bewältigen und den Projekterfolg sicherzustellen.

Die Implementierung einer klaren Projektorganisation war entscheidend für die erfolgreiche E2E-Koordination der RICEFW-Entwicklung. Die kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Organisation ermöglichte es, flexibel auf Herausforderungen zu reagieren und den Projekterfolg sicherzustellen. In zukünftigen Projekten werde ich die Bedeutung einer klaren Organisation und kontinuierlichen Überwachung weiter betonen, um eine effiziente Projektabwicklung zu gewährleisten.

#### **04.05.06 Qualität**

Im WSR war die Sicherstellung der Qualität der RICEFW-Entwicklung von zentraler Bedeutung, um die erfolgreiche Umsetzung der mannigfaltigen regulatorischen Anforderungen, die Einhaltung von SAP-Standards und die Erfüllung der Stakeholder-Erwartungen in Form von qualitativ hochwertigen Ergebnissen zu gewährleisten.

##### **04.05.06.01 Qualitätsmanagementplan für das Projekt entwickeln, die Implementierung überwachen und gegebenenfalls überarbeiten**

Wie im KCI 04.03.02.04 geschildert war die Sicherstellung der Qualität der RICEFW-Entwicklung von zentraler Bedeutung, um die erfolgreiche Umsetzung der mannigfaltigen regulatorischen Anforderungen, die Einhaltung von SAP-Standards und die Erfüllung der Stakeholder-Erwartungen in Form von qualitativ hochwertigen Ergebnissen zu gewährleisten.

Zur Sicherstellung der Qualität entwickelte ich zusammen mit dem Programmtestmanager einen umfassenden Qualitätsmanagementplan, der die spezifischen Qualitätsanforderungen des WSR adressierte.<sup>6</sup> Dieser Plan umfasste die Definition von Qualitätsstandards, die Festlegung von Qualitätskontrollprozessen und die Implementierung von Prozessen zur kontinuierlichen Verbesserung (vgl. Abbildung 9 und Abbildung 12).

Wie im KCI 04.04.05.02 dargestellt, wurde der Qualitätsmanagementplan erfolgreich umgesetzt und hat zu einer exzellenten Qualität der RICEFW-Entwicklung im Produktivumgebung S/4 (S/4) und Produktivumgebung R/3 (R/3) in Welle 1 geführt.

Die Umsetzung des Qualitätsmanagementplans hat zu einer signifikanten Verbesserung der Qualität der RICEFW-Entwicklung geführt und die Stakeholder-Zufriedenheit erhöht.

##### **04.05.06.03 Erreichung der Qualitätsziele des Projekts verifizieren und erforderliche korrektive und/oder präventive Maßnahmen empfehlen**

Nach der erfolgreichen Entwicklung, Implementierung und Entwicklertestung der RICEFW-Objekte im EPA und ZP1 in Welle 1 war es von entscheidender Bedeutung, die Verifizierung der Erreichung der definierten Qualitätsziele durch die abnehmenden Stakeholder sicherzustellen. Darüber hinaus sollten erforderliche korrigierende und/oder präventive Maßnahmen identifiziert und empfohlen werden, um eine kontinuierliche Verbesserung der Qualität der RICEFW-Entwicklung zu gewährleisten.

Zur Sicherstellung der Qualität entwickelte ich gemeinsam mit dem Programmtestmanager einen umfassenden Qualitätsmanagementplan, der die spezifischen Qualitätsanforderungen des WSR adressierte.<sup>7</sup> Der Plan umfasste die Definition verbindlicher Qualitätsstandards, die Festlegung geeigneter Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsprozesse sowie die Implementierung von Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung (vgl. Abbildung 9 und Abbildung 12). Nichtsdestotrotz wurden erforderlichen Tests im FB unterlassen (vgl. Abbildung 5)

Trotz Wie in Abschnitt KCI 04.04.05.02 dargestellt, wurde der Qualitätsmanagementplan erfolgreich umgesetzt und trug maßgeblich zu einer exzellenten Qualität der RICEFW-Entwicklung im EPA und ZP1 in Welle 1 bei, wie der Fehlerstand bei HC Ende zeigt (vgl. Tabelle 4).

Die strukturierte Umsetzung des Qualitätsmanagementplans führte zu einer signifikanten Steigerung der Produktqualität sowie zu einer erhöhten Zufriedenheit der beteiligten Stakeholder.

#### **04.05.06.04 Validierung von Projektergebnissen planen und organisieren**

Die Validierung der RICEFW-Objekte sowie des PB durch relevante Stakeholder und Endanwender im Rahmen eines UAT stellte eine zwingende Voraussetzung für die Produktivsetzung dar.

Zur strukturierten Planung und Organisation dieser Validierung erarbeitete ich gemeinsam mit dem Programmtestmanager ein umfassendes E2E-Testkonzept. Dieses adressierte die spezifischen fachlichen und technischen Anforderungen des WSR und definierte klare Verantwortlichkeiten, Teststufen sowie Abnahmekriterien für die beteiligten Stakeholder.

Trotz der Abgenommen E2E-Testkonzepts und der Durchführung von Tests im FB wurden nicht alle vorgesehenen Tests konsequent umgesetzt. Dies führte zu erheblichen Herausforderungen bei der Validierung der Projektergebnisse im Rahmen des UAT (vgl. Abbildung 5).

Die unzureichende Umsetzung der definierten E2E-Testaktivitäten im FB hatte direkte Auswirkungen auf die Validierbarkeit der Projektergebnisse. Durch enge interne Abstimmung, pragmatische Lösungsansätze und priorisierte Nachtests konnten die identifizierten Defizite jedoch behoben werden (vgl. Tabelle 4). Für zukünftige Vorhaben habe ich daraus abgeleitet, Testprozesse verbindlicher zu verankern und deren Einhaltung frühzeitig und konsequent zu steuern, um die Validierung von Projektergebnissen nachhaltig sicherzustellen.

#### **04.05.07 Kosten und Finanzierung**

Im WSR und PB fielen sowohl interne Personalaufwände der ADAC als auch externe Personalaufwände durch sieben externe Dienstleister sowie Sachkosten in Form von Infrastruktur- und Lizenzkosten an. Die Aufwände und Kosten wurden von mir in Zusammenarbeit mit der Technische Programmleiterin (TPL) und PL geschätzt, geplant, die Budgets dem Auftraggeber / Projektponsor (AG) gegenüber verantworten lassen und über regelmäßige Budget-Reviews sowie Abweichungsanalysen aktiv überwacht und gesteuert.

##### **04.05.07.01 Projektkosten abschätzen**

Die Kostenerwartung für das WSR und PB lag bei ca. 30 % der Gesamtprogrammkosten und stellte damit den höchsten Einzelposten dar. Die Kostenschätzung erfolgte auf Basis von Erfahrungswerten

aus vergleichbaren Transformationsprojekten wie Versicherung IT des ADAC (VITA) und Allgemeiner Deutscher Automobilclub Mitgliedschaft 2.0 (ADAM). Meine Aufgabe bestand darin, die Kosten für die Entwicklung und Implementierung des WSR und PB je Welle abzuschätzen, um eine belastbare Grundlage für die Budgetplanung und -kontrolle zu schaffen.

Zur Abschätzung der Projektkosten in den jeweiligen Wellen verwendete ich eine analogiebasierte Top-Down-Betrachtung. Dabei berücksichtigte ich verschiedene Einflussfaktoren, darunter die Komplexität der Entwicklungen, die Anzahl der voraussichtlich beteiligten Ressourcen, die Dauer der Entwicklungsphasen sowie die spezifischen fachlichen und technischen Anforderungen des WSR und PB. Basale Kosten wie Infrastruktur-, Lizenz- und Betriebskosten wurden bewusst nicht in die Schätzung einbezogen, da diese bereits in anderen Bereichen des Programms budgetiert waren. Darüber hinaus wurde berücksichtigt, dass grundlegende Funktionalitäten wie der Zahl- und Mahnlauf bereits in der ersten Welle implementiert werden mussten, während in den Folgewellen weitere BK-spezifische Funktionalitäten ergänzt wurden, was sich auf die Kostenverteilung auswirkte.

Die Kostenschätzungen für die Entwicklung und Implementierung des WSR und PB wurden termingerecht je Welle erstellt und als Entscheidungsgrundlage für die Budgetfreigabe verwendet. Dadurch konnte die Finanzplanung strukturiert entlang der Umsetzungswellen aufgesetzt und nachvollziehbar fortgeschrieben werden. Mit der Aufnahme von TD infolge der Rückstellung der AIF-Implementierung erhöhte sich jedoch die Unsicherheit einzelner Annahmen, sodass die Schätzung als belastbare Planungsbasis mit explizitem Aktualisierungsbedarf zu bewerten war.

Die Kostenschätzung für komplexe Transformationsvorhaben wie die Entwicklung und Implementierung des WSR und PB ist mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, insbesondere bei hoher Scope-Dynamik und einer unterkomplexen technischen Voranalyse (vgl. Abbildung 17). Für künftige Wellen wird daher eine frühere Validierung technischer Annahmen, eine transparente Dokumentation der Schätzprämissen sowie eine regelmäßige Nachschätzung bei Scope-Änderungen konsequent eingeplant.

#### **04.05.07.04 Finanzmanagement- und Berichtssystem für das Projekt entwickeln, einrichten und aufrechterhalten**

Die PL und die TPL waren für die finanzielle Steuerung des Projekts verantwortlich, während ich als PM die operative Umsetzung sowie den stabilen Betrieb eines effektiven Finanzmanagement- und Berichtssystems sicherstellte. Meine Aufgabe bestand darin, ein System zu entwickeln und einzurichten, das die kontinuierliche Erfassung, Überwachung und Berichterstattung der Projektkosten ermöglicht und damit eine transparente, belastbare Grundlage für Steuerung und Entscheidungsfindung schafft. Durch die Analyse der bestehenden Finanzprozesse und -strukturen im S/4 identifizierte ich die Anforderungen an das Finanzmanagement- und Berichtssystem. In enger Zusammenarbeit mit der PL und der TPL übernahm ich das im In/Ex etablierte Kostenreporting auf Epic (Epic)-Ebene als methodische Grundlage und passte es auf den Projektkontext an. Das Reporting umfasste einen wellenspezifischen Soll-Ist-Vergleich sowie einen Forecast im Burn-Down-Format. Hierfür strukturierte ich die Entwicklungsaufwände auf Basis der Anforderungen, nutzte die bestehende Anforderungszuordnung als Kostenzuordnung und verdichtete die Ergebnisse zu einer belastbaren Entscheidungsgrundlage. Zur Aufrechterhaltung des Systems definierte ich einen regelmäßigen Berichtszyklus, klare Verantwortlichkeiten für Datenlieferung und Qualitätssicherung sowie einen verbindlichen Übergang der Ergebnisse

in die bestehenden Entscheidungs- und Berichtsstrukturen der PL.

In den folgenden Monaten etablierte ich das Finanzmanagement- und Berichtssystem erfolgreich, indem ich die relevanten Datenquellen für die Kostenerfassung identifizierte, die notwendigen Schnittstellen zu den bestehenden Systemen einrichtete und die Berichtsprozesse verbindlich definierte. Das System ermöglichte eine kontinuierliche Überwachung der Projektkosten, einen transparenten Soll-Ist-Vergleich und eine belastbare Prognose der Kostenentwicklung je Welle. Durch den stabilen Regelbetrieb konnten Abweichungen früher erkannt, adressiert und in den zuständigen Gremien zeitnah entschieden werden. Dies erhöhte die Transparenz über die finanziellen Aspekte des Projekts und verbesserte die Qualität der finanziellen Steuerung.

Die Implementierung des Finanzmanagement- und Berichtssystems hat gezeigt, dass enge Zusammenarbeit zwischen den Projektbeteiligten und eine klare Definition der Anforderungen entscheidend für den Erfolg sind. Da dies nicht immer gegeben war, konnte ich die Einführung nicht so schnell vorantreiben, wie es für die erste Umsetzungswelle ideal gewesen wäre. Für künftige Vorhaben würde ich daher bereits in der Planungsphase verbindliche Anforderungen an Reporting, Datenqualität und Entscheidungswege festlegen, die notwendigen Ressourcen frühzeitig sichern und die Implementierung parallel zur Projektvorbereitung vorantreiben, um von Beginn an eine wirksame Kostensteuerung aufrechtzuerhalten.

#### **04.05.07.05 Finanzen überwachen, um Abweichungen vom Projektplan zu identifizieren und zu korrigieren**

Die in KCI 04.05.07.01 beschriebenen Kostenschätzungen und in einen Kostenplan überführten Werte bildeten die Grundlage für die finanzielle Steuerung des Projekts. Meine Aufgabe bestand darin, die tatsächlichen Kosten der Entwicklung und Implementierung des WSR und PB kontinuierlich zu überwachen, um Abweichungen vom genehmigten Kostenplan frühzeitig zu erkennen und geeignete Korrekturmaßnahmen einzuleiten.

Hierzu entwickelte ich gemeinsam mit der PL ein monatliches Kostenreporting mit wellenspezifischem Soll-Ist-Vergleich und Forecast. Dafür strukturierte ich die Entwicklungsaufwände der aktuellen Umsetzungswelle, stimmte die Kostenzuordnung mit den verantwortlichen Liefer- und Fachbereichen ab und verdichtete die Ergebnisse zu einer belastbaren Entscheidungsgrundlage für die Steuerung. Erkannte Abweichungen wurden von mir hinsichtlich Ursache, Auswirkung und Handlungsbedarf bewertet. Ein konkreter Fall war eine Forecast-Abweichung in Welle 1.1 aufgrund zusätzlicher Integrationsaufwände im Umfang von 5 PT; ich bereitete die Entscheidungsoptionen transparent auf (Leistungsanpassung, Terminverschiebung, zusätzliche Mittel) und führte die Entscheidung in das zuständige Gremium über. Bei drohenden Überschreitungen leitete ich gemeinsam mit den Beteiligten geeignete Maßnahmen ab, etwa die Priorisierung von Anforderungen, die zeitliche Verschiebung nachgelagerter Funktionalitäten oder die Nachschärfung von Leistungszuschnitten. Die Berichterstattung erfolgte in den etablierten Entscheidungs- und Berichtsstrukturen gemäß KCI 04.03.02.05 und KCI 04.04.05.05; bei Abweichungen oberhalb des definierten Schwellenwerts von 10% eskalierte ich die Entscheidungsvorlage fristgerecht. Durch das etablierte Kostenreporting konnten finanzielle Abweichungen frühzeitig erkannt und adressiert werden. Die Prognosegüte verbesserte sich von 25% auf 10%, und die mittlere Reaktionszeit vom Erkennen einer Abweichung bis zur Beschlussfassung sank auf 3 Arbeitstage. Dies ermöglichte eine be-

lastbare Steuerung der Entwicklungsbudgets je Welle und trug dazu bei, den genehmigten Kostenrahmen trotz der hohen fachlichen und technischen Dynamik im Programm einzuhalten. Gleichzeitig erhöhte die Transparenz über Kostentreiber, Forecast-Entwicklungen und erforderliche Korrekturmaßnahmen die Entscheidungssicherheit für die weitere Umsetzungsplanung.

Für komplexe Transformationsvorhaben reicht eine einmalige Kostenschätzung nicht aus; entscheidend ist ein kontinuierliches Finanzmonitoring mit klarer Zuordnung von Kostentreibern, belastbaren Forecasts und definierten Reaktionsmechanismen. Ich habe daraus mitgenommen, dass insbesondere bei hoher Scope-Dynamik und wellenweiser Umsetzung finanzielle Abweichungen nur dann wirksam beherrscht werden können, wenn Kostensteuerung eng mit Leistungsumfang, Priorisierung und Entscheidungswegen verzahnt ist. Für künftige Vorhaben würde ich die Schwellenwerte und Eskalationspfade bereits zu Projektbeginn verbindlich festlegen und die Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen anhand weniger, klar definierter Steuerungskennzahlen regelmäßig nachhalten.

#### **04.05.08 Ressourcen**

Wie in Abschnitt 1.5 beschrieben, war die Sicherstellung der notwendigen internen Ressourcen für die Umsetzung des Projekts eine der größten Herausforderungen. Für die erfolgreiche Durchführung des Projekts waren sowohl interne als auch externe Ressourcen erforderlich. Intern mussten qualifizierte Mitarbeitende mit den erforderlichen Fähigkeiten und Kapazitäten bereitgestellt werden, während extern spezialisierte Dienstleister mit passendem Fachwissen und ausreichender Erfahrung eingebunden wurden. Die besondere Schwierigkeit lag in der zeitgleichen Bewältigung von Ressourcenengpässen aus dem FB, interen Wissensdefiziten im S/4-Umfeld und Qualitätsabweichungen bei externen Partnern. Die Ressourcenplanung und -steuerung war daher ein zentraler Bestandteil meiner Rolle als PM: Ich verantwortete die fortlaufende Bedarfsermittlung, Priorisierung und Nachsteuerung, um sicherzustellen, dass die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit verfügbar waren und wirksam eingesetzt wurden.

##### **04.05.08.01 Strategische Ressourcenplanung entwickeln, um die Projektergebnisse liefern zu können**

Neben dem Sichern der sehr raren fachlichen und technischen internen Ressourcen für R2H war die Einbindung externer Dienstleister mit passendem Fachwissen, insbesondere zur AIF, sowie ausreichender Erfahrung eine zentrale Herausforderung. Meine Aufgabe bestand darin, eine strategische Ressourcenplanung zu entwickeln, um die Projektergebnisse termingerecht und in der erforderlichen Technologie liefern zu können. Dabei musste ich sowohl die internen Kapazitäten als auch die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit externer Partner berücksichtigen, um eine effektive und effiziente Ressourcennutzung sicherzustellen.

Um die strategische Ressourcenplanung zu entwickeln, führte ich zunächst eine umfassende Bedarfsanalyse durch, um die erforderlichen Fähigkeiten BTP, AIF und Kapazitäten für die verschiedenen Projektwellen (vgl. Tabelle 6) zu identifizieren. Anschließend erstellte ich einen Ressourcenplan, der sowohl interne als auch externe Ressourcen berücksichtigte und auf die Projektmeilensteine sowie die geplanten Wellen abgestimmt war. Dabei legte ich besonderen Wert auf die frühzeitige Einbindung externer Dienstleister, um deren Expertise optimal nutzen zu können und potenzielle Engpässe zu vermeiden. Ergänzend definierte ich klare Priorisierungs- und Steuerungskriterien für den Ressourcen-

einsatz sowie regelmäßige Überprüfungs- und Anpassungsprozesse, um die Ressourcenplanung flexibel an sich ändernde Anforderungen und Rahmenbedingungen anpassen zu können.

Aufgrund des Paradigmenwechsels von GFA mit AIF zu BFA mit File Transfer (FT) (vgl. Abbildung 3) konnten die ursprünglich geplanten externen Ressourcen für die AIF-Implementierung nicht wie vorgesehen eingebunden werden. Durch die Wiederaufnahme des F2H-Projekts als Scopeerweiterung wurde die Ressourcenplanung zwar grundsätzlich verkompliziert; die externen Ressourcen mit AIF-Know-how konnten jedoch in das separat ressourcen geplante F2H (vgl. Abbildung 13) transferiert werden. Damit konnte vorhandene externe Expertise weiterhin zielgerichtet eingesetzt und die Lieferfähigkeit trotz veränderter technischer Rahmenbedingungen stabilisiert werden.

Aus Ressourcenengpässen resultierende Herausforderungen können durch eine strategische Ressourcenplanung zwar nicht vollständig eliminiert, aber durch frühzeitige Bedarfsanalyse, proaktive Einbindung externer Partner und flexible Anpassungsprozesse effektiv gemanagt werden. Grundsätzlich ist es jedoch essenziell, die Ressourcenplanung kontinuierlich zu überwachen und bei Bedarf anzupassen, um auf unvorhergesehene Veränderungen reagieren zu können und die Projektergebnisse dennoch termingerecht und in der erforderlichen Qualität zu liefern.

#### **04.05.08.05 Ressourcenverbrauch evaluieren und erforderliche Korrekturmaßnahmen ergreifen**

Im Projekt R2H oblag mir als PL die kontinuierliche Überwachung des Ressourcenverbrauchs – insbesondere hinsichtlich Zeit, Personal und finanzieller Mittel. Eine zentrale Herausforderung bestand darin, die Leistung und den Ressourceneinsatz des von mir beauftragten WSL zu evaluieren und bei nachgewiesenen Abweichungen begründete Korrekturmaßnahmen einzuleiten, um das Projekt in Time, Scope und Budget zu halten.

Wie in KCI 04.04.05.02 geschildert, war die Leistung meines Counterparts in der Rolle des WSL nicht zufriedenstellend, was nicht nur zu einem unnötigen Ressourcenverbrauch bei ihm führte, sondern auch zu einem erheblichen Mehrverbrauch der raren internen Ressourcen führte (vgl. Abbildung 6, Abbildung 17). Die Evaluation erfolgte anhand des CutOver-Plans sowie der Ergebnisdokumentation, die wiederholt deutliche Abweichungen zwischen geplantem und tatsächlichem Ressourceneinsatz aufzeigten. In Anbetracht der Bedeutung der Rolle des WSL für den Erfolg des Projekts, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung von Zeitplänen, Umfang und Budget, war es notwendig, ihn als Korrekturmaßnahme aus seiner Rolle zu entfernen und die Verantwortung für die Aufgaben, die er nicht erfüllen konnte, auf andere Teammitglieder zu verteilen (vgl. Abbildung 16).

Die neu zugeordneten Teammitglieder übernahmen die Verantwortung für die verbleibende Projektlaufzeit, wodurch die Ressourcen zielgerichteter eingesetzt und das Projekt planmäßig abgeschlossen werden konnte (vgl. Veränderung Abbildung 1). Für Welle 1.1 ff. wurden meine Vorschläge und Anregungen vollständig von der PL übernommen, um die Rolle des WSL strukturell zu stärken und den Ressourceneinsatz in künftigen Wellen effizienter zu gestalten (vgl. Abbildung 16).

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Ressourcenprobleme auf Führungsebene frühzeitig und konsequent adressiert werden müssen: Eine verzögerte Reaktion auf nachgewiesene Leistungsdefizite verursacht nicht nur direkten Ressourcenmehrverbrauch, sondern belastet auch das gesamte Projektteam. Rückblickend hätte ich die formale Neubewertung der WSL-Rolle früher einleiten sollen, sobald die ersten



Abweichungen im CutOver-Plan sichtbar wurden, anstatt auf eine Selbstkorrektur zu warten. Die daraus entwickelten Kriterien zur frühzeitigen Identifikation von Ressourcenproblemen sowie die strukturellen Anpassungen der WSL-Rolle wurden für Welle 1.1 ff. institutionalisiert und haben die Effizienz des Ressourceneinsatzes in den Folgewellen nachweislich verbessert.

#### **04.05.09 Beschaffung**

Im S/4 war die Beschaffung für R2H erfolgskritisch, da vertragliche Klärungen mit dem GU und die termingerechte Bereitstellung externer Leistungen direkt auf dem kritischen Pfad lagen. Gleichzeitig bestanden enge Zeitvorgaben, begrenzte interne Kapazitäten (vgl. Unterabschnitt 1.5) und hohe Anforderungen an Compliance und Vertragsqualität. In meiner Rolle als PL verantwortete ich die Steuerung dieser Beschaffungsschnittstelle zwischen GU, Projekt Office, Zentraleinkauf und den ADAC-internen WSL, um Termin-, Budget- und Leistungsrisiken frühzeitig zu beherrschen.

##### **04.05.09.02 Zur Evaluation und Auswahl von Lieferanten und Partnern beitragen**

Meine Aufgabe bestand darin, die Evaluation und Auswahl von Lieferanten und Partnern für die Beschaffung externer, nicht durch den GU-Vertrag gedeckter Leistungen im Rahmen von R2H aktiv zu unterstützen. Dabei war es entscheidend, geeignete technische und organisatorische Auswahlkriterien zu definieren, potenzielle Lieferanten zu identifizieren und vergleichbar zu bewerten sowie in Zusammenarbeit mit der TPL und dem ZEK eine belastbare Entscheidungsgrundlage zu schaffen.

Um die Evaluation und Auswahl von Lieferanten und Partnern zu unterstützen, entwickelte ich zunächst ein Bewertungsraster mit gewichteten Kriterien (technische Fähigkeiten in S/4, Projekterfahrung, Verfügbarkeit, Referenzen und vertragliche Passfähigkeit). Anschließend analysierte ich die im ADAC vorhandenen Lieferanten mit Rahmenvertrag (RV), um geeignete Kandidaten zu identifizieren. Die beiden identifizierten Lieferanten kontaktierte ich anschließend und bat sie um die Lebenslauf (CV) geeigneter Kandidaten. In enger Zusammenarbeit mit der TPL und dem ZEK wurden die CV gesichtet, vergleichend bewertet und in eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Lieferantenauswahl überführt.

Die Evaluation und Auswahl der Lieferanten führte letztlich zur Einbindung von drei Programmierern aus zwei unterschiedlichen externen Dienstleistern mit umfassendem S/4-Know-how, die die Implementierung der Welle 1.1 ff. im Rahmen von R2H unterstützten. Durch die strukturierte Auswahl konnten die erforderliche Expertise sichergestellt und externe Leistungen termingerecht bereitgestellt werden. Dadurch wurden Umsetzungsrisiken im kritischen Pfad reduziert und ein wesentlicher Beitrag zum Projekterfolg geleistet.

Die sorgfältige Evaluation und Auswahl der Lieferanten hat gezeigt, dass eine strukturierte, kriterienbasierte Vorgehensweise entscheidend für den Projekterfolg ist. Insbesondere die frühe Einbindung der relevanten Stakeholder (TPL, ZEK) und die transparente Vergleichbarkeit der Anbieter verbesserten die Entscheidungsqualität. Durch die gezielte Auswahl externer Partner konnte die erforderliche Expertise gesichert und die termingerechte Umsetzung der Projektziele nachhaltig unterstützt werden.

**04.05.09.04 Vertragsausführung überwachen, Probleme ansprechen und, falls notwendig, Entschädigungen verlangen**

Als WSL ist es meine Aufgabe, die Vertragsausführung der Lieferanten zu überwachen, Probleme hinsichtlich der Lieferleistung bei der TPL und PL anzusprechen und gegenüber dem Dienstleister (DL) gemeinsame Eskalationen zu betreiben, um die Lieferleistung zu verbessern.

Zur Überwachung der Vertragsausführung nutzte ich das Backlog (BL) als Steuerungsgrundlage und hielt regelmäßige Meetings mit den Lieferanten ab, um den Fortschritt zu besprechen und sich anbahnende Probleme frühzeitig zu identifizieren. Bei Problemen hinsichtlich der Lieferleistung habe ich diese direkt angesprochen und gemeinsam mit den DL nach Lösungen gesucht. In Fällen, in denen die Lieferleistung nicht verbessert werden konnte (vgl. Abbildung 6), habe ich eine Eskalation über die PL eingeleitet und vertragliche Nachbesserungen eingefordert; Entschädigungsforderungen habe ich als Eskalationsoption adressiert, um die Auswirkungen auf das Projekt zu minimieren.

Mangels Nachbesserungswilligkeit/-fähigkeit meines CO-WSL konnte die Lieferleistung nicht verbessert werden, weshalb ich eine Eskalation über die PL eingeleitet habe. In diesem Fall konnte ich die Auswirkungen auf das Projekt minimieren, indem ich die Lieferantenleistung selbst erbrachte, wie in KCI 04.04.05.02 dargestellt. Die Eskalation führte dazu, dass die entsprechende Ressource aus dem Projekt genommen wurde und die Position nicht nachbesetzt wurde (vgl. Abbildung 1).

In Zukunft werde ich bei der Auswahl von Lieferanten stärker auf deren Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit achten, um solche Probleme zu vermeiden. Zudem werde ich frühzeitig klare Erwartungen und Konsequenzen für die Lieferleistung kommunizieren, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen sicherzustellen.

**04.05.10 Planung und Steuerung**

Als WSL im S/4 trug ich die Verantwortung für die Planung und Steuerung der Projektaktivitäten in meinem Workstream. Das Programm S/4 mit den Projekten R2H und F2H war für den WSR durch eine hohe Komplexität geprägt: parallele Abhängigkeiten zwischen den Projekten und zu allen fachlichen Workstreams, fixe Go-Live-Termine sowie wechselnde Rahmenbedingungen erforderten eine kontinuierliche, aktive Steuerung, um Termin-, Qualitäts- und Budgetziele zu wahren.

### 3 Erklärung betreffend die eigenständige Ausführung dieser Arbeit

Ich Sebastian Seitz erkläre hiermit, den vorstehenden Report (ausnehmend den hier vorgelegten formellen Grundaufbau der Arbeit) eigenständig und inhaltlich ohne Mitwirkung Dritter, insbesondere auch nicht mittels einer KI-Software angefertigt zu haben. Es ist mir bewusst, dass eine – auch nachträgliche – Erkenntnis seitens PM-ZERT nach welcher die vorstehende Erklärung nicht zutrifft, zur ersatzlosen Aberkennung des beantragten resp. bereits erteilten Zertifikates führen kann. Ich bin mir weiterhin bewusst, dass der bewertende Assessor sich persönlich davon überzeugen muss, dass ich diese Arbeit selbst verfasst habe und dass ich verpflichtet bin, die mir gestellten Fragen in der Sache dienlicher Form zu beantworten.

München, den 30. April 2026

Ort und Datum



Sebastian Seitz

## A Anhang

### Endnoten

1. Der Begriff Konzern ist hier nicht im juristischen Sinne (§ 18 AktG, § 290 HGB) zu verstehen, sondern bezeichnet das Gefüge bzw. Konglomerat aus Vereinen und Unternehmen unter dem Dach des ADAC e.V. (ADAC e.V.).
2. Bewusst eingegangen TD wird durch nachträgliche Restrukturierung geheilt
3. Anders als SAP CALM war JIRA/Confluence bereits teilweise im ADAC etabliert.
4. Auch ohne direkte Beteiligung müssen alle buchungsauslösenden Prozesse schließlich im SL und dem GL berücksichtigt werden.
5. Das dazu gestartete Projekt Fit-Together (F2G), welches die Vereinheitlichung der Umgebungslandschaft zum Ziel hatte, wurde leider eingestellt. Auch bei weiteren Themen wie Testdatenmanagement und Testautomatisierung konnte F2G keinen nachhaltigen Erfolg erzielen.
6. Im S/4 agiere ich als stv. Testmanager (TM)
7. Im S/4 agiere ich als stv. TM

## Abkürzungsverzeichnis

| Akronym   | Langform                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| ADAC      | Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.                 |
| ADAC e.V. | ADAC e.V.                                                 |
| ADAM      | Allgemeiner Deutscher Automobilclub Mitgliedschaft 2.0    |
| ADN       | Aero-Dienst Nürnberg GmbH                                 |
| AG        | Auftraggeber / Projektponsor                              |
| AIF       | Application Interface Framework                           |
| AIS       | ADAC IT Service GmbH                                      |
| B2B       | Business-to-Business                                      |
| BFA       | Brownfield Approach                                       |
| BK        | Buchungskreis                                             |
| BL        | Backlog                                                   |
| BR        | Betriebsrat                                               |
| BTP       | Business Technology Platform                              |
| CC        | Code Conversion                                           |
| CJ        | Customer Journey                                          |
| COD       | Cut Over Durchführung                                     |
| COM       | ADAC Compliance Service GmbH                              |
| CON       | Controlling                                               |
| COP       | Cut Over Plan                                             |
| CV        | Lebenslauf                                                |
| DL        | Dienstleister                                             |
| DoD       | Definition of Done                                        |
| DORA      | Digital Operational Resilience Act                        |
| DP        | ADAC Datenportal                                          |
| E2E       | End-to-End                                                |
| EPA       | Produktivumgebung S/4                                     |
| Epic      | Epic                                                      |
| ERP       | Enterprise Resource Planning                              |
| EU-DSGVO  | Datenschutz-Grundverordnung                               |
| F2G       | Fit-Together                                              |
| F2H       | Flight to HANA                                            |
| FB        | Fachbereiche                                              |
| FNZ       | Abteilung Finanzen                                        |
| FT        | File Transfer                                             |
| GFA       | Greenfield Approach                                       |
| GL        | General Ledger                                            |
| GoB       | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung                    |
| GoBD      | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Datenerfassung |
| GU        | Generalunternehmer                                        |
| HC        | HyperCare                                                 |
| HR        | Human Resources                                           |
| IEA       | Entwicklungsabteilung Enterprise Systeme                  |
| IEB       | Entwicklungsabteilung Enterprise Systeme                  |
| In/Ex     | In-/Exkasso                                               |

| Akronym   | Langform                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IS        | Integration Suite                                                                       |
| IT1       | Integrationstest 1                                                                      |
| ITSEC     | IT-Sicherheit                                                                           |
| ITT       | IT-Transformation Office                                                                |
| JDR       | Abteilung Digitalrecht                                                                  |
| JF        | Jour Fixe                                                                               |
| JUR       | Juristische Zentrale                                                                    |
| KRITIS    | Kritische Infrastrukturen                                                               |
| LnS       | Lift & Shift                                                                            |
| MBC       | Multi-Bank Connectivity                                                                 |
| MyIT      | MyIT-Portal                                                                             |
| PB        | Parallelbetrieb                                                                         |
| PCR       | Public Cloud Ready                                                                      |
| PL        | Programmleiter                                                                          |
| PM        | Projektmanager                                                                          |
| PMO       | Program Management Office                                                               |
| PMR       | Projektmanagementreifegrad                                                              |
| PO        | Product Owner                                                                           |
| R/3       | SAP ERP R/3                                                                             |
| R2H       | Road to HANA                                                                            |
| RASCI     | Ressourcen, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Informierte                          |
| REC       | Rechtsabteilung                                                                         |
| RICEFW    | Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, Forms, Workflows                        |
| RV        | Rahmenvertrag                                                                           |
| S/4       | SAP S/4HANA                                                                             |
| SL        | Sub-Ledger                                                                              |
| SMART KPI | SMART Key Performance Indicator                                                         |
| SST       | Schnittstellen                                                                          |
| STC       | Steering Committee                                                                      |
| TD        | Technical Debt                                                                          |
| TM        | Testmanager                                                                             |
| TPL       | Technische Programmleiterin                                                             |
| UAC       | Stonebranch Universal Automation Center                                                 |
| UAT       | User Acceptance Testing                                                                 |
| VITA      | Versicherung IT des ADAC                                                                |
| WP        | Wirtschaftsprüfer                                                                       |
| WS        | Workstream                                                                              |
| WSL       | Workstream Lead                                                                         |
| WSR       | WS Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, Forms, Workflows und Parallelbetrieb |
| ZEK       | Abteilung Zentraleinkauf                                                                |
| ZP1       | Produktivumgebung R/3                                                                   |


Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis

## Glossar


| Begriff   | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN       | <i>Tochtergesellschaft des ADAC und führender Dienstleister für Geschäfts- und Ambulanzluftfahrt in Europa.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DRC       | <i>SAP-Modul für Dokumentations- und Berichtspflichten.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-Invoice | <i>Die elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und automatisch maschinell verarbeitet werden kann – ohne Medienbrüche.</i>                                                                                                                                                                                    |
| ERP       | <i>Integrierte Software zur Steuerung von Unternehmensressourcen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RICEFW    | <i>RICEFW bezeichnet im SAP-Kontext die sechs zentralen Entwicklungsobjekte – Reports (individuelle Auswertungen und Datendarstellungen), Interfaces (Schnittstellen zu Drittsystemen), Conversions (Programme zur Datenmigration und -formatkonvertierung), Enhancements (Erweiterungen der Standardfunktionalität), Forms (Druckausgaben und Layouts) und Workflows (automatisierte Geschäftsprozesse).</i> |
| RUP       | <i>Die Ramp-up-Phase bezeichnet im Projektmanagement den Zeitraum, in dem ein Projekt initial aufgebaut und die Ressourcen schrittweise in das Projekt integriert werden. In dieser Phase werden die Projektorganisation etabliert, die Prozesse definiert und die ersten Arbeitspakete umgesetzt, um das Projekt auf volle Fahrt zu bringen.</i>                                                             |

Tabelle 2: Glossar

## Grafiken

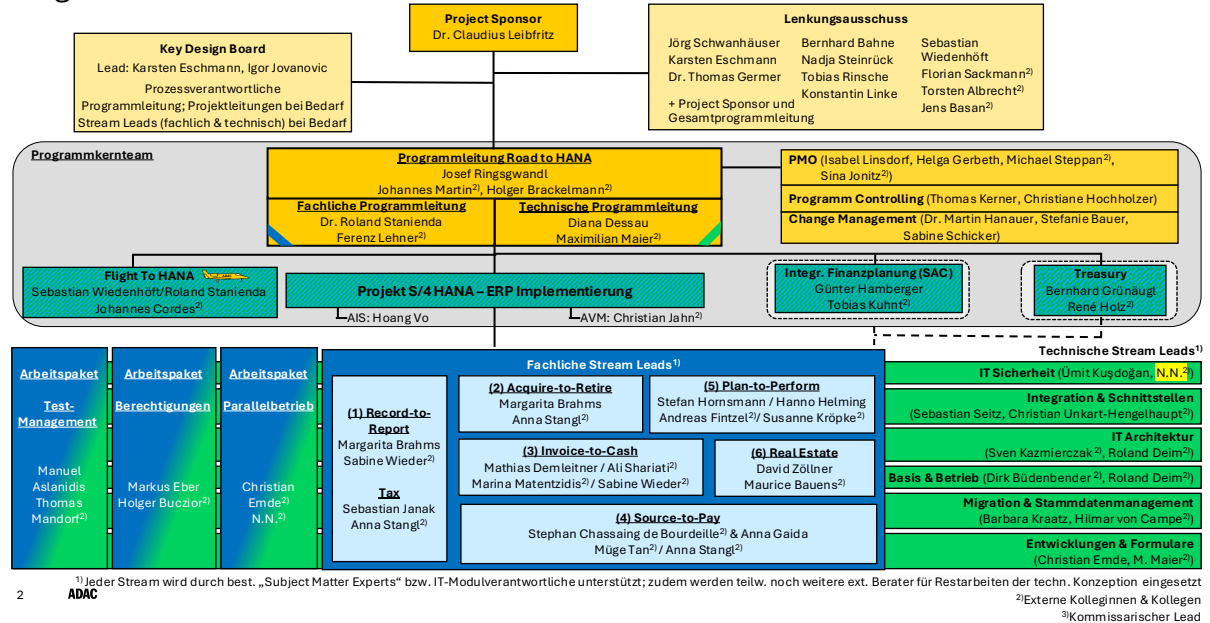**ADAC: Road to HANA – Org-Chart Realize-Phase (Stand 11/2025)***Programm Road to HANA*

(a) Organigramm R2H W1 2025

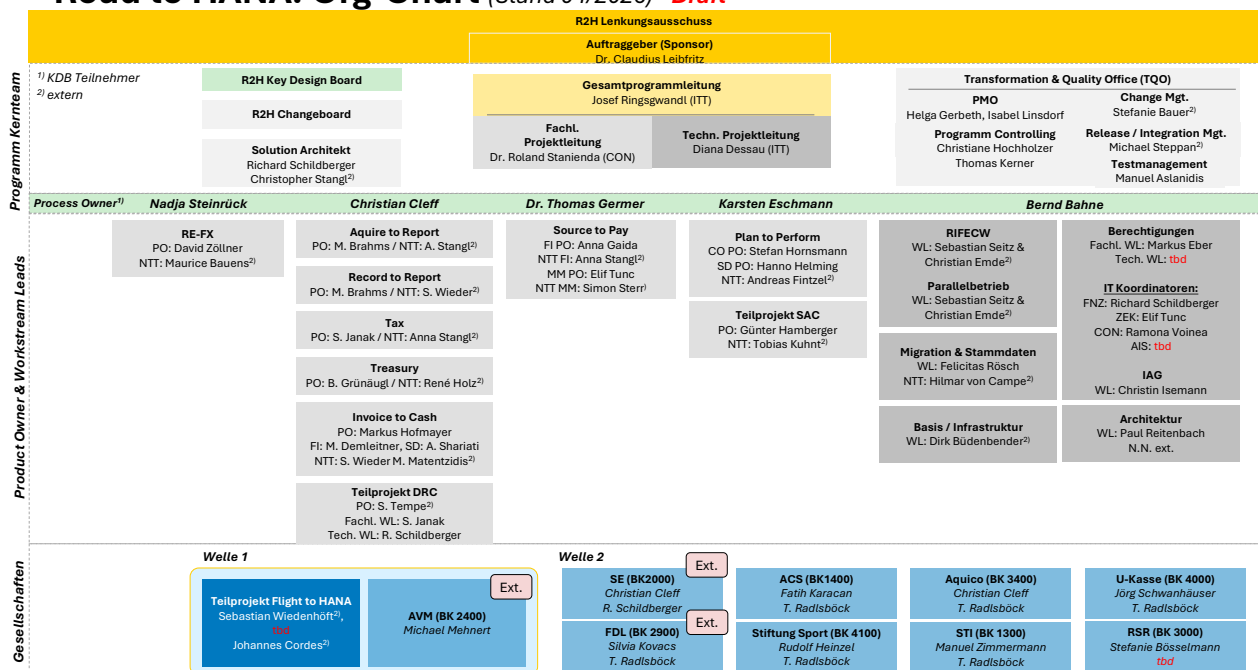**Road to HANA: Org-Chart (Stand 04/2026) - Draft**

(b) Organigramm R2H W2 2026

Abbildung 1: Organigramm R2H Projekt





---

**Aufzeichnung Demonstration MyIT Portal**

---

Von FP\_Zentrale\_Road\_to\_HANA <Road\_to\_HANA@adac.de>

Datum Di, 10.02.2026 09:12

An FP\_Zentrale\_Road\_to\_HANA <Road\_to\_HANA@adac.de>

Cc

Guten Morgen zusammen,

gestern hat Sebastian Seitz im WhatsNext das Hypercareprozess Vorgehen im MyITPortal gezeigt (danke, @Seitz, Sebastian!).

Gerne senden wir Euch noch den Link zur Aufzeichnung der Demonstration: 

[Aufzeichnung\\_Demonstration\\_MyITPortal.mp4](#)

Im Ordner der Aufzeichnung findet ihr auch die PPT mit der Prozessbeschreibung sowie eine kleine Klickanleitung zur initialen Anlage eines Tickets: 15 Streamübergreifend // Welle 1 // 04 Hypercare-Phase-Welle1 //  [01 S4](#)

Viele Grüße

Euer R2H PMO Team

Abbildung 2: Programmschulung R2H im MyIT-Portal

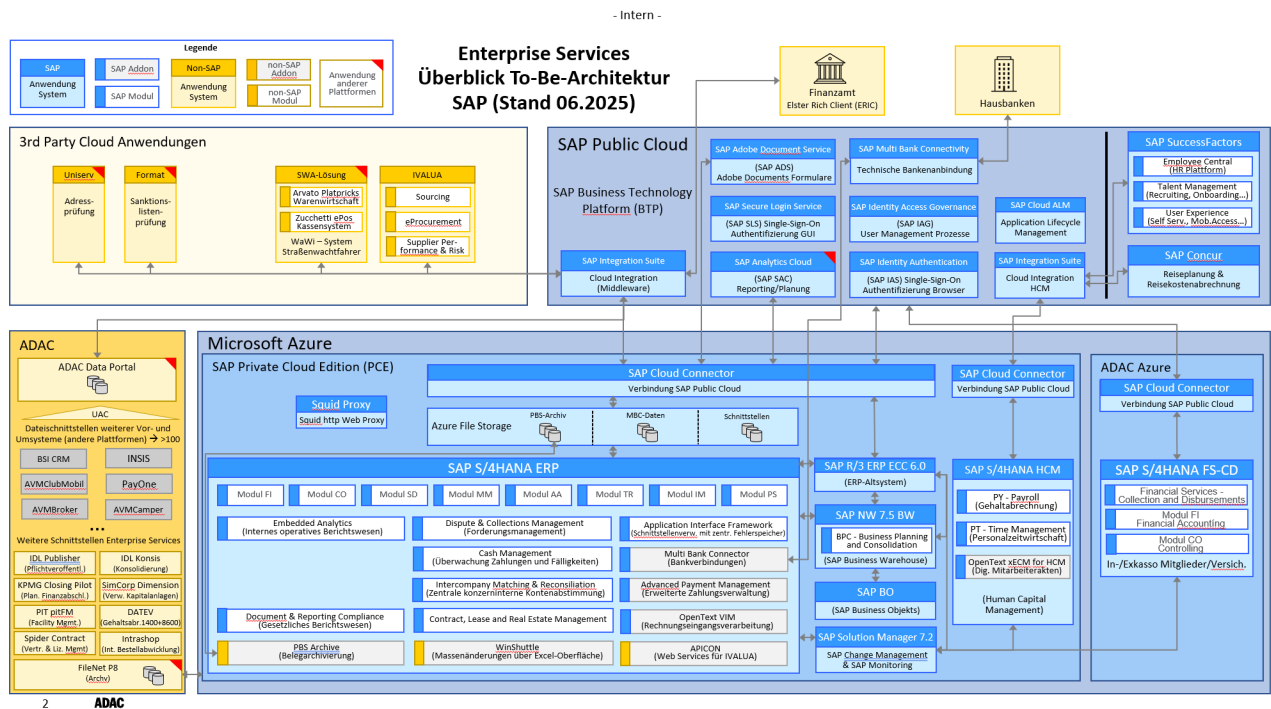


Abbildung 3: Interfaces und Integrationen von R2H

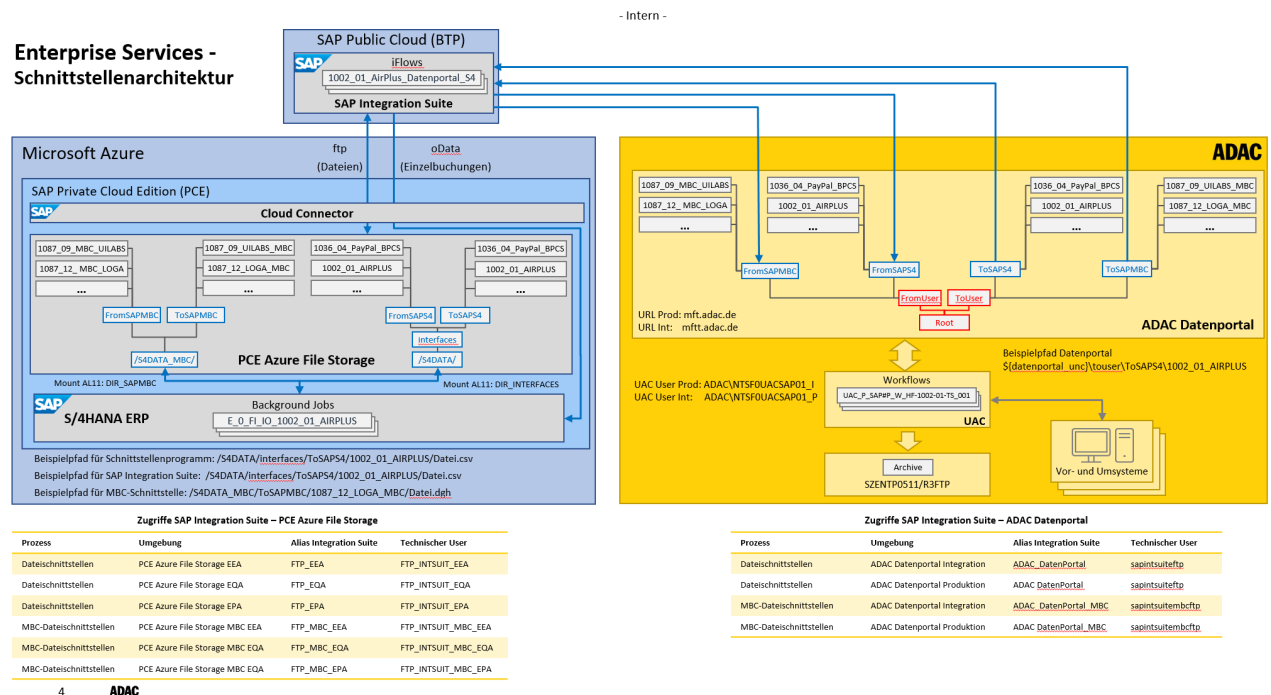


Abbildung 4: Detailansicht des implementierten BFA-Modells

- Intern -

## ADAC: Road to HANA – Status Reporting JF – Realize-Phase

## Stream/ Arbeitspaket: Schnittstellen

**ADAC Stream Lead:** Sebastian Seitz

**NTT Data Lead:** Christian Unkart-Hengelhaupt



| Neue / Aktuelle Risiken | Beschreibung                                                                                                                                                  | Maßnahme                                                                                                                                                 | Auswirkung<br>(spürbar, hoch, sehr hoch)                                                      | Eintrittswahrscheinlichkeit<br>(in Prozent) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Weitere Umgebungsplanung u. mit SSTs vgl. S2P</li> <li>Kurzfristige Berechtigungsänderung im S4-Filestorage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planungserklärung</li> <li>SAP hingewiesen nur noch Spezialisten diese Änderungen vornehmen zu lassen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoch</li> <li>Sehr hoch, siehe letzte Woche</li> </ul> |                                             |

Abbildung 5: Statusfolie Juni 2025 SST Stand

R2H\_Cut-Over-Plan\_R2H\_01.01.2026\_ARCHIVIERT

Nach Tools, Hilfe und mehr suchen (ALT + M)

StartEinfügenTeilenSeitenlayoutFormelnDatenÜberprüfenAnsichtAutomatisierenHilfeZeichnen

öffnen

|     |                            |       |                                                                                          |                               |            |           |           |                  |        |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
|-----|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|     | A                          | B     | C                                                                                        | D                             | E          | F         | G         | H                | I      | J                                                              | K                                                                                | L | M |  |
| 1   | CutOverPlan                |       |                                                                                          |                               |            |           |           |                  |        |                                                                | M = erreichter Meilenstein<br>A = auszuführende Aktion<br>Q = Qualitätssicherung |   |   |  |
| 2   |                            |       |                                                                                          |                               |            |           |           |                  |        |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 3   |                            |       |                                                                                          |                               |            |           |           |                  |        |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 4   | LF-Nr.                     | Modul | Aktion                                                                                   | Cluster (Zeitlich Einordnung) | Wochen-tag | Datum von | Datum bis | Dauer (optional) | Status | Verantwortlicher Ansprechpartner aus Fachbereich (Entscheider) | Ausführender ADAC (entweder ...)                                                 |   |   |  |
| 370 | Q                          | FI    | Prüfen (Querprüfung Tabellen)                                                            | Nach Migration                | Sa         |           |           |                  | offen  | Margarita Brahm                                                | Richard Schildberger                                                             |   |   |  |
| 371 | M                          | IT    | Ende: MIG Bewegungsdaten                                                                 | Überschrift                   | Sa         |           |           |                  |        |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 372 | Schnittstellen-Tätigkeiten |       |                                                                                          |                               |            |           |           |                  |        |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 374 | M                          | IT    | Start: Schnittstellen-Tätigkeiten                                                        | Überschrift                   | Sa         |           |           |                  |        |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 375 | A                          | IT    | Einrichten logische System                                                               |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                | Claus Block                                                                      |   |   |  |
| 376 | A                          | IT    | Anlegen Varianten für Schnittstellen (Liste wird aktuell erstellt), Status "freigegeben" |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                | Johannes Schaut                                                                  |   |   |  |
| 377 | A                          | IT    | Jobs für Dateischnittstellen prüfen, ggf. ergänzen (TCode ZBC_JOBCONTROL)                |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                | Claus Block                                                                      |   |   |  |
| 378 | A                          | IT    | Splitter aktivieren (R3 / S4)                                                            |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                | Hr. Emde / Basis                                                                 |   |   |  |
| 379 | A                          | IT    | Einplanen der Jobs und Varianten Status "eingeplant"                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                | Johannes Schaut                                                                  |   |   |  |
| 380 | A                          | IT    | 1000 AVM-Schnittstelle abschalten für 2400 und 3800                                      |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 381 | A                          | IT    | 1000 AVM-Schnittstelle aktivieren                                                        |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 382 | A                          | IT    | 1002 Airplus-Schnittstelle abschalten                                                    |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 383 | A                          | IT    | 1002 Airplus-Schnittstelle aktivieren                                                    |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 384 | A                          | IT    | 1007 PayOne-Schnittstelle abschalten                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 385 | A                          | IT    | 1007 PayOne-Schnittstelle aktivieren                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 386 | A                          | IT    | 1008 Computop-Schnittstelle abschalten                                                   |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 387 | A                          | IT    | 1008 Computop-Schnittstelle aktivieren 2                                                 |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 388 | A                          | IT    | 1010 g3Bank-Schnittstelle abschalten                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 389 | A                          | IT    | 1010 g3Bank-Schnittstelle aktivieren                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 390 | A                          | IT    | 1022 Intrashop-Schnittstelle abschalten                                                  |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 391 | A                          | IT    | 1022 Intrashop-Schnittstelle aktivieren                                                  |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 392 | A                          | IT    | 1023 Intrum-Schnittstelle abschalten                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 393 | A                          | IT    | 1023 Intrum-Schnittstelle aktivieren                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 394 | A                          | IT    | 1024 Ivalua-Schnittstelle abschalten                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 395 | A                          | IT    | 1024 Ivalua-Schnittstelle aktivieren                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 396 | A                          | IT    | 1029 LAVA-Schnittstelle abschalten                                                       |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 397 | A                          | IT    | 1029 LAVA-Schnittstelle aktivieren                                                       |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 398 | A                          | IT    | 1032 LTS-Schnittstelle abschalten                                                        |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 399 | A                          | IT    | 1032 LTS-Schnittstelle aktivieren                                                        |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 400 | A                          | IT    | 1035 PayPal-Schnittstelle abschalten                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 401 | A                          | IT    | 1035 PayPal-Schnittstelle aktivieren                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 402 | A                          | IT    | 1045 SPIDER-Schnittstelle abschalten                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 403 | A                          | IT    | 1045 SPIDER-Schnittstelle aktivieren                                                     |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 404 | A                          | IT    | 1049 Zemarep-Schnittstelle abschalten                                                    |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 405 | A                          | IT    | 1049 Zemarep-Schnittstelle aktivieren                                                    |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 406 | A                          | IT    | 1052 Planis Enterprise PPM-Schnittstelle abschalten                                      |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 407 | A                          | IT    | 1052 Planis Enterprise PPM-Schnittstelle aktivieren                                      |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |
| 408 | A                          | IT    | 1056 SAP HCM-Schnittstelle aktivieren ALE                                                |                               | Sa         |           |           |                  | offen  |                                                                |                                                                                  |   |   |  |

Abbildung 6: COP GU RICEFW

ADAC: Road to HANA – Teilprojekt F2H (Stand: September 2025)

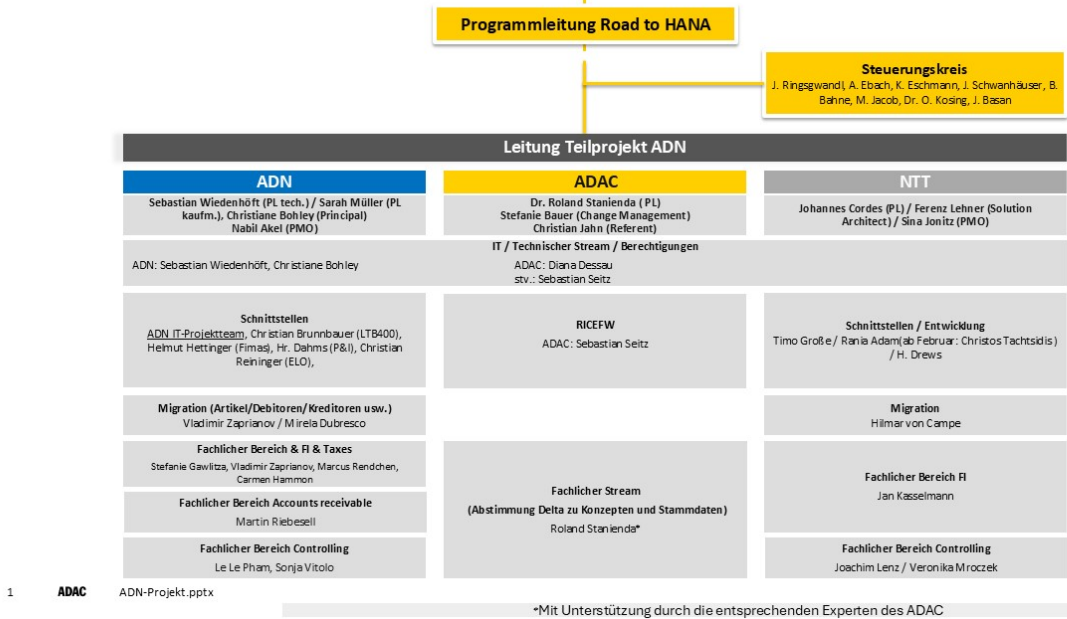


Abbildung 7: Organigramm F2H Projekt

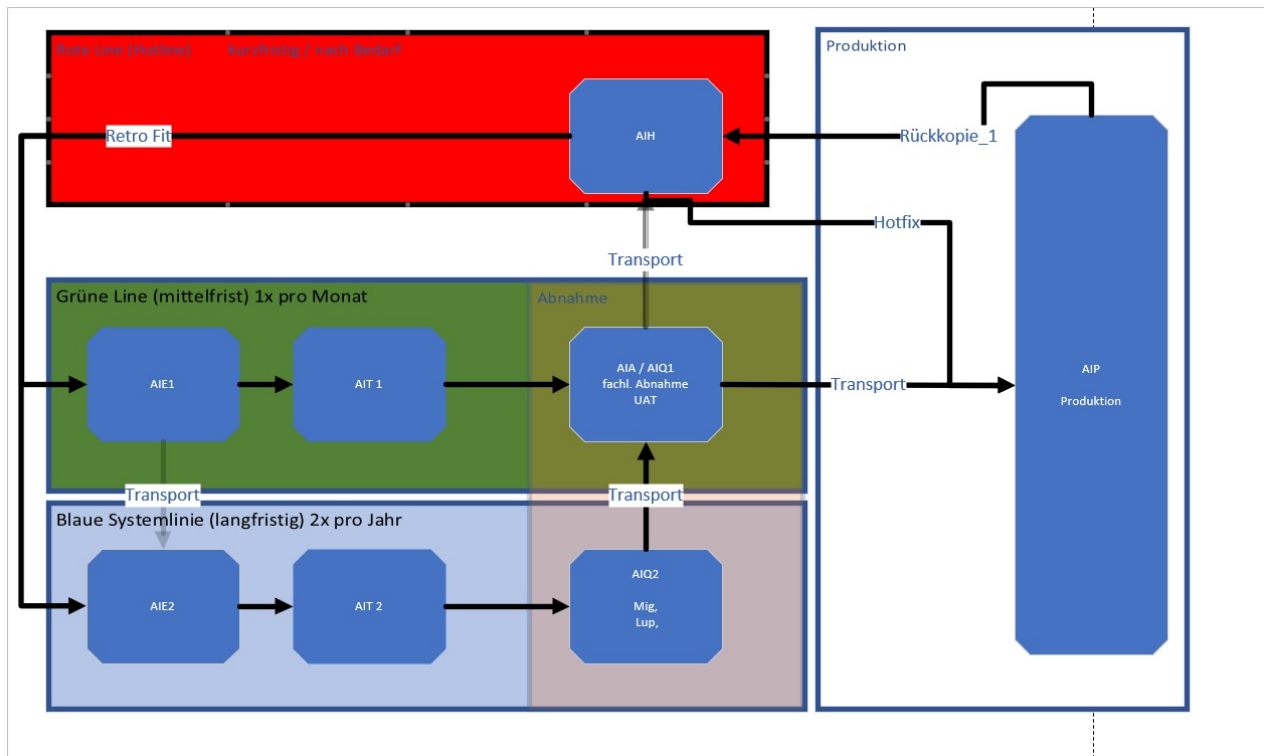


Abbildung 8: Zielbild der ERP-SAP-Umgebungslandschaft




Abbildung 9: Testpläne SST




Abbildung 10: Initiierung Betriebsübergabe

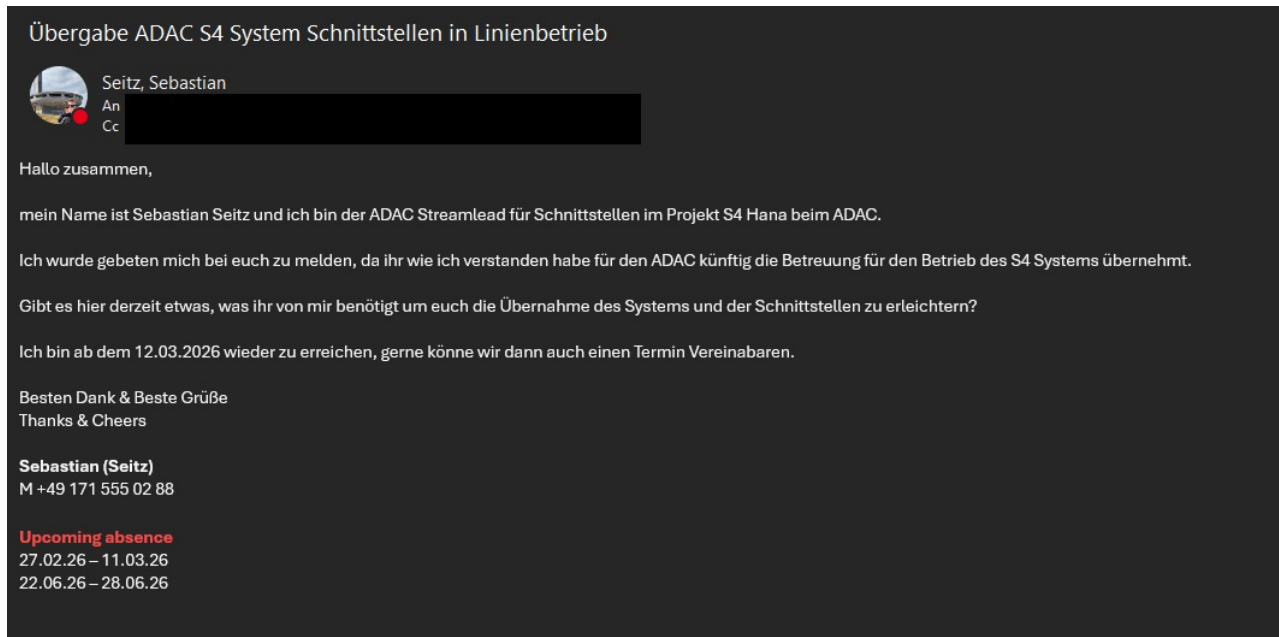


Abbildung 11: Initiierung und Übergabe

## Tabellen

| Status                | Datum      | Beschreibung                | Anzahl    |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| Aktualisiert          | 31.03.2026 | Status aktualisiert         | 2         |
| Wartend auf Antwort   | 31.03.2026 | Rückmeldung ausstehend      | 3         |
| Gelöst                | 31.03.2026 | Vorgang gelöst              | 4         |
| Geschlossen           | 31.03.2026 | Vorgang abgeschlossen       | 62        |
| <b>Gesamtergebnis</b> | 31.03.2026 | <b>Summe aller Vorgänge</b> | <b>71</b> |

Tabelle 4: MyIT Statusübersicht RICEFW ende HC

Eingespielte Dateien / Umbuchungsjobs UAT Welle 1.1

[View Selection](#) [Sort](#) [View Worksheet](#) [View Log](#)

| Schnittstelle               | Datei                                                                   | Datendatum / Laufnummer | EQA701 Laufnummer                | Z01 Laufnummer         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1000_04 Broker              | <a href="#">BPCS_SAP_00008378_260215_01.TXT_20260215-235540</a>         | 13.02.26 / 0008378      | E_0_FI_IO_1000_04_AVM_BRO_CEO2   | NR                     |
| 1000_04 Broker              | <a href="#">BPCS_SAP_00008379_260214_01.TXT_20260214-235539</a>         | 14.02.26 / 0008379      | E_0_FI_IO_1000_04_AVM_BRO_CEO3   | NR                     |
| 1000_04 Broker              | <a href="#">BPCS_SAP_00008380_260215_01.TXT_20260215-235539</a>         | 15.02.26 / 0008380      | E_0_FI_IO_1000_04_AVM_BRO_CEO4   | NR                     |
| 1000_04 Broker              | <a href="#">BPCS_SAP_00008381_260216_01.TXT_20260216-235615</a>         | 16.02.26 / 0008381      | E_0_FI_IO_1000_04_AVM_BRO_CEO5   | NR                     |
| 1000_05 Camper              | <a href="#">SAP_MDCAMPER_19_000081_260310_01.txt_20260310-051544</a>    | 10.03.26 / 000081       | E_0_FI_IP_1000_05_AVM_100326     | NR                     |
| 1000_05 Camper              | <a href="#">SAP_MDCAMPER_19_000081_260310_01.txt_20260310-051544_MD</a> | 18.03.26                | E_0_FI_IP_1000_05_AVM_260318     | NR                     |
| 1000_06 Fleet               | <a href="#">BPCS_SAP_007300_260212_01.TXT_20260212-034519</a>           | 12.02.26 / 007300       |                                  | MCHF1390_260212_7300   |
| 1000_06 Fleet               | <a href="#">BPCS_SAP_007301_260213_01.TXT_20260213-034523</a>           | 13.02.26 / 007301       | E_0_FI_IP_1000_06_AVM_MDCAR_CEO1 | MCHF1390_260213_7301   |
| 1000_06 Fleet               | <a href="#">BPCS_SAP_007302_260214_01.TXT_20260214-034519</a>           | 14.02.26 / 007302       | E_0_FI_IP_1000_06_AVM_MDCAR_CEO2 | MCHF1390_260214_7302   |
| 1000_06 Fleet               | <a href="#">BPCS_SAP_007303_260215_01.TXT_20260215-034519</a>           | 15.02.26 / 007303       | E_0_FI_IP_1000_06_AVM_MDCAR_CEO3 | MCHF1390_260215_7303   |
| 1000_06 Fleet               | <a href="#">BPCS_SAP_007304_260216_01.TXT_20260216-034521</a>           | 16.02.26 / 007304       | E_0_FI_IP_1000_06_AVM_MDCAR_CEO4 | MCHF1390_260216_7304   |
| 1000_06 Fleet               | <a href="#">BPCS_SAP_007217_251125_01.TXT_20251125-034519</a>           | Sonderlauf!             | E_0_FI_IP_1000_06_AVM_MD_100326  | NR                     |
| 1000_09 AVM Umbuchung       | <a href="#">avmumbu.txt</a>                                             | 16.02.26                |                                  |                        |
| 1000_09 AVM Umbuchung       | <a href="#">avmumbu.txt</a>                                             | 21.03.26                | E_0_FI_IP_1000_09_AVM_UMB_260323 | PHF10770_2303_ECHTLAUF |
| 1002_01 AIRPLUS 3800        | <a href="#">Hd31212_20260303_080331</a>                                 | 03.03.26                | E_0_FI_IP_1002_01_2400_260303_V5 | NR                     |
| 1002_01 AIRPLUS 3800        | <a href="#">Hd31212_20260310_020718</a>                                 | 10.03.26                | E_0_FI_IP_1002_01_3800_260310    | NR                     |
| 1002_01 AIRPLUS 2400        | <a href="#">Hd31212_20260303_044233</a>                                 | 03.03.26                | E_0_FI_IP_1002_01_3800_260310_V2 | NR                     |
| 1002_01 AIRPLUS 2400        | <a href="#">Hd31212_20260310_004703</a>                                 |                         | E_0_FI_IP_1002_01_3800_260310_V3 | NR                     |
| 1007_03 AVM Payone          | <a href="#">Hd09810_20260212_091510.dsh</a>                             | 12.02.26                | E_0_FI_IO_1007_03_PAYONE_AVMBROK | NR                     |
| 1007_03 AVM Payone          | <a href="#">Hd09810_20260213_091510.dsh</a>                             | 13.02.26                | E_0_FI_IO_1007_03_AVMBROK_260213 | NR                     |
| 1007_03 AVM Payone          | <a href="#">Hd09810_20260214_091509.dsh</a>                             | 14.02.26                | E_0_FI_IO_1007_03_AVMBROK_260214 | NR                     |
| 1007_03 AVM Payone          | <a href="#">Hd09810_20260217_091509.dsh</a>                             | 17.02.26                | E_0_FI_IO_1007_03_AVMBROK_260217 | NR                     |
| 1008_01 Computop            | <a href="#">ADAC_POS_MASTER#20260212#001.ctstf</a>                      | 12.02.26                | E_0_FI_IO_1008_01_ZFL_COMPUTOP   | NR                     |
| 1008_01 Computop            | <a href="#">ADAC_POS_MASTER#20260212#001.ctstf</a>                      | 13.02.26                | E_0_FI_IO_1008_01_COMP_130226    | NR                     |
| 1008_01 Computop            | <a href="#">ADAC_POS_MASTER#20260213#001.ctstf</a>                      | 14.02.26                | E_0_FI_IO_1008_01_COMP_140226    | NR                     |
| 1008_01 Computop            | <a href="#">ADAC_POS_MASTER#20260214#001.ctstf</a>                      | 15.02.26                | E_0_FI_IO_1008_01_COMP_150226    | NR                     |
| 1008_01 Computop            | <a href="#">ADAC_POS_MASTER#20260215#001.ctstf</a>                      | 16.02.26                | E_0_FI_IO_1008_01_COMP_160226    | NR                     |
| 1010_01 ELFE                | <a href="#">Hd31015.dsh</a>                                             | 15.02.26                | E_0_FI_IO_1010_01_ELFE_260215    |                        |
| 1029_03 Lava                | <a href="#">HFD59212_20260212_2130.DGH</a>                              | 12.02.26                | E_0_FI_IO_1029_03_LAVA_CEO7      | MCHF103_20260212       |
| 1029_03 Lava                | <a href="#">HFD59212_20260213_2125.DGH</a>                              | 13.02.26                | E_0_FI_IO_1029_03_LAVA_CEO8      | MCHF103_20260213       |
| 1029_03 Lava                | <a href="#">HFD59212_20260216_2204.DGH</a>                              | 16.02.26                | E_0_FI_IO_1029_03_LAVA_CEO10     | MCHF103_20260216       |
| 1029_03 Lava                | <a href="#">Hd09810_20260217_091509.dsh</a>                             | 17.03.26                | E_0_FI_IO_1029_03_LAVA_260217    | MCHF103_20260217       |
| 1036_01 AVM PayPal          | <a href="#">Hd09830_20260212_140026.dsh</a>                             | 12.02.26                | E_0_FI_IP_1036_01_PAYPAL_BROKER  | NR                     |
| 1036_01 AVM PayPal          | <a href="#">Hd09830_20260213_140030.dsh</a>                             | 13.02.26                | E_0_FI_IP_1036_01_PAYBRO_260213  | NR                     |
| 1036_01 AVM PayPal          | <a href="#">Hd09830_20260214_140028.dsh</a>                             | 14.02.26                | E_0_FI_IP_1036_01_PAYBRO_260214  | NR                     |
| 1036_01 AVM PayPal          | <a href="#">Hd09830_20260215_140031.dsh</a>                             | 15.02.26                | E_0_FI_IP_1036_01_PAYBRO_260215  | NR                     |
| 1036_01 AVM PayPal          | <a href="#">Hd09830_20260216_140027.dsh</a>                             | 16.02.26                | E_0_FI_IP_1036_01_PAYBRO_260216  | NR                     |
| 1070_03 Eos Zahlungseingang | <a href="#">FROM_EOS0053020260131.csv</a>                               | 31.01.26                | E_0_FI_IV_1070_03_EOS_Z_260131   | NR                     |
| 1070_03 Eos Zahlungseingang | <a href="#">FROM_EOS0030.dsh</a>                                        | 28.03.26                | E_0_FI_IV_1070_03_EOS_Z_260326V2 | NR                     |

| Umbuchungsjob                    | Datum               | System | Laufnummer | Ergebnis                                |
|----------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------------------------------------|
| Z_0_FI_IO_1007_03_PAY_UM_260313  | 13.03.2026 15:43    | S4     |            | Erfolgreich.                            |
| Z_0_FI_IV_0000_00_BS_UMPP_260313 | 13.03.2026 17:29    | S4     |            | Erfolgreich.                            |
| Z_0_FI_IO_1007_03_PAYUMBU_260313 | 13.03.2026 17:41    | S4     |            | Erfolgreich.                            |
| PHF10770_3603_8                  | 16.03.2026 17:10    | R3     |            | Erfolgreich.                            |
| E_0_FI_IP_1000_09_AVM_UMBU_DH    | 17.03.2026 08:37:22 | S4     |            | Erfolgreich.                            |
| Z_0_FI_IV_0000_00_SD_UMB_260317  | 17.03.2026 11:54:22 | S4     |            | Erfolgreich.                            |
| Z_0_FI_IV_0000_00_SD_UMB_260318  | 18.03.2026 11:44:30 | S4     |            | Erfolgreich.                            |
| Z_0_FI_IV_0000_00_BS_U_PP_260320 | 20.03.2026 08:47:52 | S4     |            | Erfolgreich, aber keine daten gefunden. |

Abbildung 12: UAT W1.1 Datendokumentation



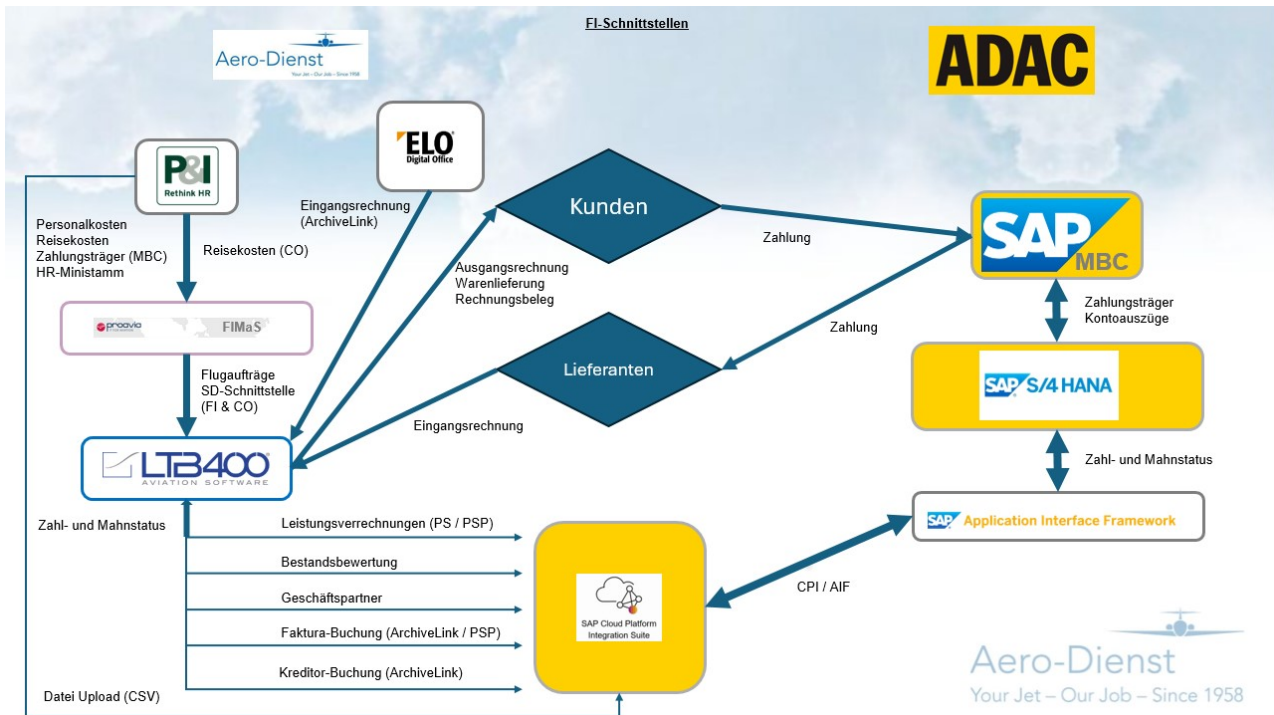


Abbildung 13: ADN SST FI Architekturbild

| A                    | B          | D                                     | G                                | J         | K           | L           | M                                   | N                                   | O          | P              |              |
|----------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| F ID - Schaltstellen | Typ        | Input                                 | Prio                             | Version 0 | Version 0.1 | Version 0.2 | Version 0.3                         | Version 1                           | Status     | Verantwortlich |              |
| 2                    | F2000.01   | Business Partner                      | LTB400 to S/4HANA                | 1         | 21.01.2026  | 17.03.2026  | 31.03.2026                          | 07.04.2026                          | 08.07.2026 | Pending        | ADN/LTB400   |
| 3                    | F2000.02   | Fakturen und Anzahlungen              | LTB400 to S/4HANA                | 1         | 28.01.2026  | 17.02.2026  | <del>17.03.2026</del><br>26.03.2026 | <del>24.03.2026</del><br>30.03.2026 | 08.07.2026 | Overdue        | LTB400       |
| 4                    | F2000.02.3 | Eingangsrechnung                      | LTB400 to S/4HANA                | 1         | 04.02.2026  | 17.02.2026  | <del>17.03.2026</del><br>26.03.2026 | <del>24.03.2026</del><br>30.03.2026 | 08.07.2026 | Overdue        | LTB400       |
| 5                    | F2000.03   | Rückmeldedaten                        | S/4HANA to LTB400                | 2         | 04.02.2026  | 11.02.2026  | 04.03.2026                          | 11.03.2026                          | 08.07.2026 | Pending        | SAP          |
| 6                    | F2000.04   | PSP-Elemente                          | LTB400 to S/4HANA                | 1         | 18.02.2026  | 17.03.2026  | 31.03.2026                          | 07.04.2026                          | 08.07.2026 | Pending        | LTB400 / SAP |
| 7                    | F2000.02.1 | Kundenauftrags-einzelkosten           | LTB400 to S/4HANA                | 2         | 25.02.2026  | 31.03.2026  | 03.04.2026                          | 07.04.2026                          | 08.07.2026 | Pending        | LTB400       |
| 8                    | F2000.05   | Leistungsmengenschnittstelle          | LTB400 to S/4HANA                | 2         | 04.03.2026  | 17.03.2026  | 31.03.2026                          | 07.04.2026                          | 08.07.2026 | Pending        | LTB400       |
| 9                    | F2000.02.2 | Reisekostenschnittstelle              | LTB400 to S/4HANA                | 2         | 07.04.2026  | 21.04.2026  | 05.05.2026                          | 19.05.2026                          | 08.07.2026 | Pending        | Loga         |
| 10                   | F2001.02   | HR-Ministamm                          | P&I an S/4HANA                   | 2         |             |             |                                     |                                     | 08.07.2026 | Canceled       |              |
| 11                   | F2001.01   | Personalkosten (FI-Buchung)           | P&I an S/4HANA                   | 1         | 07.05.2026  | 17.03.2026  | 31.03.2026                          | 07.04.2026                          | 08.07.2026 | Pending        | Loga         |
| 12                   | F2003.01   | Dokumentenverknüpfung                 | SAP Integration Suite an S/4HANA | 2         | 04.03.2026  |             |                                     |                                     |            | Pending        | ELO / SAP    |
| 13                   | F2002.01   | Elster Umsatzsteuervoranmeldung       | SAP S/4HANA to Elster            | 1         | 12.03.2026  |             |                                     |                                     |            | Pending        | SAP          |
| 14                   | F2004.01   | FinanzOnline Umsatzsteuervoranmeldung | SAP S/4HANA to FinanzOnline      | 3         | 19.03.2026  |             |                                     |                                     |            | Pending        | SAP          |
| 15                   | XXX        | Zahlungsdaterträger                   | P&I an SAP S/4HANA               | TBD       | 25.02.2026  |             |                                     |                                     |            | Pending        | SAP / Loga   |

Abbildung 14: ADN SST FI Versions- und Iterationsplan



| BK   | Firma                     | Wellle | Ort          | Länderschlüssel | Währung |
|------|---------------------------|--------|--------------|-----------------|---------|
| 1000 | ADAC e.V.                 | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 1100 | ADAC Luftrettung gGmbH    | 4.0    | Weßling      | DE              | EUR     |
| 1200 | ADAC Stift. Gelber Engel  | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 1300 | ADAC Stiftung             | 2.0    | München      | DE              | EUR     |
| 1400 | ADAC Customer Service Gmb | 2.0    | München      | DE              | EUR     |
| 1700 | ADAC Motorsport GmbH      | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 1800 | ADAC Digitale Mglst. GmbH | 2.0    | München      | DE              | EUR     |
| 2000 | ADAC SE                   | 2.0    | München      | DE              | EUR     |
| 2100 | ADAC Medien und ReiseGmbH | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 2200 | ADAC Touring GmbH         | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 2300 | ADAC Service GmbH         | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 2400 | ADAC Autovermietung GmbH  | 1.1    | München      | DE              | EUR     |
| 2500 | ADAC Telematik GmbH       | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 2600 | ADAC Motorsport GmbH      | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 2700 | ADAC Fahrsicherh. GmbH    | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 2800 | HMS Helicopt.Medical GmbH | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 2900 | ADAC Finanzdienste GmbH   | 2.0    | München      | DE              | EUR     |
| 3000 | ADAC RSR GmbH             | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 3100 | ADAC HEMS Academy GmbH    | 3.0    | Weßling      | DE              | EUR     |
| 3200 | PiNCAMP GmbH              | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 3400 | ADAC Aquico GmbH          | 2.0    | München      | DE              | EUR     |
| 3500 | Aero-Dienst Verwaltungs G | 3.0    | Nürnberg     | DE              | EUR     |
| 3600 | ADAC TruckService Verwalt | 3.0    | Laichingen   | DE              | EUR     |
| 3700 | ADAC Compliance Service G | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 3800 | ADAC IT Service GmbH      | 1.0    | München      | DE              | EUR     |
| 4000 | ADAC Unterstützungsk.GmbH | 2.0    | München      | DE              | EUR     |
| 4100 | ADAC Stiftung Sport       | 2.0    | München      | DE              | EUR     |
| 4200 | ADAC RSB AG & Co. oHG     | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 4300 | ADAC Tiefg.-Betr. GBR     | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 6000 | ADAC-Rechtsschutz-AG      | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 6100 | ADAC Versicherung AG      | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 6200 | ADAC DTC-Versicherungs AG | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 6600 | ARISA Assurances S.A.     | 3.0    | Luxembourg   | LU              | EUR     |
| 6700 | ARISA Ré S.A., Luxemburg  | 3.0    | Luxembourg   | LU              | EUR     |
| 8000 | Aero-Dienst GmbH          | 1.3    | Nürnberg     | DE              | EUR     |
| 8100 | ADAC Heliservice GmbH     | 3.0    | St. Augustin | DE              | EUR     |
| 8200 | HMotion GmbH              | 3.0    | Gilching     | DE              | EUR     |
| 8300 | Dienstleistungs-Center Ha | 3.0    | Halle        | DE              | EUR     |
| 8500 | ADAC TruckService GmbH &  | 3.0    | Laichingen   | DE              | EUR     |
| 8600 | GKS Gesellschaft für Komm | 3.0    | Passau       | DE              | EUR     |
| 8700 | Car-Port Autotransp. GmbH | 3.0    | Schönkirchen | DE              | EUR     |
| 9100 | ADAC HEMS und Fachkräfte  | 3.0    | München      | DE              | EUR     |
| 9300 | ADAC Service Hellas A.E.  | 3.0    | Glyfada      | GR              | EUR     |
| 9400 | ADAC Service Adria d.o.o. | 3.0    | Zagreb       | HR              | HRK     |

Tabelle 6: Wellenzuordnung der Buchungskreise R2H Stand 01.05.2026

## Stufen der Schnittstellenintegration mit S/4

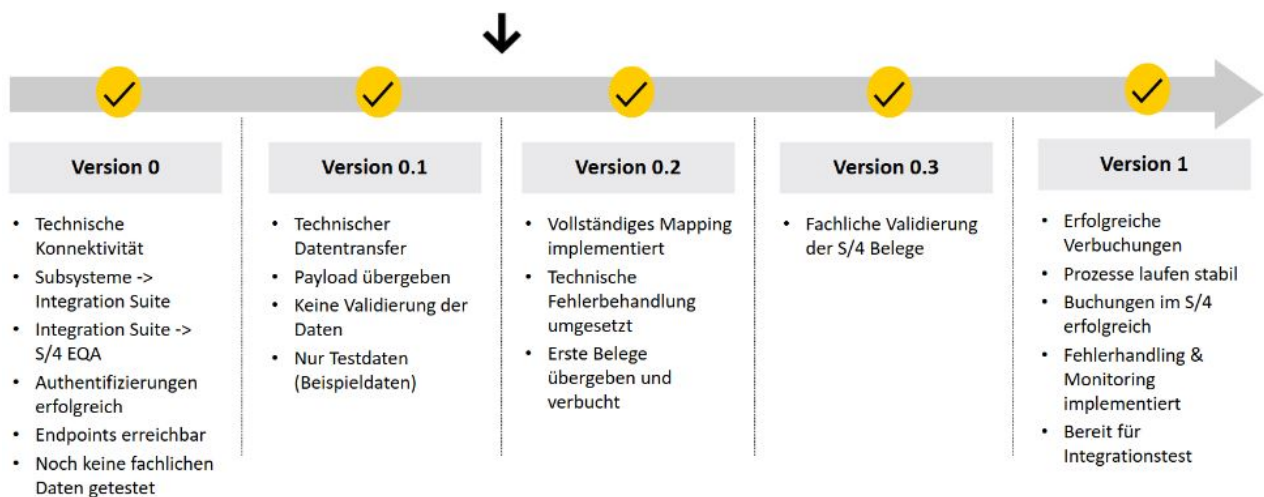


Abbildung 15: ADN SST FI Versions- und Iterationsplan Erklärung

## 1. Scopeklärung

Aus meiner Sicht sollte der Umfang und der wirklich operativ umzusetzende Scope für Welle 2 besser (im Sinne von mit größerer Sorgfalt) erhoben werden (Stichwort hier systematische Auswertung der Belege im R3 / Schnittstellendaten. Dies sollte mit Experteninterviews (technisch und fachlich) Kombiniert werden. Hier sollten die Schnittstellen und Entwicklungen auch auf Prozesse gemappt werden.

## 2. Backlogaufbau

Aus meiner Sicht sollten so die fachlichen Prozesse als Klammer im Sinne eines „Epic“ (respektive Anforderung) oder eines Paketes der 1.sten Ordnung dienen.

Die notwendigen den einzelnen fachlichen / technischen Streams zuzuordnenden Arbeitspaketen würde ich auf Ebene der Features (2te Ordnung sehen) dies würde also alle notwendigen RICEF Themen in einem, alle fachlichen Customizings und auch die notwendigen integrativen-Tests beheimatet.

Die operative / Umsetzungs- / Trackingebene für die Streams ist dann die User Story Ebene oder Paket der dritten Ordnung. Sollten mehrere US pro fachlicher Stream notwendig sein, so sind diese als Kettenumsetzung zu sehen, deren Umsetzung und komponentenhafte-Verprobung innerhalb eines Sprints (Dauer 3 Wochen) abzuarbeiten ist.

Eine mögliche 4. Ebene in Form von Tasks unter US würde ich den jeweiligen Streams im Sinne einer frei zu gestaltenden Selbstorganisation freistellen.

Dieser Ansatz ermöglicht auch ein gemeinsames Verständnis einer Natürlichen Abarbeitungsreihenfolge.

## 3. Verantwortungszuordnung

Jede eben hat eine klare Verantwortungszuordnung, aus einem Pärchen von Fachlichkeit und Technik.

1. Ebene: Steuerungsebene PL
2. Ebene: Steuerungsebene Streamlead
3. Ebene: Steuerungsebene Umsetzungssowner

Dies würde meiner Meinung nach auch mehr Klarheit über die Handlungsebene / Entscheidungskompetenz der einzelnen Rollen bringen.

## 9. Meetingstruktur

Ich denke es sollte in jedem Stream mindestens in den Kernarbeitstagen (Di mit Do). Darüber hinaus sollte es mMn auch ein tägliches Scrum of Scrums / Daily (15min) aller Streamlead und PL geben, um dort Informationen zu erhalten oder auch Fragen platzieren zu können, sowie die Notwendigkeit für bilaterale Abstimmungen zu erkennen. Ebenso wichtig / wirkungsvoll erachte ich ein „echtes“ Statusmeeting, welches in regelmäßigem Turnus stattfindet und auch wirklich zu Diskussionen führt.

## 10. Governance für Zentrale Themen

Es sollte ein definiertes, sachverständiges und auch entscheidungsbefugtes Gremium ins Leben gerufen werden, welches sich mit zentralen und für das Projekt basalen Themen beschäftigt, wie beispielsweise:

1. Umgebungsplanung/ Umgebungsnetzungsplanung
2. Transportorganisation / Planung
3. Testdatengovernance
4. Abstimmung Betrieb/ Projekt (Retrofit)
5. Migrationszeitpunkte Abstimmen

## 11. Dokumentation

Soweit mir bekannt, gibt es keine projekteinheitliche Dokumentationsrichtlinie / Anforderung an die Betriebsübergabedokumentation. Hier sollte aus meiner Sicht schnellstmöglich ein Set an Mindestanforderungen des ADAC definiert werden, und auch die dafür Notwendige Zeit im Projekt eingeplant werden.

## 12. Scopeabgrenzung / Nicht-Ziele

Aus meiner Sicht ebenso wichtig ist eine Abgrenzung. Eine ILV-APP ist meines Wissens KEIN Bestandteil des S4 Programms und sollte daher auch nicht in dessen Bewertung einführen. Dies gilt auch für weitere Themen wie bspw. die Anpassung von UAC-Jobs, um eine Belieferung der Dateischnittstellen zu gewährleisten. Hier sollte sich in der Scopeklärung/ Erarbeitung überlegt werden wie derartige Themen zu handhaben sind und ein definiertes Vorgehen erarbeitet werden.

## 4. RICEFW Bündeln

Aus meiner Sicht würde das Sinn machen, Entwicklungen und Schnittstellen zu bündeln. Die Trennung hat uns viele künstliche Grenzen gebracht, die das Große Ganze nicht beschleunigt haben.

## 5. Lieferorganisation

Ich persönlich benötige keinen NTT-Counterpart (dies mag auch meinem persönlichen Counterpart geschuldet sein). Mir wäre ein direkter Zugriff auf die Umsetzer einhergehend mit der Umsetzungsverantwortung deutlich lieber. Der NTT-Kontakt wäre dann nur für die disziplinarische Führung / Expertenorganisation zuständig. Dies wäre jedoch meinem Empfinden nach aber ein Bruch des bisherigen Verantwortungskonzepts. Jedoch könnte dies Imho auch eine Chance sein, die bisher nicht vollumfänglich gelebte Eigentümerschaft / Identifikation der Stakeholder / ADAC Key User mit dem Produkt.

## 6. Personalsituation

Leider haben wir nach meinem Empfinden einige Personen die dem Team/ Projekt dauerhaft mehr Ressourcen kosten, als dass ihre aktive Mitarbeit freisetzt. Hierzu sollte nachgesteuert werden. Dies ist mMn nach über alle beteiligten ADAC-Bereiche (Finanzbereich/AIS) also auch bei den externen Partnern der Fall. Durch das „in den Lead“ gehen des ADAC muss ihm dann natürlich auch die Entscheidungsgewalt über die Ressourcen innewohnen. Dies muss in Absprache mit der Projektleitung erfolgen.

Grundsätzlich würde ich mir wünschen dezidierte Ressourcen zur Verfügung zu haben, um auch eine Planbarkeit zu erreichen, aktuell sind die NTT und auch z.T. ADAC-Ressourcen oftmals nicht wirklich greifbar.

## 7. Toolingsituation

Aus meiner Sicht kommt nur die Kombi aus JIRA/ Confluence in Frage. Deren Nutzung ist noch stärker zu forcieren, so dass auch alle Tasks darin geführt und getrackt werden. Dies gilt auch für projektexterne Entwickler (Stichwort: Bergomatz/ Weißes Kaninchen). Für eine Transparentere Kommunikation kann ich nur dazu anregen die umfangreichen Kommentarfunktion zu nutzen. Auch bei Excellisten und sonstigem haben wir einen ziemlichen Wildwuchs erreicht, wenn ich alleine an die Unterschiedlichen Job-Excels denke. Dazu kommt die Unsitte Projektdaten alleine auf eigenen Laufwerken zu horten (vor allem NTT aber leider auch ADAC (bin selbst keine gute Ausnahme)). Da beide Tools revisionssicher Versionieren, kann ich nur dazu raten hier keine zu große Scheu bei der Rechteverwaltung walten zu lassen.

## 8. Phasenorganisation / Sprintorganisation

Aus meiner Sicht macht ein „weiter so“ bei der grundsätzlichen Phasenorganisation wenig Hoffnung auf höhere Steuerbarkeit, insbesondere wenn diese willkürlich beendet werden, ohne die angestrebten Ziel zu erreichen oder einfach dann parallel laufen. Ich persönlich habe gute Erfahrung mit kürzeren Sprint-Intervallen. Hier könnte man anleihen an ADAM und VITA nehmen und einen Dreiwochenzyklus einführen, der dann auch mit einer Retro abgeschlossen wird.

AW: Workshop intern Prozessschärfung, Klärung interne Zuständigkeiten, etc.

Seitz, Sebastian  
an

251113\_Seit Sebastian\_Welle2.docx - docx-Datensatz

Guten Abend zusammen,

anbei findet ihr meine Gedanken zum Thema Welle 2 und wie wir uns verbessern können.

Schade das ich bei dem Workshop nicht dabei sein kann, aber ich freue mich dennoch sehr über meinen Ufauß.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Besten Dank & Beste Grüße  
Thanks & Cheers

Sebastian (Seitz)  
M +49 171 555 02 88

Upcoming events  
17.11 - 21.11.2025

— Ursprünglicher Termin —  
Workshop: Zentrale Road to HANA <Road to HANA>@adac-dep  
Gesendet: Freitag, 17. Oktober 2025 09:59  
An  
Cc  
Betreff: Workshop intern Prozessschärfung, Klärung interne Zuständigkeiten, etc.  
Zeit: Mittwoch, 19. November 2025 14:15-16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.  
Ort: F 0387

Ich nehme Moderationskoffer mit 📁  
Evtl. macht sich jeder schon vorher über die Agenda, den Aufbau etc. Gedanken  
@Seitz Sebastian: wenn du Themen hast, die wir mitnehmen sollen, dann schreibe kurz zusammen und schicke an uns  
Danke und Euch allen ein schönes Wochenende  
Helga

Abbildung 16: Anregungen W2 und Lessons Learned W1

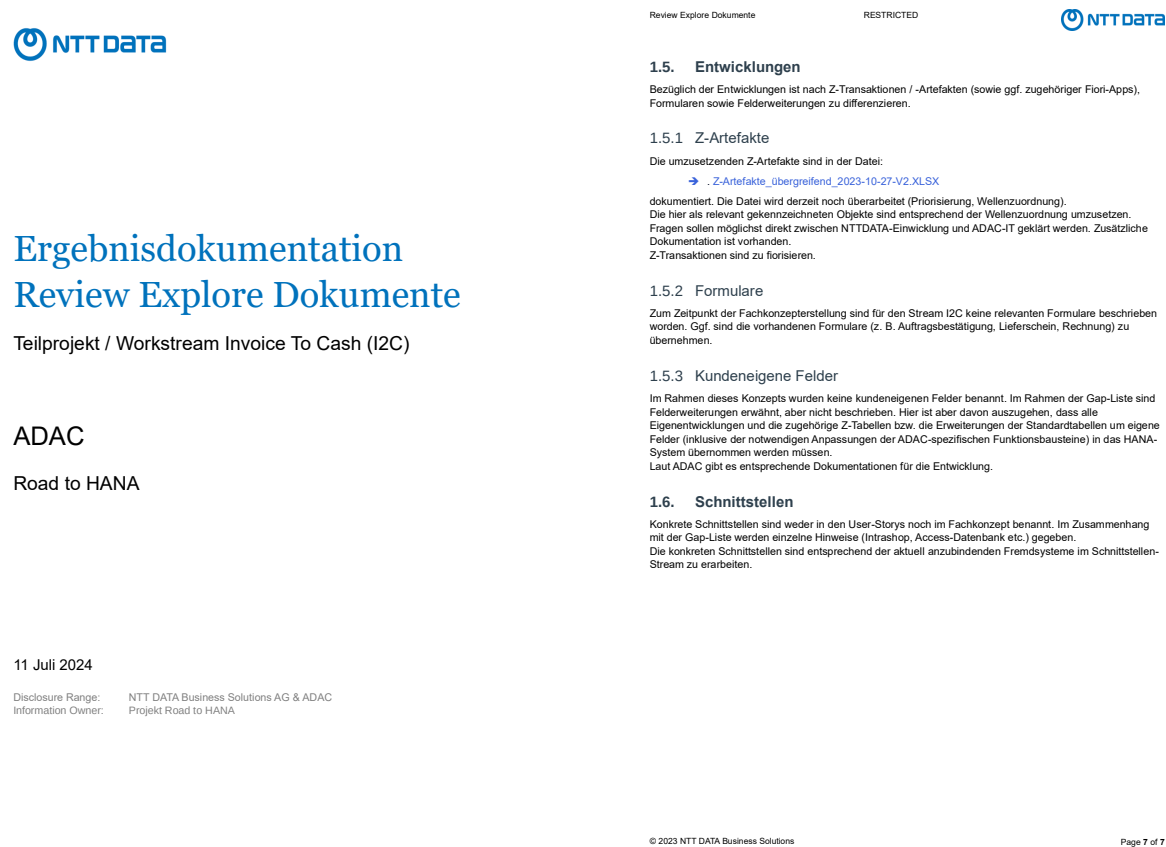


Abbildung 17: GU-Ramp-Up Dokumentation Stream I2C RICEFW+PB
