

Projektmanagement-Handbuch des ADAC

Katrin Wegner, IMM

Version 1.0

Vorwort

Die Weiterentwicklung des ADAC wird stark über Projekte vorangetrieben, so dass die Arbeit in Projekten einen wichtigen Teil in unserer Geschäftstätigkeit einnimmt.

Ziel des ADAC ist es, Projektmanagement (PM) erfolgreich und effizient – also ohne Ballast – anzuwenden. Dahin möchte das vorliegende Projektmanagement-Handbuch führen.

Das Handbuch soll innerhalb des Projektmanagements eine einheitliche Sprache, den Einsatz der zentralen Projektmanagementsoftware und ein einheitliches Vorgehen fördern. Unbekannte oder anders verwendete Begriffe und Dokumente erschweren die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen sowie die Kommunikation. Sie kosten Zeit und Geld. Darum sind in diesem Handbuch u.a. Begriffe, Zuständigkeiten und Kompetenzen im Projekt und in der projektbegleitenden Organisation definiert. Aufbauend auf dieser gemeinsamen Basis werden die Best Practices von Projektmanagement-Methoden und -Prozessen des ADAC dargestellt.

Checklisten, Methoden und Formulare, auf die verwiesen wird, sollen helfen, im Projekt von der Idee bis zum Projektabschluss die Fäden in der Hand zu behalten und das Projekt innerhalb des magischen Dreiecks (Zeit, Qualität und Kosten) erfolgreich ans Ziel zu bringen.

Dieses Projektmanagement-Handbuch soll auch in Zukunft eine Basis für die erfolgreiche Durchführung von Projekten bilden. Es muss sich in der Praxis bewähren und wird einem ständigen Entwicklungsprozess unterliegen. Darum sind alle Kolleginnen und Kollegen aufgerufen, Änderungswünsche und Anregungen sowie Erfolg versprechende Ideen einzubringen.

Herzlichen Dank an den Projektleiterkreis, an „THOST“ Consulting sowie an die erfahrenen Projektleiterinnen und Projektleiter aus unserem erweiterten Kernteam, die uns säulenübergreifend mit ihrer Projektmanagement-Expertise und ihrer Sicht hervorragende Unterstützung gegeben haben.

Gender-Disclaimer

Alle Inhalte wenden sich an und gelten für alle Geschlechter (w/m/d). Soweit grammatikalisch männliche, weibliche oder neutrale Personenbezeichnungen verwendet werden, dient dies allein der besseren Lesbarkeit.

Dokumenten Informationen

Versions-Historie

Version	erstellt am	Durch	Änderungen
0.1	23.09.2022	Katrin, Wegner	Entwurf Projektmanagement-Handbuch, Erstellung einer Struktur
0.1	21.12.2022	Katrin Wegner	Ergänzung der Kapitel „Projektabschluss“ und „Projektsteuerung“
0.1	10.02.2023	Katrin Wegner	Ergänzung der Kapitel Projektbeauftragung/ Projektstart, Vorgehensmodelle und Update Projektsteuerung
0.2	10.07.2023	Katrin Wegner	Einarbeitung der QS-Rückmeldungen
0.3-1.0	17.07.2024	Katrin Wegner	Ergänzung und Finalisierung der Einzelprojektmanagement-Kapitel

Glossar / Begriffsdefinitionen

Begriff	Erläuterung
Balkendiagramm	Ein Balkendiagramm eignet sich gut, um verschiedene Akteure zu vergleichen und Rangfolgen abzubilden. Im Projektmanagement wird meistens eine bestimmte Form des Balkendiagramms verwendet: das Gantt-Diagramm. Das Gantt Chart zeigt die zeitliche Abfolge von Projektaktivitäten auf einer Zeitachse und visualisiert so auch die Dauer und ggfs. zeitliche Überlappungen und Abhängigkeiten.
Balkenplan	Ein Balkenplan dient dazu die geplanten Arbeitspakete eines Projekts in Form von Balken grafisch darzustellen. Dabei werden die Arbeitspakete als Balken auf einer Zeitachse angeordnet. So sind die Reihenfolge der Arbeitspakete, mögliche Parallelaktivitäten, Meilensteine und Abhängigkeiten ersichtlich.
Change Request	Ein Formular zur Beantragung und Dokumentation einer wesentlichen Änderung im Projektverlauf
Gantt Chart	siehe Balkendiagramm
Lastenheft	Das Lastenheft ist die Zusammenstellung aller Anforderungen des Auftraggebers und des oder der Nutzer an das Projekt hinsichtlich der Ziele, des Liefer- und Leistungsumfangs und der Randbedingungen. Die Anforderungen und Randbedingungen sind aus Anwendersicht beschrieben und soweit möglich quantifiziert und überprüfbar.“[Platz, 2003:1064]
Liefergegenstand	Ein Liefergegenstand ist der Output, das Ergebnis eines Projektes oder Projektabschnitts. Es kann sich dabei um ein Produkt, ein Ergebnis oder eine Dienstleistung handeln. Die Auslieferung eines Liefergegenstands erfolgt häufig als Meilenstein.
Projektorganigramm	Ein Projektorganigramm ist ein Instrument zur grafischen Darstellung der Projektorganisation. Im Projektorganigramm werden die Projektrollenträger sowie deren Beziehungen zueinander dargestellt
(digitale) Projektakte	Eine Projektakte ist eine ganzheitliche Übersicht und Verwaltung von Projektplänen und -ergebnissen, die im Projektverlauf erweitert und ergänzt wird. Mit Einführung des PM-Tools „Planisware“ wird automatisch ein digitaler Projektordner in Teams angelegt.
Projektordner	siehe Projektakte

Stage-Gates	Der englische Begriff für Vorgehensmodelle
Vorgehensmodelle	Ein Vorgehensmodell ist eine (mehr oder weniger) genaue Anleitung, in welchen Schritten und durch welche Tätigkeiten das Projektziel erreicht werden kann.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Beschreibung
AAD	Azure Active Directory (enthält Kopie des AD + externe Gast-User ohne ID)
AD	Active Directory (on Premise, interne und externe ADAC-User mit ADAC-User-ID)
AG	Auftraggebende
AP	Arbeitspaket
CON	Bereich Controlling
CR	Change Request
d.h.	das heißt
EPM	Einzelprojektmanagement
FK	Führungskraft
GL	Geschäftsleitung
KVP	Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
KTM	Kernteam-Mitarbeitende
LA	Lenkungsausschuss
MA	Mitarbeitende
PL	Projektleitung
PM	Projektmanagement
PMA	Projektmitarbeitende
PMO	Projekt-Management-Office
POG	Planobergrenze
PPA	Projektportfolio-Ausschuss (PPM-Gremium der Versicherung)
PPF	Projektportfolio
PPM	Projektportfoliomanagement
PSP	Projektstrukturplan
RV	Ressourcenverantwortliche
SSO	Single Sign-On
tbd	to be defined – noch zu definieren
TPL	Teilprojektleitende
u.a.	unter anderem
wVw	weitere Vorgehensweise

Abbildungsverzeichnis:

ABBILDUNG 1: DOKUMENTENABLAGEN IN TEAMS FÜR AGILE PROJEKTE	17
ABBILDUNG 2: STATUS REPORT - SEITE 1	24
ABBILDUNG 3: STATUS REPORT - SEITE 2	24
ABBILDUNG 4: INDIVIDUELL KONFIGURIERBARE START-SEITE, IN DER U.A. RELEVANTE ENTSCHEIDUNGEN ODER OFFENE ARBEITSPAKETE ANGEZEIGT WERDEN	29
ABBILDUNG 5: DER PROJEKTAUFTRAG (HIER SEITE 1) IST EINE VEREINBARUNG ZWISCHEN AG UND PL UND STELLT EINE ERWEITERUNG DES PROJEKTSTECKBRIEFES DAR. ZUSÄTZLICH ZUM STECKBRIEF WERDEN INFORMATIONEN ZUR MEILENSTEIN-PLANUNG, ABGRENZUNGEN ODER DER PROJEKTSTRUKTUR ANGEZEIGT.	30
ABBILDUNG 6: MIT HILFE DES BALKENPLANS KÖNNEN DIE DAUER UND ABHÄNGIGKEITEN ZWISCHEN PHASEN UND AP'S DEFINIERT WERDEN. DIES HILFT VOR ALLEM BEI KOMPLEXEN NEUEN AUFGABEN. DAS ITERATIVE VORGEHENSMODELL KANN SO INDIVIDUELL ERGÄNZT WERDEN.	30
ABBILDUNG 7: ANZEIGE DES GEWÄHLTEN VORGEHENSMODELLS (STAGE-GATE) MIT DER MÖGLICHKEIT, LIEFERGEGENSTÄNDE UND MEILENSTEINE ZU HINTERLEGEN	31
ABBILDUNG 8: DIE MEILENSTEINE KÖNNEN INDIVIDUELL FÜR DIE ANZEIGE IM PROJEKTAUFTRAG UND IM STATUS REPORT AN- ODER ABGEWÄHLT WERDEN.	31
ABBILDUNG 9: UNVERZICHTBAR FÜR DIE PROJEKTSTEUERUNG IST DIE AUSGABEN- UND AUFWANDSPERANUNG. HIER EIN BEISPIEL DER NETTO-DARSTELLUNG IN DER KOSTENÜBERSICHT.	31
ABBILDUNG 10: DER STATUSBERICHT (AUSZUG SEITE 1) UNTERSTÜTZT UNS, DIE RICHTIGEN DINGE RICHTIG ZU TUN, SO DASS WIR DIE PROJEKTZIELE ERREICHEN.	32
ABBILDUNG 11: MIT UNTERSCHRIEBENEM ABSCHLUSSBERICHT (AUSZUG SEITE 4) WIRD DIE PROJEKTLEITUNG AUS DEM PROJEKTAUFTRAG ENTLASSEN UND DAS PROJEKT OFFIZIELL ABGESCHLOSSEN.	32

ANSPRECHPARTNER

Intern

Bereich	Name	Tel.	Funktion
IPF	Wolfgang Münch	-4407	Auftraggeber
IMM	Katrin Wegner	-5758	Autorin

Inhaltsverzeichnis

DOKUMENTEN INFORMATIONEN	3
INHALTSVERZEICHNIS	6
1 PROJEKTDEFINITIONEN	7
2 EINZELPROJEKTMANAGEMENT	8
2.1 PROJEKTMANAGEMENT-METHODEN (DOKUMENTENEINSATZ/-UMFANG)	8
2.2 PROJEKTORGANISATION	10
2.3 EINZELPROJEKTMANAGEMENT-PROZESSE	12
2.3.1 Überblick PM-Prozesse	12
2.3.1.1 Projektbeauftragungsprozess	13
2.3.1.1.1 Vorgehensmodelle (Stage-Gates)	14
2.3.1.2 Projektfinplanungs-Prozess	16
2.3.1.2.1 Zentrale Dokumentenablage	17
2.3.1.2.2 Projektplanung bei agilen Projekten	18
2.3.1.3 Projektsteuerungs-Prozess	20
2.3.1.3.1 Risikomanagement im Rahmen der Projektsteuerung	22
2.3.1.4 Projekt Status Report und Ampelsystem	23
2.3.1.5 Projektabschluss-Prozess	26
2.4 EINZELPROJEKTMANAGEMENT-HILFSMITTEL UND -CHECKLISTEN	28
2.5 EINZELPROJEKTMANAGEMENT-TOOLUNTERSTÜTZUNG UND PROJEKTABLAGE	29
3 PROJEKTPORTFOLIOMANAGEMENT (TBD)	33
4 RESSOURCENMANAGEMENT (TBD)	33
5 ANHANG	34
5.1 WISSENSWERTES ZUR ESKALATION	34
5.1.1 Grundvoraussetzungen für eine Eskalation	34
5.1.2 Eskalationsstufen	34
5.2 DETAILPROZESSE UND -ÜBERSICHTEN	35
5.2.1 Detailprozesse und -übersichten im Einzelprojektmanagement	35
5.2.1.1 Detailübersichten bezüglich der exakten Vorgehensweise hinsichtlich der Qualität, Zeit, Kosten und Ressourcen im Projekt	35
5.2.1.2 Detaillierte Beschreibung der Einzelprojektmanagement-Rollen und Gremien (1/4)	36
5.2.1.3 Detaillierte Prozessbeschreibung der Projekt- bzw. Maßnahmenbeauftragung	41
5.2.1.4 Detaillierte Prozessbeschreibung des Projektstart-Prozesses	42
5.2.1.5 Detaillierte Prozessbeschreibung der Projektsteuerungs-Prozesse	44
5.2.1.6 Detaillierte Prozessbeschreibung des Change Request-Prozesses	45
5.2.1.7 Detaillierte Prozessbeschreibung des Projektabschluss-Prozesses	47
5.2.1.8 Liefergegenstände beim sequenziellen Vorgehensmodell	48
5.2.1.9 Liefergegenstände beim iterativen Vorgehensmodell	49
5.2.1.10 Übersicht wichtiger Stichtage und der dazugehörigen Aktionen	50

1 Projektdefinitionen

Das ADAC PM-Handbuch beschreibt ausschließlich das Management von Projekten und Maßnahmen. Dazu ist eine Abgrenzung zu „Linien- bzw. Routinetätigkeiten“ notwendig. Es wird im ADAC zwischen **Maßnahme, Basisprojekt, Projekt und Programm bzw. Großprojekt** unterschieden.

Zur **Beurteilung der Komplexität** eines Vorhabens und zur Einstufung der Aufgabenstellung als Projekt, Maßnahme oder Programm dienen nachfolgende Kriterien. Dabei müssen mindestens 4 von 6 Kriterien zutreffen.

KRITERIEN	Basisprojekt	Projekt/ Vorstudien	Großprojekt/ Programm	Maßnahmen
1 Organisatorische Komplexität	ab 1 Ressort	ab 2 Ressorts	ab 4 Ressort oder über 2 Säulen	ab 1 Ressort
2 Inhaltliche Komplexität	MITTEL	MITTEL	HOCH	NIEDRIG-HOCH
3 Dauer, Anfang-Ende	max. 6 Monate	max. 12 Monate	max. 24 Monate	fortlaufend
4 Projektkosten (Vollkosten)	50 - 200 T€	200 - 1000 T€	> 1000 T€	> 50 T€
5 Personalaufwand (PT)	60 - 250	250 - 1300	> 1300	> 60
6 Risiko	GERING	HOCH	SEHR HOCH	GERING-HOCH
4 von 6 Kriterien müssen erfüllt sein				

Legende (angelehnt an IPMA-Definition für "Inhaltliche Komplexität")

- NIEDRIG:**
- Erfahrung mit ähnlichen Themen vorhanden
 - keine/ kaum Änderungen bei den Anforderungen zu erwarten
 - keine/ kaum Einflußnahme von Stakeholdern
 - Abhängigkeit von weniger als 2 Projekten
- MITTEL:**
- Erfahrung mit ähnlichen Themen vorhanden
 - Änderungen bei Anforderungen möglich
 - mittlere Einflußnahme von Stakeholdern
 - Abhängigkeit von mindestens 2 anderen
- HOCH:**
- vollkommen neuartige Themen
 - zum Teil kein Knowhow im Haus vorhanden
 - Änderungen bei Anforderungen sehr wahrscheinlich
 - starke Einflußnahme von Stakeholdern
 - Abhängigkeit von mindestens 4 Projekten oder 2 Großprojekten

Legende (angelehnt an IPMA-Definition für "Risiko")

- GERING:**
- wenige Risiken mit geringen Auswirkungen
 - Einschätzung aus PPM-Sicht
- HOCH:**
- viele Risiken mit hohen Auswirkungen innerhalb des Unternehmens und geringen Auswirkungen nach Außen
 - Einschätzung aus PPM-Sicht
- SEHR HOCH:**
- Risiken haben massive Auswirkungen nach innen und außen und können das Portfolio gefährden
 - Einschätzung aus PPM-Sicht

Hinweis:

- Die Projektklassifikation ist noch nicht final abgestimmt.
- Die Projektstufen orientieren sich gemäß der aktuellen PM-Richtlinie- und den Stufen der Projektleiterlaufbahn.

Es gilt standardmäßig folgende Kategorisierung von Projekten (alle Beträge verstehen sich ohne Umsatzsteuer):

Projekt der Stufe 1:	Projektkosten	ab 50 bis 200 T€
Projekt der Stufe 2:	Projektkosten	über 200 bis 1 Mio T€
Projekt der Stufe 3:	Projektkosten	über 1 Mio € bzw.

- Bitte beachten Sie die aktuellen Freigabe-Grenzen der PM-Richtlinie:

5.2 Freigabe von Projekten

Alle Projekte im ADAC unterliegen einer formellen Freigabe.

Die Freigabe erfolgt, auf der Basis des Projektauftrages und der unter 5.1. genannten Projektkosten, nach folgenden Wertgrenzen (alle Beträge verstehen sich ohne Umsatzsteuer):

Wertgrenzen	freigabeberechtigt
bis 200 T€	Leiter einer Geschäftseinheit (Ressortleiter)
über 200 T€	zuständiges Vorstandsmitglied der ADAC SE

Die Freigabe von Projekten ist immer durch den Auftraggeber zu erwirken.

Vor Projektfreigabe ist eine Qualitätssicherung des Projektauftrages durch das ADAC PMO oder ein Ressort-PMO durchzuführen.

2 Einzelprojektmanagement

2.1 Projektmanagement-Methoden (Dokumenteneinsatz/-umfang)

Die Methodenmatrix regelt den **Mindestumfang des Einsatzes an Projektmanagement (PM)-Methoden**. Die Abstimmung des Einsatzes der optionalen PM-Methoden erfolgt projektbezogen zwischen dem Projektauftraggeber und dem Projektleiter.

Die Methoden, die mit einem x gekennzeichnet sind, werden im Projektmanagement-Tool „Planisware“ unterstützt. Bei allen weiteren Methoden werden Vorlagen zur Verfügung gestellt, die in den FAQs per Link bzw. im Intranet unter „Projektmanagement@ADAC“ abgerufen werden können.

PM-METHODEN/ INSTRUMENTE	Basisprojekt	Projekt/ Vorstudien	Großprojekt/ Programm	Maßnahmen	durch Planisware unterstützt	Agile Projekte	Bemerkungen
Beispiel							
Projektantrag	M	M	M		x	x	Antrag kann als Projektsteckbrief oder als Projektauftrag gestellt werden siehe Angebotsvorlagen im AIS Portal
Beauftragung				M	-		
Projektstakeholderanalyse	K	K	M	K	-		
Projektstrukturplan (PSP) --> Balkenplan (Gantt) --> Meilensteinplan	M	M	M	K	x	Product Backlog, Sprint als AP	Stage Gate Prozess Gantt Planung im Tool nur bei AP mit Spezifikationsbedarf; ggf. in Jira oder DevOps abgelegt
AP-Spezifikationen	K	K	K	K	-	Sprint Backlog	
Ressourcenplan	M	M	M	M	x	x	
Budget-/Kostenplan	M	M	M	M	x	x	
Organigramm	K	M	M	K	x		ist im Projekt-Auftrag enthalten
Kommunikationsstrukturen	K	K	K	K	-		
Zuordnung AP- Verantwortliche	K	K	K	K	x		
Funktionendiagramm/ RACI Matrix	K	K	K	K	-		
Risikoanalyse	K	M	M	K	x	x	Empfehlung Risikoanalyse: mindestens 1x pro Quartal in Abhängigkeit der Gremien
Statusbericht	M	M	M		x	x	
Übergabeprotokoll*	M	M	M	M	x	x	* Teil des Abschlussberichts
Projektabschlussbericht	M	M	M	K	x	x	

M = MUSS
Empfehlung der Instrumente/Methoden,
die für die Sicherstellung der Projektziele
absolut erforderlich sind

K = KANN
Optionale Instrumente/Methoden, die
für die Sicherstellung der Projektziele
hilfreich sind

leeres Feld = nicht relevant

Darüber hinaus wurden für die Toolnutzung Kann- und Muss Felder in „Planisware“ definiert. Eine genaue Spezifizierung befindet sich in den jeweiligen [Quick Guides](#).

Hinweis:

Maßnahmen sind keine Projekte, da sie nicht den unter Kapitel 1 aufgestellten Kriterien der Projektdefinition entsprechen. Es handelt sich vielmehr um Vorhaben, die kein Start- und Enddatum haben, jedoch aufgrund der organisatorischen oder inhaltlichen Komplexität sowie aufgrund ihrer Budgetrelevanz im Projektportfolio aufgeführt werden. Zudem laufen auch (Weiterentwicklungs-) Maßnahmen nach einem ähnlichen oder identischen Abwicklungsschema wie andere Projekte ab, so dass die aktive Nutzung von PM-Methoden und -Instrumenten einen Mehrwert bietet.

Zusätzlich dazu durchlaufen diese Vorhaben ebenfalls das Ressourcenmanagement im Haus, die eine Ressourcenplanung voraussetzt. Aus den soeben genannten Gründen wurden Maßnahmen ebenfalls in die PM-Methodenliste aufgenommen.

Eine detaillierte Übersicht bezüglich der exakten Vorgehensweise hinsichtlich der Leistungen, Termine, Kosten und Ressourcen im Projekt, liefert die Übersichtsgrafik im Anhang (siehe Kap.5.2.1.1)

Abhängig von der Komplexität und der Ausgangssituation ist vor der Realisierung eines Vorhabens zu prüfen, ob eine Vorstudie durchzuführen ist. Die Kriterien, die in der unten dargestellten Abbildung aufgelistet sind, sollen bei der Entscheidung, ob eine Vorstudie durchzuführen ist, helfen. Die Vorstudie * ist dem Realisierungsprojekt vorgelagert und gemäß der Projektdefinition einzustufen (kann also sowohl Linientätigkeit, Maßnahme, Projekt, als auch ein Programm sein).

Nr.	KRITERIEN/ Informationen vorhanden?	Ja	Nein
1	Machbarkeitsanalyse **		
2	Projektplan inkl. Meilensteinplanung		
3	Anforderungsanalyse **		
4	Projektziele und -auftrag für die Umsetzung		
5	Business Case (inklusive Potenzialanalyse)		
6	Umsetzungsvarianten bekannt		
7	Grobschätzung **		

Vorschlag zur Einordnung, ab wann Vorstudien zwingend notwendig sind:

→ ≥ 3 Kriterien/ Informationen nicht erfüllt
= Vorstudie wird empfohlen

→ ≥ 5 Kriterien/ Informationen nicht erfüllt
= Vorstudie zwingend notwendig

* Vorstudien müssen nicht projektwürdig sein

** Erläuterungen zur Machbarkeitsanalyse und Grobschätzung siehe Abschnitt "Tipps & Tricks"

Tipps & Tricks:

- Die Erarbeitung der jeweiligen **PM-Methoden**, wie z.B. die Stakeholderanalyse, der Projektstruktur- sowie Meilenstein- und Ressourcenplan, sollten gemeinsam im Kernteam im Rahmen des Projektstarts erfolgen.
- Die **Projektstakeholder** sowie die Projektrisiken verändern sich im Projektverlauf und sollten daher regelmäßig (vor Beendigung der aktuellen Phase) in den Projektcontrollingsitzungen besprochen und ggf. angepasst werden.
- In der **Anforderungsanalyse** werden der Leistungsumfang und die Lieferobjekte definiert, die notwendig sind, um die Projektziele zu erreichen. Sie beinhalten folgende Schritte:
 - Sammeln der Anforderungen (überwiegend im Fachbereich)
 - Dokumentieren durch Vorhaben (aus der Sicht des Fachbereichs)

Weitere Informationen zu IT-Dokumenten für IT-Projekte finden Sie im AIS Portal im ALM-Prozess.

- Die **Machbarkeitsstudie** überprüft mögliche Lösungsansätze für ein Projekt hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit. Die wirtschaftliche Beurteilung, ob die Projektergebnisse den erhofften Nutzen für den Auftraggeber bringen, ist hingegen nicht typischer Inhalt der Machbarkeitsstudie. Dies zu klären ist Aufgabe einer Kosten-Nutzen-Analyse bei der Erstellung des Business Cases. Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie sind:
 - Analysen und Bewertungen der betrachteten Lösungswege
 - Entscheidungsmöglichkeiten mit dokumentierten Chancen und Risiken
 - Empfehlung für eine Entscheidung

- Die **Grobschätzung** ist die Abklärung einer projektwürdigen Idee hinsichtlich der benötigten Mittel, wie z.B. Ressourcen (vor allem Engpass-Ressourcen), finanzielle Mittel, Folgekosten, Betriebskosten etc. Die Informationen fließen anschließend in den Projektsteckbrief ein.

Bitte beachten Sie:

- die richtigen Leute in die Schätzung zu involvieren (Erfahrung, direkt beteiligt).
- dass Unsicherheiten nicht durch Puffer, sondern durch adäquate Risikoeinschätzungen ausgedrückt werden (realistische Planung)
- wenn möglich, Erfahrungswerte und Datenmaterial aus vorherigen Projekten oder anderen Quellen heranziehen (falls diese verfügbar sind)

2.2 Projektorganisation

Ein **Projektorganigramm** ist ein Instrument zur grafischen Darstellung der Projektorganisation. Im Projektorganigramm werden die Projektrollenträger sowie deren Beziehungen zueinander dargestellt.

Je nach Komplexität des Projektes werden in einem Organigramm nicht nur Projektauftraggeber, Projektleiter (Teilprojektleiter) und Kernteammitglieder, sondern auch Projektlenkungsausschuss, Projektmitarbeiter und Projektmanagement-Office dargestellt.

	Rollen	Gremien
Projekt- management (temporäre Organisationsform)	Sponsor	
	Auftraggeber	Lenkungsausschuss
	Projektleiter	
	Programm-Manager	
	Lösungsarchitekt <i>(bei Projekten mit IT-Impact)</i>	
	Teilprojektleiter	
	Projektmanagement-Office	
	Kernteam-Mitarbeiter	
	Projektmitarbeiter	
	<i>Product-Owner</i> <i>(bei agilem Projektmanagement)</i>	
	<i>Scrum-Master</i> <i>(bei agilem Projektmanagement)</i>	
Projektportfolio- management (permanente Organisationsform)	Projektportfoliomanager	ggf. Zusammenarbeitsausschuss e.V./ SE/ Stiftung
	Ressortleiter (Budgetverantwortlicher)	dezentrale PPM Boards

Eine detaillierte Beschreibung der genannten Rollen und Gremien finden Sie im Anhang unter Kapitel 5.2.1.2: *Detaillierte Beschreibung der Einzelprojektmanagement-Rollen und Gremien*

Projektkommunikationsstrukturen

Neben den Projektrollen sind projektspezifisch die Projektkommunikationsstrukturen zu vereinbaren. Diese regeln die Art und Häufigkeit von regelmäßigen Meetings in Projekten, sowie die Teilnehmer, die Inhalte und die Dauer. Die Planung der Kommunikationsstrukturen definiert die regelmäßige Kommunikation im Projekt, stärkt die effiziente und zielgruppenspezifische Zusammenarbeit, stellt den Informationsfluss über alle Beteiligten hinweg sicher und ist damit ein Erfolgsfaktor für Ihr Projekt. Eine Vorlage wie Kommunikationsstrukturen geplant werden können, finden Sie im Intranet auf der Sharepoint-Seite „Projektmanagement@ADAC“.

Tipps & Tricks:

Eine vorgelagerte Stakeholderanalyse hilft beim Verständnis darüber, wer relevante Stakeholder im Projekt sind und welche Bedürfnisse sie haben. Zudem können aus der Analyse u.a. Erkenntnisse zur zielgruppenspezifischen „Ansprache“ der Stakeholder gewonnen werden. Die Farbenlehre nach C.G. Jung kann bei der Einschätzung der passenden Kommunikationsform unterstützen.


Wenn man den vierstufigen Gruppenprozess „forming – storming – norming – performing“ zu Grunde legt, werden erst in der dritten Phase „norming“ Projekt-Spielregeln allgemein anerkannt. Für zielführende und effiziente Projektarbeit ist dies zu spät.

Es empfiehlt sich daher, bereits bei der ersten Teamsitzung eine kurze Liste von „Spielregeln“ mit allen Teammitgliedern verbindlich zu vereinbaren. Durch diese Formalisierung verliert der Gruppenprozess zwar einerseits an Intensität, andererseits kann dann sofort mit dem „Spiel“ begonnen werden.


2.3 Einzelprojektmanagement-Prozesse

2.3.1 Überblick PM-Prozesse

Neben dem spezifischen Einsatz von PM-Methoden, werden durch die PM-Prozesse die Abläufe im Projektmanagement geregelt. Das Einzelprojektmanagement (farblich grau im unteren Teil der Abbildung hervorgehoben) beinhaltet die PM-Prozesse, die zur erfolgreichen Durchführung eines singulären Projektes notwendig sind. Im Detail werden darunter der Projektstart (Projektplanung) und das regelmäßige Projektcontrolling wie auch der Projektabschluss verstanden. Darüber hinaus zählen die kontinuierlichen Prozesse Projektkoordination und Projektmarketing zum Einzelprojektmanagement. Einen Sonderfall nehmen der Projektkrisen-Prozess sowie der Ressourcenmanagement-Prozess ein. Der Projektkrisen-Prozess wird zwar nicht geplant, sollte aber bei Bedarf durchlaufen werden. Der Ressourcenmanagement-Prozess wird aktuell dezentral im Einzelprojektmanagement gesteuert, ist jedoch dennoch auch ein Teil des Projektportfoliomanagements (siehe Kapitel 4 *Ressourcenmanagement*).

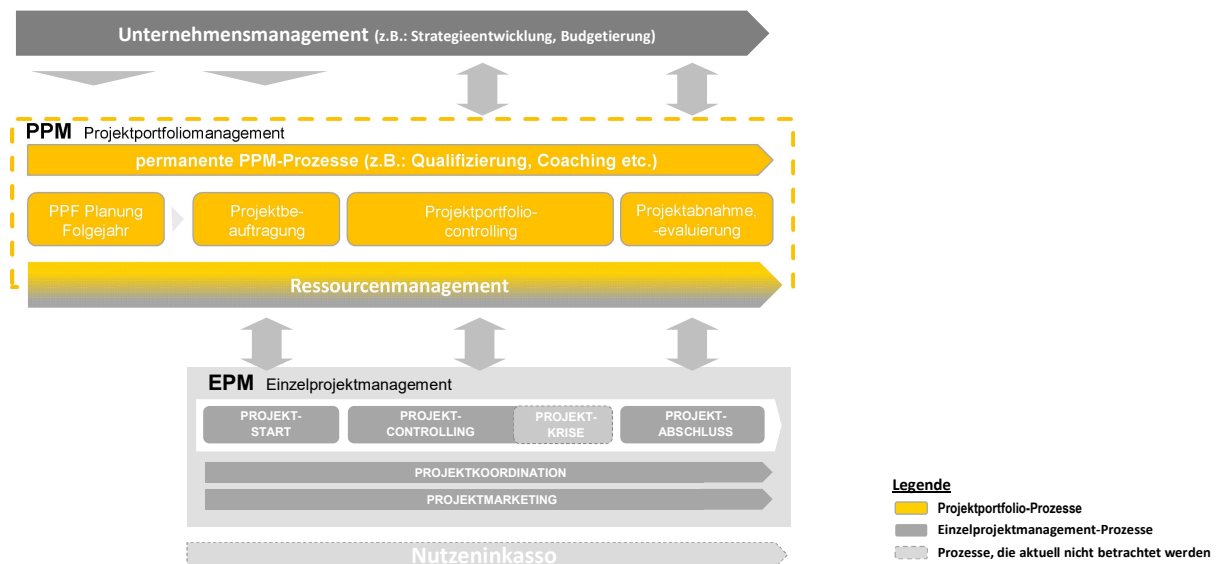


2.3.1 Projektbeauftragungsprozess

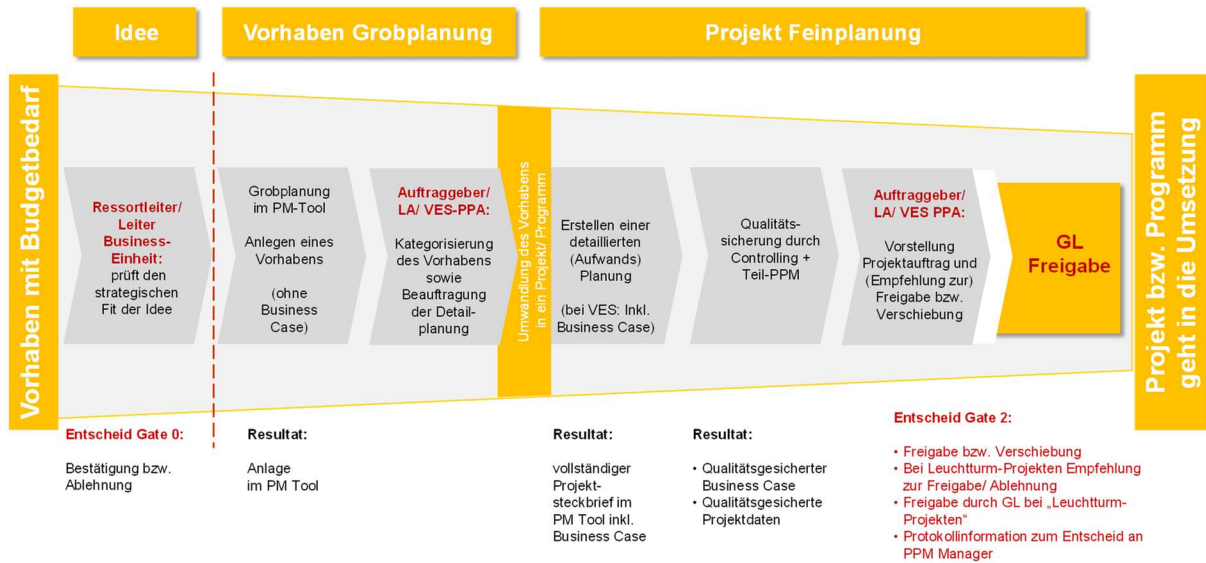

Alle Projekte und Maßnahmen müssen den Projektbeauftragungsprozess durchlaufen. Er zeigt die Schritte auf, die der Antragsteller bei einer Überführung eines Vorhabens in ein Projekt oder eine Maßnahme zu durchlaufen hat. Der Prozess ist in die unten dargestellten Entscheidungsstufen gegliedert:

1. **Entscheid Gate 0:** Bestätigung der Relevanz des Vorhabens, d.h. das geplante Vorhaben soll weiter ausgearbeitet werden (Grobplanung).
2. **Entscheid Gate 1:** Grundsätzlicher Entscheid, ob das Vorhaben ins Projektportfolio und damit im PM-Tool aufgenommen werden muss. Zudem wird entschieden, welche Projektklassifizierung vorliegt und ob in einer Vorstudie weitere entscheidungsrelevanten Punkte erarbeitet und zur Entscheidung in die Auftraggeber Sitzung, dem Lenkungsausschuss bzw. der Geschäftsleitung eingebracht werden sollen. D.h. das Vorhaben wird zum Projekt bzw. zur Maßnahme und kann im PM-Tool feingeplant werden.
3. **Entscheid Gate 2:** Die Feinplanung des Projekts bzw. der Maßnahme wird abgenommen und das Projekt wird final in das Projektportfolio aufgenommen, d.h. das Projekt kann innerhalb der definierten Planobergrenzen (Aufwand) umgesetzt werden.

Im Rahmen des Projektbeauftragungsprozesses werden entscheidende Weichenstellungen für das Projekt vorgenommen. Nicht nur Ziele werden definiert, sondern auch gemeinsam mit dem AG entschieden, welche Projektklassifikation das Vorhaben hat oder wie der Durchführungsweg aussieht (Auswahl des Vorgehensmodells: sequenziell (klassisch/Wasserfallmodell) oder iterativ (agil/hybrid)).

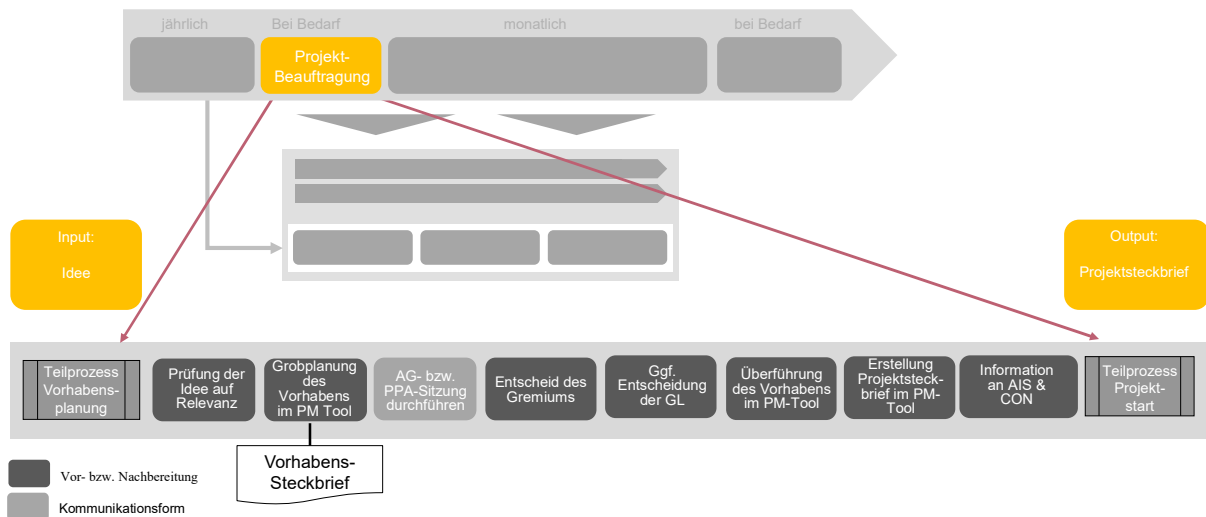


2.3.1.1

Vorgehensmodelle (Stage-Gates)

Im Kapitel 1 „Projektdefinitionen“ sind die wesentlichen Projekt- und Maßnahmen-Klassifizierungen dargestellt. Sie zeichnen sich u.a. durch unterschiedliche inhaltliche, wie auch organisatorische Komplexität aus. Dieser Komplexität möchten wir in unseren Vorgehensmodellen Rechnung tragen. Daher wurden für die jeweiligen Projekt- und Maßnahmenklassen individuelle Stage-Gate-Modelle erstellt. Sie finden sich im PM-Tool wieder und können dort ausgewählt werden.

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über alle relevanten Vorgehensmodelle:

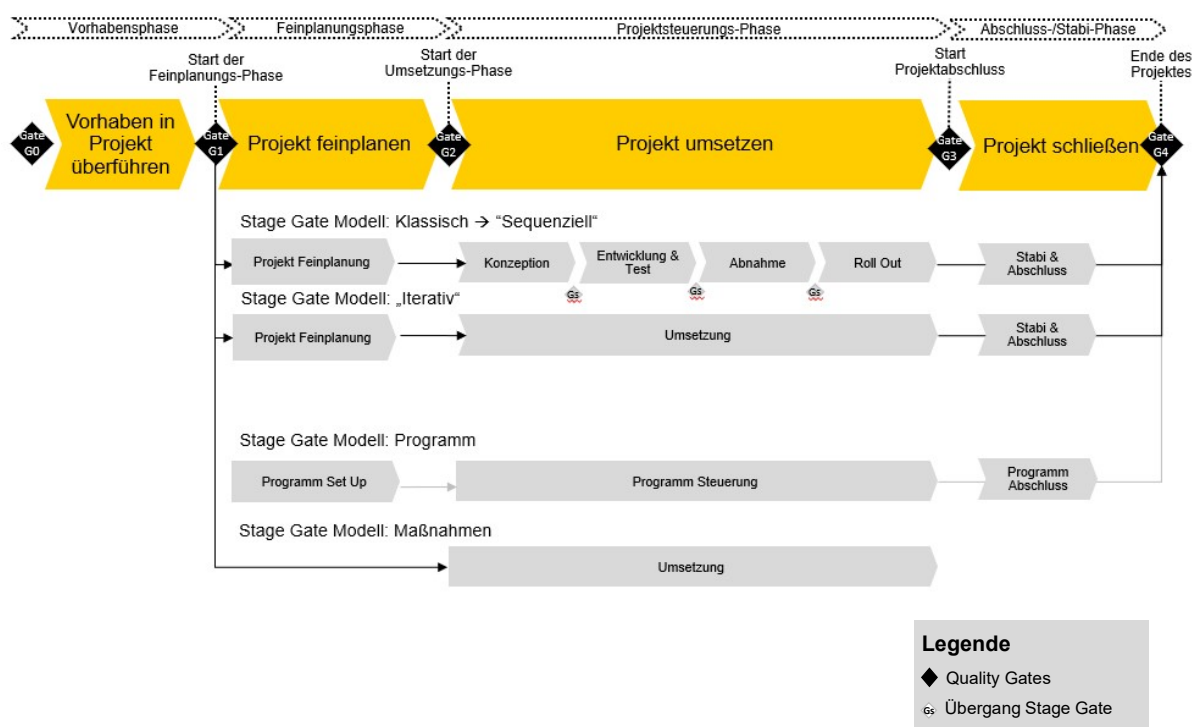

Erläuterungen zu den jeweiligen Vorgehensmodellen:

Sequenzielles Vorgehensmodell:

- geeignet für alle Projekte, die einen klassischen „Wasserfall“-Projektverlauf als Durchführungsweg wählen
- ein lineares Vorgehensmodell, das durch fest definierte Projektphasen, die jeweils einmal durchlaufen werden, charakterisiert ist
- sequenzielles Vorgehen eignet sich für Projekte, in denen die Anforderungen von Beginn an klar und vollständig sind und in denen wenige Änderungen erwartet werden (z.B. bei regulatorischen Projekten)

Iteratives Vorgehensmodell:

- geeignet für alle Projekte, die sich für einen agilen oder hybriden Durchführungsweg entschieden haben
- ein iteratives Vorgehen beschreibt einen Vorgang, bei dem sich in mehreren Umsetzungsschleifen schrittweise einer Lösung genähert wird.
- der iterative Ansatz bietet Möglichkeiten, im Rahmen des Projektablaufes auf Änderungen der Anforderungen flexibel zu reagieren und ist für Projekte mit unklaren oder anspruchsvollen Anforderungen geeignet (wie. z.B. Einführung eines neuen Produkts bzw. einer neuartigen Dienstleistung)

Hinweis:


- Die Quality Gates werden von der Projektleitung in Abstimmung mit den Auftraggebern frei gegeben. Die Freigabe erfolgt außerhalb vom PM-Tool und muss dokumentiert werden. Der Übergang kann nur erfolgen, wenn vorab definierte Dokumente und Liefergegenstände zur Verfügung gestellt werden.
- Die Stage-Gates dienen der Strukturierung des Projektlebenszyklus und können vom Projektleiter frei gegeben werden.

Eine detaillierte Beschreibung, welche Dokumente für das jeweilige Quality Gate relevant sind, kann dem Kapitel 5.1.2.8 *Liefergegenstände beim sequenziellen Vorgehensmodell* entnommen werden.

2.3.2 Projektfineinplanungs-Prozess

Im Projektstart- bzw. Projektfineinplanungs-Prozess erfolgt die Ersterstellung der Projektplanung. Der Projektstart-Prozess wird ausgelöst durch den Projektantrag in Form des Projektsteckbriefs zwischen Projektauftraggeber und Projektleitung und ist abgeschlossen, sobald die Projekttakte inklusive aller notwendigen Projektpläne erstellt, vollständig dokumentiert und abgestimmt ist. Die Projekttakte stellt eine elektronische Projektdokumentation dar, die eine qualifizierte und strukturierte Zusammenstellung aller relevanten Projektmanagementpläne enthält (siehe Abschnitt „Glossar“ im Kapitel „Dokumenten Informationen“)

Die Vorgehensweise im Projektstart-Prozess hängt von der Komplexität und des Umfangs des Projektes ab.

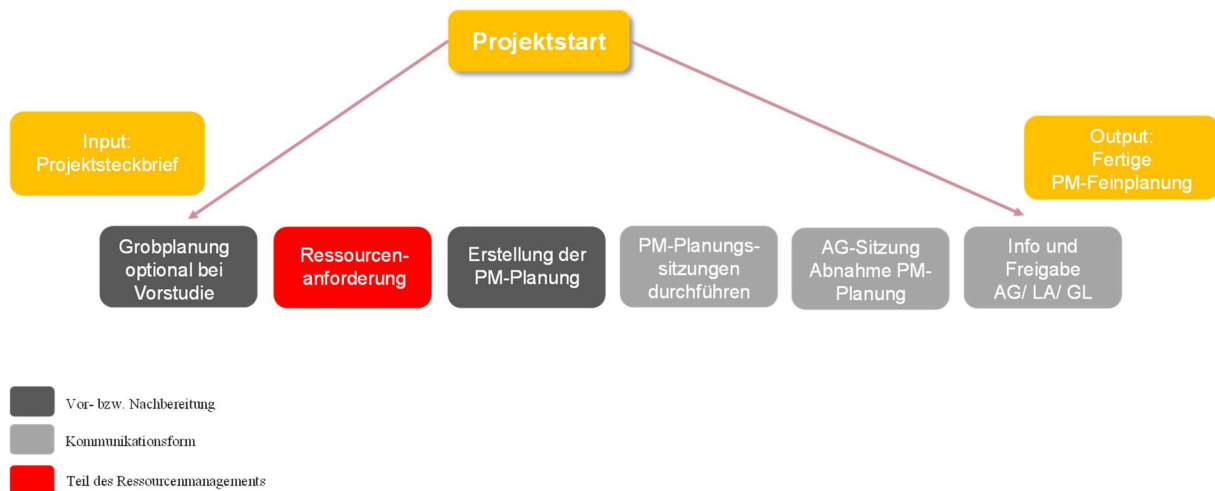

Entscheidend bei der Gestaltung des Projektstart-Prozesses ist es, eine möglichst vollständige und detaillierte Projektplanung und Risikoanalyse zu erstellen, diese gemeinsam mit dem Projektteam zu erarbeiten und zu verabschieden, die relevanten Projektstakeholder mit einzubinden und trotzdem einen effizienten und ressourcenschonenden Projektstart-Prozess zu organisieren. Der Methodeneinsatz soll laut PM-Methodenliste erfolgen.

Eine detaillierte Beschreibung des Projektstart-Prozesses kann dem Funktionendiagramm im Kapitel 5.2.1.4 *Detaillierte Prozessbeschreibung des Projektstart-Prozesses* entnommen werden.

Checkliste zum Projektstart:

1. Basisdaten des Projektes aus dem Vorhabenssteckbrief überprüfen und ggf. anpassen
2. Projektgegenstand aus dem Vorhabenssteckbrief überprüfen und ggf. anpassen
3. Anlegen des Projektteams
4. Pflege von Risiken und deren Maßnahmen
5. Arbeitspakete & Berichtsmeilensteine / Meilensteine definieren
6. Ressourcenanalyse
7. Ressourcenanforderung
8. Externe Kostenplanung (falls benötigt)
9. Projekt-Fineinplanung genehmigen



Tipps & Tricks:

- Stimmen Sie Ihre Ressourcenanforderungen unbedingt mit den jeweiligen Linienverantwortlichen ab.
- Erstellen Sie Ihre Planung gemäß der PM-Methodenliste, überlegen Sie sich als Projektleitung, welche PM-Methoden Sie benötigen und welche Sie mit gutem Gewissen in diesem Projekt weglassen bzw. vernachlässigen können.
- Erstellen Sie Ihre Projektplanung mit ihrem Projektteam gemeinsam, erstens weil die Planung vollständiger sein wird und zweitens, weil das Team auch dahintersteht
- Stimmen Sie unbedingt die fertige Projektplanung mit ihrem Auftraggeber ab
- Nutzen Sie für die Dokumentenablage die in Teams vorgefertigten Strukturen

2.3.2.1

Zentrale Dokumentenablage

Eine zentrale Dokumentenablage in Projekten erfüllt eine wichtige Funktion: Sie dient als Gedächtniscontainer für den Projektverlauf, getroffene Entscheidungen und inhaltliche Änderungen. Durch eine korrekte, vollständige und übersichtlich erstellte Projektdokumentation können sich Beteiligte zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf verschiedene Bereiche des Projekts konzentrieren, ohne den gesamten Projektstand im Detail im Kopf haben zu müssen. Offene Fragen, was wie wann und von wem entschieden oder umgesetzt wurde, können rasch geklärt werden. Eine gut geführte Projektdokumentation beschleunigt den Fortschritt des Projekts und minimiert Risiken. Sie umfasst Protokolle, Berichte, Konzepte, Anforderungen und vieles mehr.

Sobald im PM-Tool ein Vorhaben in ein Projekt – oder eine Maßnahme – überführt wird (Überschreitung von Gate 0 auf Gate 1), besteht die Möglichkeit für das Projekt eine Dokumentenablage in Microsoft Teams (MS Teams) anzulegen.

Die folgende Abbildung zeigt eine Dokumentenablage mit einer Ordnerstruktur gemäß des iterativen Vorgehensmodells:


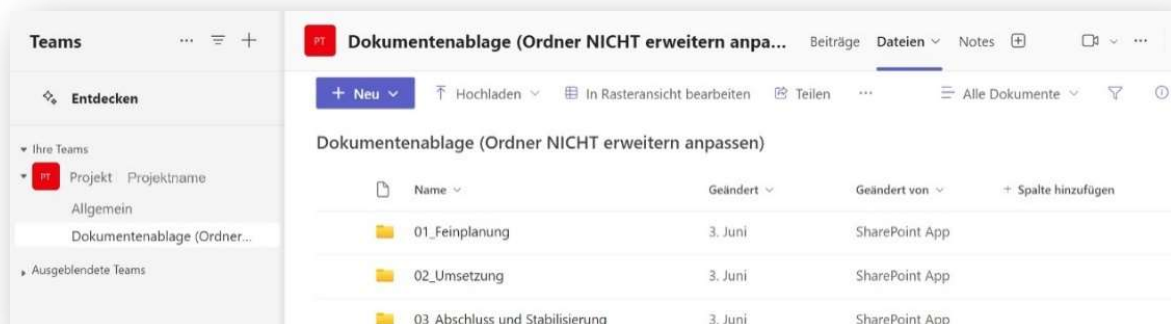


Abbildung 1: Dokumentenablage in Teams für agile Projekte

In den Quick Guides zum PM-Tool, die auf dem Sharepoint „[Projektmanagement@ADAC](#)“ abgelegt sind, findet sich u.a. eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Erstellung einer Dokumentenablage für die verschiedenen Vorgehensmodelle. Die folgende Prozessdarstellung verdeutlicht das Vorgehen der Dokumentenablage:

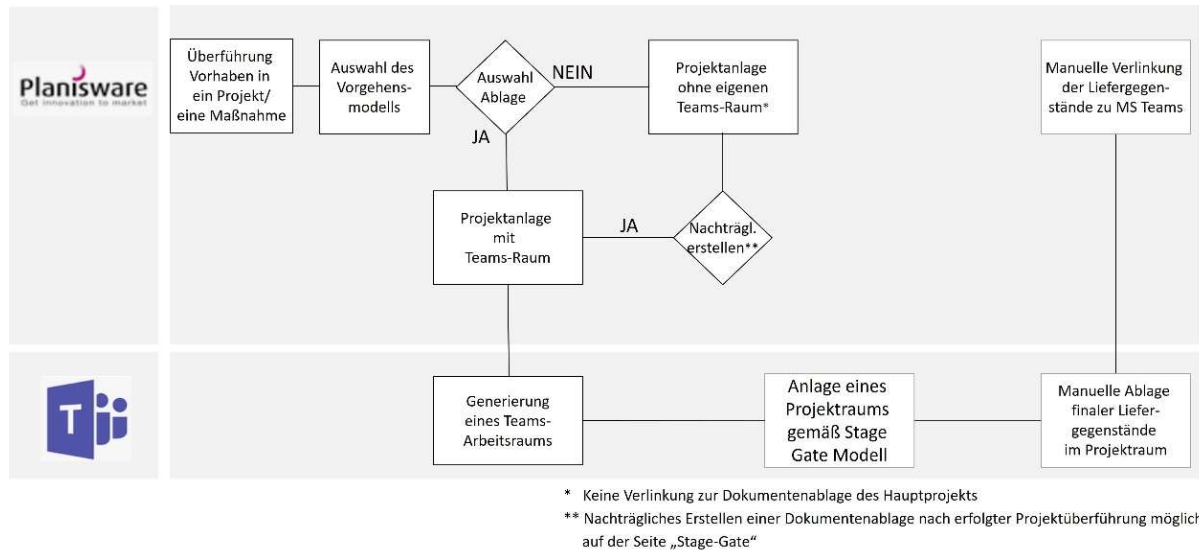

Hinweise:

- Eine Dokumentenablage für Ihr Projekt ist aus Revisionsgründen Pflicht
- Die Wahl des Vorgehensmodells bestimmt die Ordnerstruktur in Ihrer Dokumentenablage.
- Die Ordnerstruktur ist fest vorgegeben und darf nicht angepasst oder geändert werden. Wird die Ordnerstruktur in MS Teams verändert, findet keine automatische Verlinkung zum PM-Tool statt.
- Eine Dokumentenablage kann auch nach einer Projektüberführung im PM-Tool auf der Seite „Stage Gates“ (Anleitung siehe Quick Guides) vorgenommen werden.
- Das Vorgehensmodell kann im Nachgang nicht geändert werden

2.3.2.2

Projektplanung bei agilen Projekten

Bei agilen oder hybrid arbeitenden Projekten sind in der Regel der Endtermin und das genehmigte Budget bekannt. Die zu erreichenden Inhalte und Liefergegenstände werden zusammen mit dem Product Owner und dem agilen Team im Sprint Planning definiert.

Bei einem agilen Projektplan muss unbedingt berücksichtigt werden, was genau der Auftraggeber möchte. Mit anderen Worten: Der Plan muss genau angeben, wie und wann wir Wert für unseren Auftraggeber bzw. Stakeholder schöpfen. Daher ist es nicht notwendig im Balkenplan einzelne Aktivitäten zu planen. Es genügt, sich auf die Ergebnisse (Meilensteine) zu fokussieren.

Darstellung anhand eines Beispiels:

Backlog-Planung in Jira, Confluence und Co.



Projekt-Planung im PM-Tool

	Name	Beschreibung	Geplanter Start	Geplantes Ende
✓	Agiles Projekt	Einführung eines Warenwirtschaft...	02.01.2024	30.12.2024
✓	Feinplanung	Feinplanung	02.01.2024	27.02.2024
✓	Planung der Umsetzungsphase	Planung der Ergebnisse für 2024	28.02.2024	
✓	Weiter zu Umsetzung	Weiter zu Umsetzung	02.01.2024	
✓	Umsetzung	Umsetzung	02.01.2024	29.09.2024
✓	Epic MCE 938	Epic MCE 938	30.04.2024	
✓	Epic Vita Schnittstelle	Vita Schnittstelle umgesetzt	31.05.2024	
✓	Epic Solaris Anforderungen	Solaris Anforderungen umgesetzt	30.09.2024	
✓	Weiter zu Stabilisierung	Weiter zu Stabilisierung	02.01.2024	
✓	Stabi & Abschluss	Stabi & Abschluss	02.12.2024	19.12.2024
✓	Bugfixing abgeschlossen	Bugfixing abgeschlossen	02.12.2024	
✓	Projektdokumentation aktualisie...	Projektdokumentation aktualisier...	20.12.2024	
✓	G3:Ende	Ende	31.12.2024	


Bitte beachten Sie:

Es muss in agilen Projekten jederzeit eine nachvollziehbare Zuordnung von Teilaufgaben zu Meilensteinen oder Stage Gates möglich sein.

2.3.3 Projektsteuerungs-Prozess

Der Projektsteuerungs-Prozess ist ein repetitiver (zyklischer) PM-Prozess. Die Häufigkeit der Projektsteuerung ist durch das Projektportfoliocontrolling vorgegeben. Es sollte monatlich stattfinden und spiegelt sich in den Projektkommunikationsstrukturen wider.


Wesentlich bei der Projektsteuerung ist, dass dieser Prozess nicht als alleinige Aufgabe des Projektleiters, sondern auch als Aufgabe des Projektteams sowie des Projektauftraggebers anzusehen ist. Daraus resultiert, dass Projektsteuerung nur im Rahmen einer gemeinsamen Projektsteuerungs-Sitzung durchgeführt werden sollte.

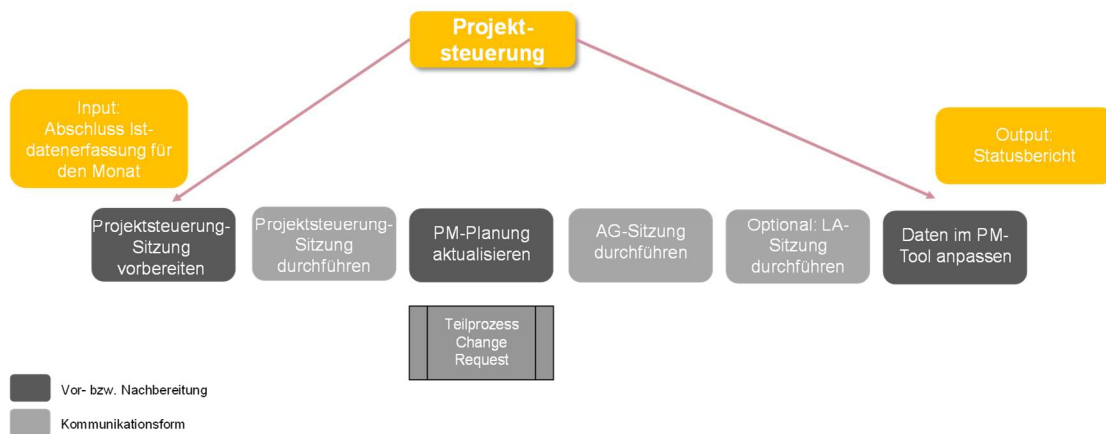

Der Projektstatus und die Zusammenfassung der aktuellen PM-Pläne und Risikoanalysen werden in einem monatlichen (Projekt)Status Report festgehalten. Er spiegelt den aktuellen Status des Projektes zum Stichtag der Steuerungs-Sitzung wider. Dieser Bericht dient u.a. als Gesprächsgrundlage für die Abstimmung mit dem Auftraggeber bzw. dem Lenkungsausschuss und fließt in den Projektportfoliobericht ein.


Eine detaillierte Beschreibung des Projektsteuerungs-Prozesses kann dem Funktionendiagramm im Kapitel 5.2.1.5 *Detaillierte Prozessbeschreibung der Projektsteuerungs-Prozesse* entnommen werden:

Wurde bei der Projektsteuerungs-Sitzung bzw. bei der Aktualisierung der Projektpläne festgestellt, dass ein oder mehrere Ziele des Projektauftrags (Zeit, Qualität oder Kosten) nicht erreicht werden können, muss ein Change Request gestellt werden. Im folgenden Schaubild wird der Change Request-Prozess für das Einzelprojektmanagement dargestellt:

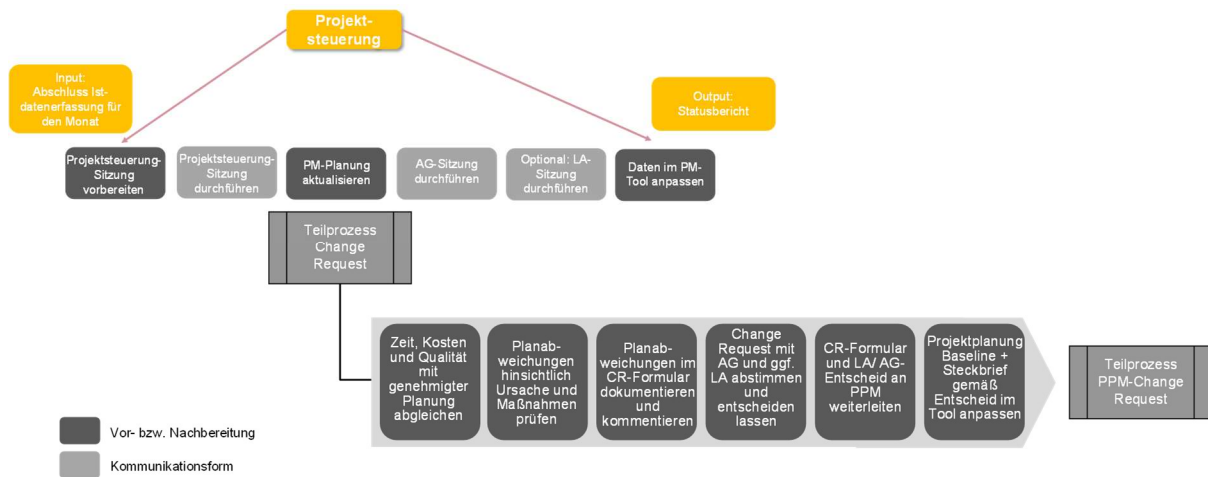

Stichtagsprozess und deren Regeln

Im folgenden Stichtagsprozess ist festgehalten, bis wann, welche Abstimmungen abgeschlossen sein sollen, um die damit verbundenen Berichte fristgerecht erstellen zu können:

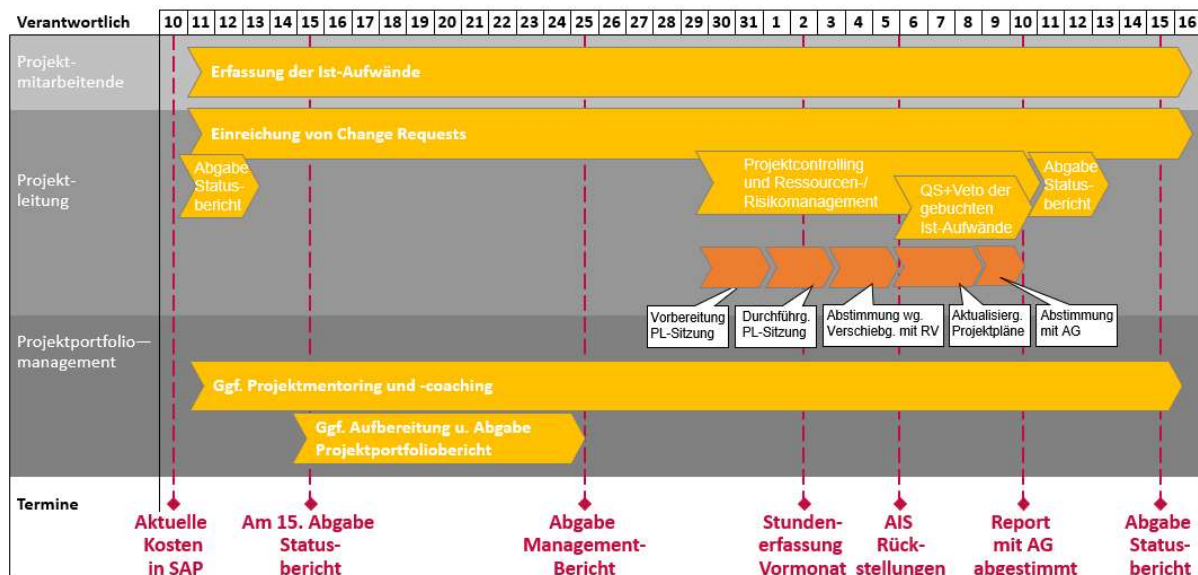

Für den Stichtagsprozess gelten folgende Regeln:



1. Die Projektplanung erfolgt für die komplette Projektlaufzeit und wird regelmäßig 1x im Monat zur Projektsteuerungs-Sitzung für mindestens die kommenden 3 Monate auf Phasen-Ebene aktualisiert
2. Steht eine der Projektampeln auf "rot", ist die anschließende Einreichung eines Change Requests innerhalb der nächsten Berichtsperiode verpflichtend
3. Bei einem Change Request muss die Überplanung des Projektes bis spätestens zum Folgemonat abgeschlossen sein


Mit Einführung des neuen PM-Tools „Planisware“ wird der Stichtagsprozess systemseitig unterstützt, so dass die Projektbeteiligten wichtige Abgabefristen nicht aus den Augen verlieren. Eine Übersicht, wann die Projektbeteiligten, in welcher Form erinnert und benachrichtigt werden, findet sich im Kapitel 5.2.1.10 *Übersicht wichtiger Stichtage und der dazugehörigen Aktionen*.

2.3.3.1 Projektsteuerung

Risikomanagement im Rahmen der


Der Risikomanagement-Prozess ist ein rollierender Prozess der regelmäßig durchlaufen werden muss. Spätestens beim Phasenübergang zur nächsten Projektphase muss die Projektleitung bestätigen, dass die Risiken und Risiko-Maßnahmen aktualisiert wurden.

In der folgenden Darstellung werden die einzelnen Prozess-Schritte sowie die dafür relevanten Fragestellungen im Risikomanagement veranschaulicht:

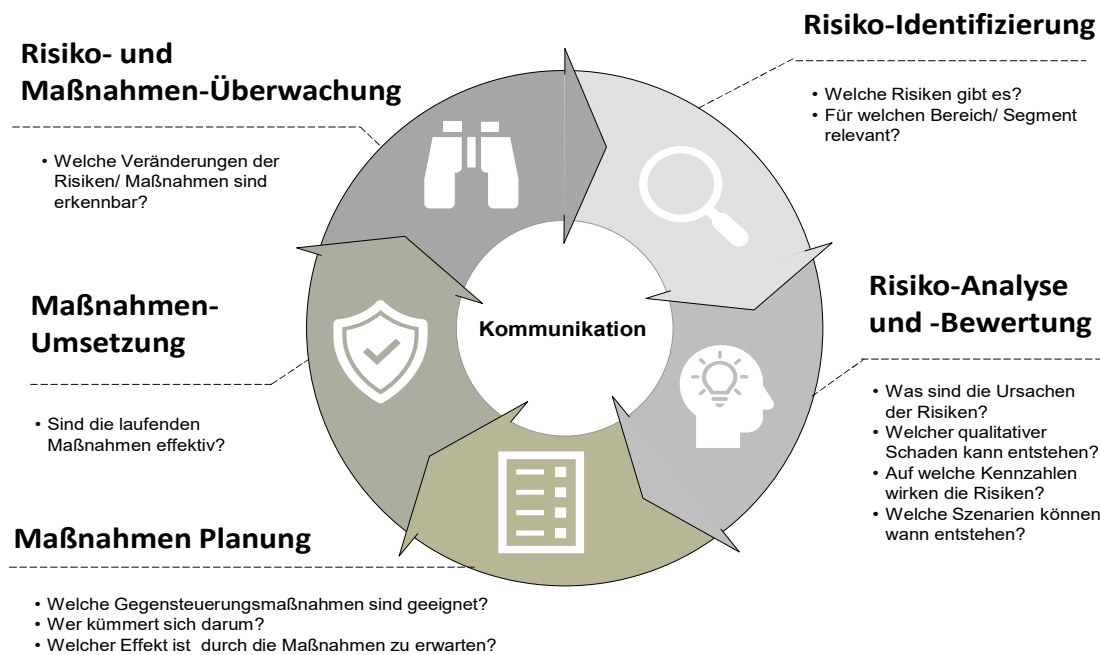

Die Anlage und Pflege der Risiken und Maßnahmen kann komplett im PM-Tool vorgenommen werden. Die Dokumentation der Risikohöhe bei Eintritt des Risikos sowie der Kosten für die Risiko-Maßnahmen erfolgt freiwillig.

Es gibt folgende Kategorien der Risikobewältigungsstrategien:

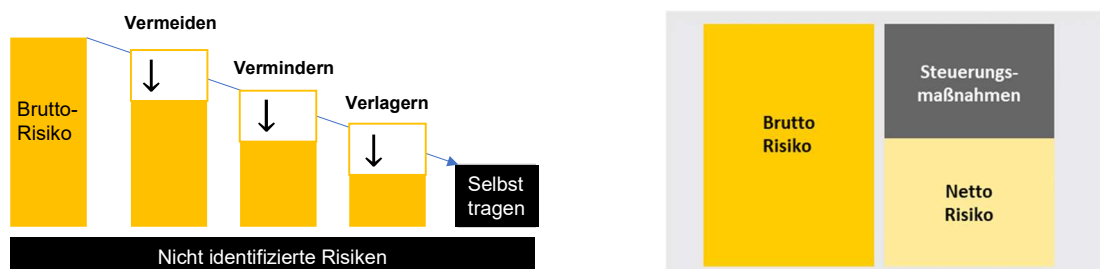

Bei der Quantifizierung der Eintrittswahrscheinlichkeit gibt es folgende Risikoklassen:

Eintrittswahrscheinlichkeit			
Kategorie	Klasse	Beschreibung	Quantifizierung
Sehr wahrscheinlich	4	Es ist davon auszugehen, dass das Risiko im Betrachtungszeitraum eintritt.	≥ 75 %
Wahrscheinlich	3	Es ist wahrscheinlich, dass das Risiko im Betrachtungszeitraum eintritt.	> 50 % – 75 %
Möglich	2	Das Risiko kann im Betrachtungszeitraum eintreten.	> 25 % – 50 %
Unwahrscheinlich	1	Es ist unwahrscheinlich, dass das Risiko im Betrachtungszeitraum eintritt.	≤ 25 %

Bitte bei der Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit die Quantifizierung pro Klasse berücksichtigen.

Checkliste zur Projektsteuerung:

1. Aktualisierung von Risiken und Maßnahmen
2. Aktualisierung des Terminplanes/Balkendiagramms
3. Aktualisierung der Ausgaben und Aufwände
4. Zeiterfassung
5. Projektstatus
 - a. Pflege Projektstatus/Status Report
 - b. Dokumente
 - c. Berichtseingabe
 - d. Change Request (CR)

Tipps & Tricks:


- Führen Sie als Projektleitung immer eine Projektsteuerungs-Sitzung mit Ihrem Kernteam durch, nicht nur Sie als Projektleitung benötigen einen Überblick über den Projektstatus, auch Ihre Kernteam-Mitglieder (u.a. Teilprojektleitung)
- Stimmen Sie den Projektstatus immer mit Ihrem Projektauftraggeber ab und bereiten Sie für ihn die notwendigen Entscheidungen und Steuerungsmaßnahmen vor.
- Denken Sie immer daran: Ihr Projektstatus und Ihre aktuellen Projektpläne sind die Basis für das Projektportfoliocontrolling und die übergeordnete Projektsteuerung.
- Nutzen Sie die Möglichkeit den Projektstatus auch mit den wichtigsten Stakeholdern (=Personen oder Gruppe, die ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines Prozesses oder Projektes hat) im Rahmen der Lenkungsausschuss-Sitzung abzustimmen.
- Vermeiden Sie bei der Quantifizierung der Eintrittswahrscheinlichkeit Scheingenaugkeiten und verwenden Sie die Prozentsätze der jeweiligen Risikoklasse.

2.3.4 Projekt Status Report und Ampelsystem

Die Projektakte wird im Rahmen der Projektsteuerung regelmäßig aktualisiert. Das bedeutet, dass zuerst die PM-Pläne in der Projektsteuerungs-Sitzung angepasst werden und anschließend in der digitalen Projektakte entsprechend überarbeitet und abgespeichert werden. Somit ist sichergestellt, dass es nach jeder Projektsteuerungs-Sitzung eine aktuelle Version der Projektakte gibt.

Die Projektleitung kann mithilfe der aktualisierten Projektpläne, der Risikoanalysen und des Status Reports dem Projektauftraggeber in der Projektauftraggeber-Sitzung den Status des Projektes darstellen und offene Punkte oder Entscheidungen strukturiert besprechen. Der Statusbericht wird entweder am Ende der Projektsteuerungs-Sitzung (als Zusammenfassung) oder direkt nach der Projektsteuerungs-Sitzung von der Projektleitung erstellt. Der Statusbericht ist keine Alternative zur Aktualisierung der Projektplanung, sondern ist vielmehr eine Ergänzung. Ziel ist es, einen Überblick über den aktuellen Stand zu geben und vereinbarte Steuerungsmaßnahmen sowie anstehende Entscheidungen darzustellen.

Nach erfolgter Datenaktualisierung im PM-Tool kann im Reiter „Status Report“ die automatische Generierung des Dokuments „Statusbericht“ angestoßen werden (siehe folgende Abbildungen):

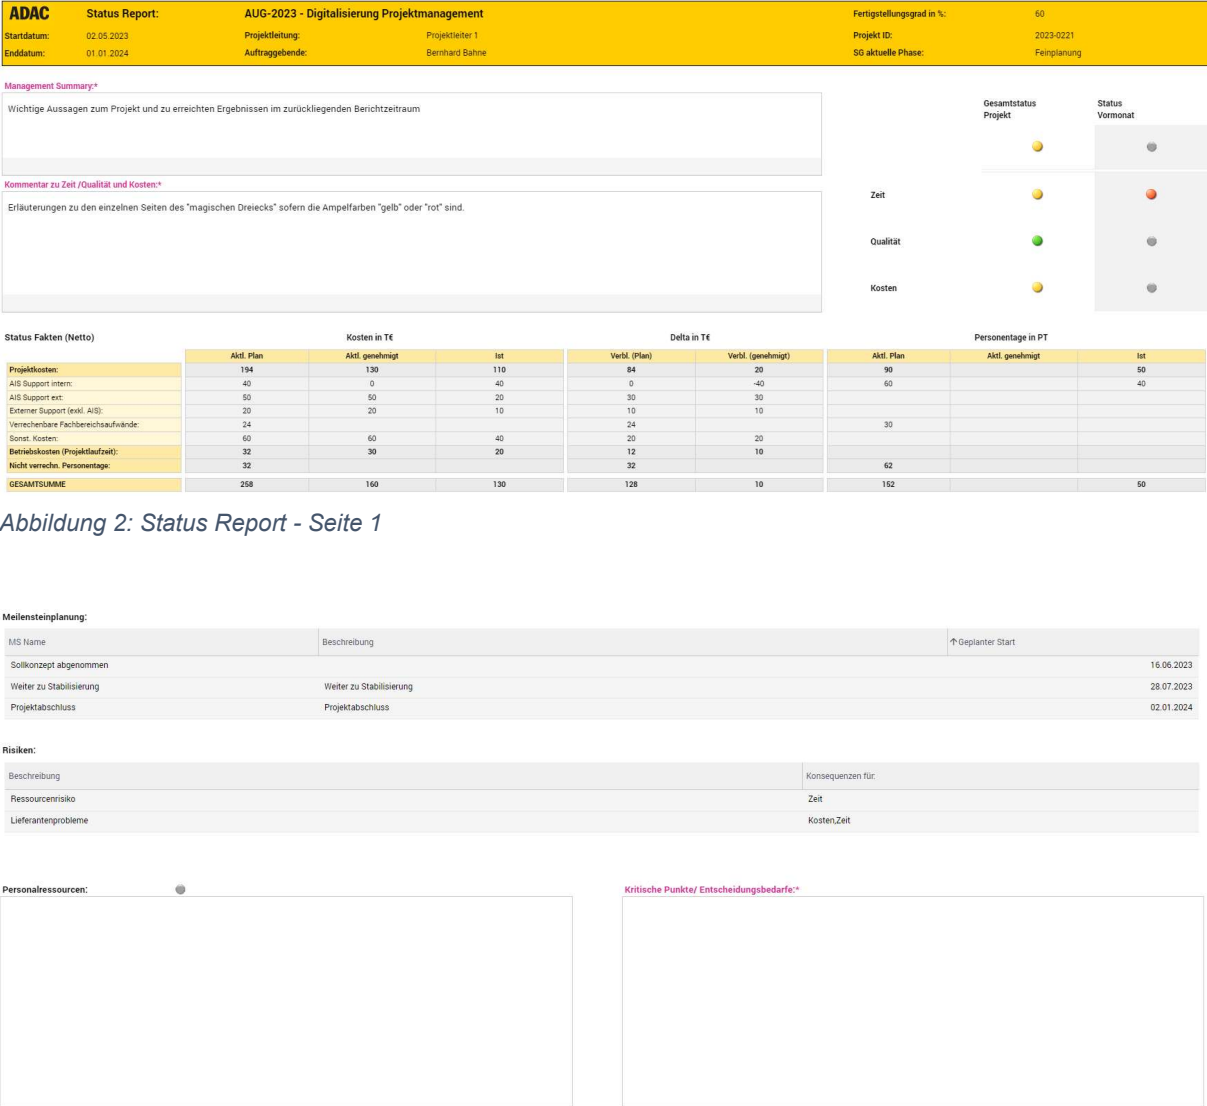

Zur einheitlichen Anwendung der Ampelfarben bei den Projektampeln wurde für alle Projekte eine verbindliche Vorgabe definiert:

Kosten	„grün“	Kosten sind im Plan (sowohl im Ist als auch mit dem prognostizierten Wert)	
	„gelb“	prognostizierte Kostensteigerung kann innerhalb des Projekts bis zum Jahresende bzw. bis zum Projektende kompensiert werden; die avisierte Kostensteigerung wird vom AG mitgetragen	
	„rot“	prognostizierte Kostensteigerung kann innerhalb des Projektes und bis zum Jahresende nicht kompensiert werden	
Zeit	„grün“	Termine sind im Plan (sowohl im Ist als auch mit dem prognostizierten Wert)	
	„gelb“	die Verschiebung von Terminen/ Meilensteinen innerhalb der Projektlaufzeit wird vom AG mitgetragen; es besteht ein mittleres Risiko, dass ein wichtiger Meilenstein oder der Endetermin nicht erreicht wird	
	„rot“	prognostizierter Projekt-Endetermin oder ein Stage-Gate-Meilenstein wird nicht gehalten --> Change Request ist notwendig	
Qualität (Inhalts-und Leistungsziele)	„grün“	der vereinbarte Leistungsumfang wird vollumfänglich erbracht - keine Probleme in den Arbeitspaketen/ Sprints	
	„gelb“	es gibt Probleme in der Umsetzung der einzelnen Arbeitspakete/ Sprints, die vom AG/ LA mitgetragen werden - der Gesamtleistungsumfang ist nicht gefährdet bzw. der genehmigte Projektscope könnte sich ggf. verändern (Projekthinhalte könnten neu aufgenommen oder verschoben werden)	
	„rot“	der vereinbarte Gesamtleistungsumfang kann nicht umgesetzt werden bzw. wird unplanmäßig erweitert --> Projektziele werden verschoben (Scopeverschiebung) --> Projektziele werden neu aufgenommen (Scopeerweiterung) oder können nicht vollständig erfüllt werden (Scopereduzierung)	
Gesamt HINWEIS: Sollten darüber hinaus weitere Risiken bestehen, wie z.B. Ressourcenengpässe, Probleme im Team, Lieferschwierigkeiten etc. kann der PL die Ampel individuell setzen	„grün“	das Gesamtprojekt ist im Plan und es gibt keine Probleme --> z.B. alle Detailampeln sind auf "grün" --> es besteht kein Handlungs- und / oder Unterstützungsbedarf durch das Management	
	„gelb“	das Gesamtprojekt hat Probleme, die innerhalb des Projektteams gelöst werden können --> mindestens eine Projektampel steht auf "gelb" - keine Ampel steht auf "rot" --> es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit zur Stellung eines Change Requests --> es besteht Informations- bzw. Abstimmungsbedarf an das Management (u.a. LA)	
	„rot“	das Gesamtprojekt steckt in einer Krise, massive Probleme sind innerhalb des Projektteams nicht mehr lösbar --> mindestens eine Projektampel steht auf "rot" --> es gibt existenzielle Bedrohungen --> es besteht akuter Handlungs- und Entscheidungsbedarf durch das Management (z.B. Lenkungsausschuss)	


Hinweis:

- Die schlechteste Einzelampel gibt die Farbe für die Gesamtampel vor.
- Wenn ein Gesamtampelstatus auf "gelb" steht, darf dies maximal drei Monate in Folge für dasselbe projektinterne Problem markiert sein. Danach muss das Problem projektintern gelöst sein (Ampelstatus auf "grün") oder durch einen Change Request zur Entscheidung gebracht werden.
=> nach genehmigtem Change Request wird die Ampel wieder auf den Status "grün" gestellt

- Schnittstelle zum Change Request-Prozess:
ALLES, was aus dem abgestimmten Projektauftrag herausläuft (Zeit, Kosten oder Qualität) muss über einen Change Request eingereicht und genehmigt werden.

Tipps & Tricks:


- Die Aktualisierung der PM-Pläne gemeinsam mit dem Projekt-Kernteam vornehmen. Somit haben alle das gleiche Verständnis, wo das Projekt steht und warum, welche Projektampeln gesetzt wurden.
- Termine für die AG-Sitzungen im Voraus als Serientermine einstellen, um einen regelmäßigen Austausch sicherzustellen.
- Bei der Vergabe der Projektampeln die verschiedenen Projektziele berücksichtigen:

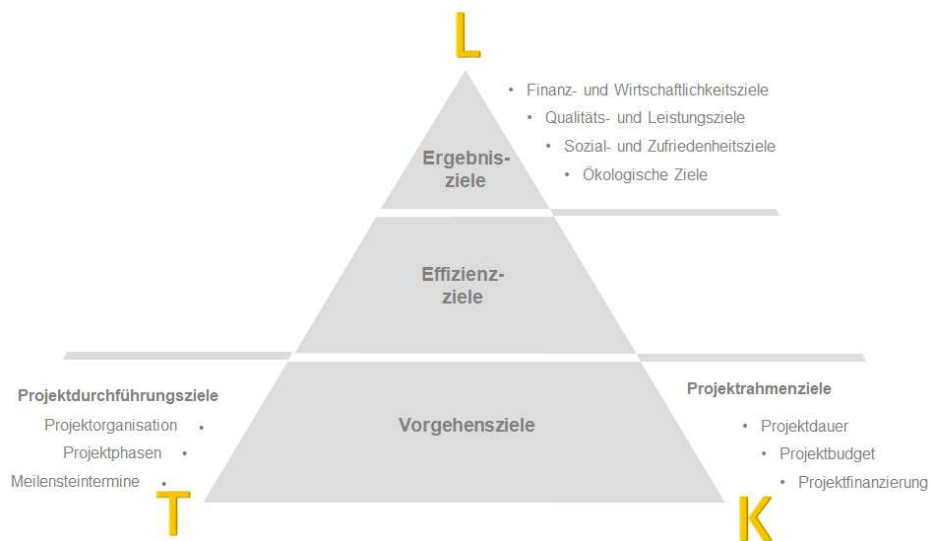

2.3.5 Projektabschluss-Prozess

Der Projektabschluss-Prozess schließt das Projektmanagement im Projekt ab und sichert, neben der Planung von Restarbeiten und der Nachprojektphase, insbesondere die Projektevaluierung und das organisatorische Lernen aus dem Projekt.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projektabschluss-Prozesses ist der Projektabschluss-Workshop. Die Projektpläne sind auf den Letztstand zu bringen (Letztversion der Projektakte). Der Projektabschlussbericht sowie das Übergabeprotokoll können im PM-Tool generiert werden. Eine Erstellung ist erst dann möglich, wenn im Projektstrukturplan die Ist-Endtermine gesetzt und auf Projekt-/Programmebene ein finaler Fertigstellungsgrad eingestellt wurde.

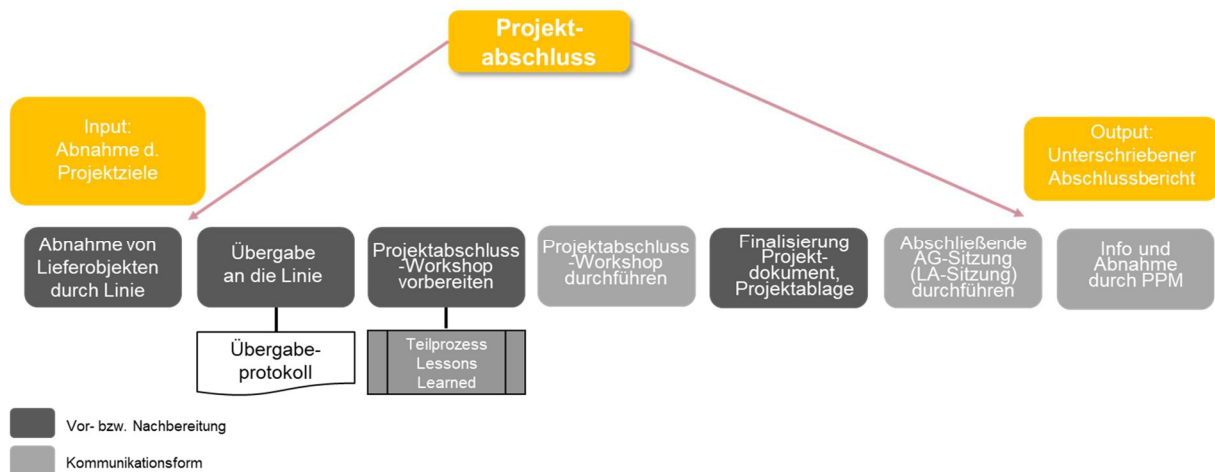

Eine detaillierte Beschreibung des Projektabschluss-Prozesses kann dem Funktionendiagramm entnommen werden: *Detaillierte Prozessbeschreibung des Projektabschluss-Prozesses*

Checkliste zum Projektabschluss:

1. Terminplanung aktualisieren
 - Ist-/ Endtermine bei Arbeitspaketen, auf Phasen- und auf Projektebene setzen
2. Kosten aktualisieren
 - Ist-Sachkosten
 - Rest-Kosten eintragen
3. Finale Dokumente für elektronisches Projektbuch hochladen (Dokumentenablage finalisieren)
4. Lessons Learned Workshop mit Projektkernteam durchführen
5. Schlussbericht und Übergabeprotokoll im PM-Tool erstellen
6. IST-Endtermin eintragen

Hinweise:

Bei Abschluss des Projekts muss zusammen mit dem Projektabschlussbericht eine vollständige revisionssichere Zusammenstellung der Projektdokumentation erfolgen. Es müssen mindestens folgende Projektdokumente enthalten sein:

- Alle formal durch den AG oder LA genehmigten Dokumente (Projektsteckbrief finaler Stand; Unterschriebener Projektauftrag (sofern abgeschlossen); Projektänderungsanträge (CR); Projektabschlussbericht)
- Alle Präsentationen und Protokolle der Lenkungsausschüsse
- Alle finalen fachlichen und technischen Konzepte

Tipps & Tricks:

- Führen Sie einen Abschluss-Workshop durch, zur Vereinbarung der Restarbeiten und der Nachprojektphase, zur Analyse des Projekts (Lessons Learned), aber auch zur Reflexion des Projekterfolgs und falls gewünscht zum gegenseitigen Feedback – jeder hat das Recht auf Feedback!
- Stellen Sie sicher, dass alle entscheidungsrelevanten Dokumente des Projekts auf dem aktuellen Stand im Teams-Ordner zur Verfügung stehen, um die im PM-Tool eingestellten Informationen zu belegen.

2.4 Einzelprojektmanagement-Hilfsmittel und -Checklisten

Die Dokumentation der PM-Pläne erfolgt im PM-Tool „Planisware“ - nur diejenigen Projektpläne, die das Tool nicht unterstützt, werden ergänzend in anderen Programmen erstellt (z.B. Stakeholderanalyse in Excel oder Anforderungsmanagement in Jira bzw. Confluence etc.).

Ergänzend zu den Projektplänen wurden für die praktische Durchführung von Projekten weitere PM-Hilfsmittel erstellt. Diese finden sich in der nachstehenden Tabelle und können aus dem Intranet auf unserer Sharepoint-Seite unter „[Projektmanagement@ADAC](#)“ heruntergeladen werden.

Hinweis: Einige Hilfsmittel können, müssen jedoch nicht benutzt werden. Um im Haus einen Wiedererkennungswert zu haben, wird empfohlen diese Vorlagen einheitlich zu verwenden. So kann vermieden werden, dass sich z.B. Lenkungsausschussmitglieder immer wieder an neue Entscheidungsvorlagen oder Lenkungsausschussfolien gewöhnen müssen.

PM-Vorlagen	Basis-projekt	Projekt/Vorstudien	Groß-projekt/Programm	Format	Quelle	verpflichtende Verlinkung im PM-Tool	Bemerkungen
Beispiel							
Abschlussbericht	M	M	M	Planisware	wird im Tool umgesetzt	X	
Agenda für Steuerungs-Sitzung	K	K	K	Word	Standardvorlage im Sharepoint		
Agenda für den Abschluss-WS	K	K	K	Word	Standardvorlage im Sharepoint		
Agenda für Projektstart-WS	K	K	K	Word	Standardvorlage im Sharepoint		
ALM-Vorlagen*	M	M	M	Word / Excel	Standardvorlage im Sharepoint	X	* nur relevant für Projekte mit IT-Impact
Business Case (High-Level)**	M	M	M	Word	Standardvorlage im Sharepoint		* nur für VES-Bereich relevant
Change Request	M	M	M	Planisware	wird im Tool umgesetzt	X	
Entscheidungsvorlagen	K	K	K	Word	Standardvorlage im Sharepoint		
Feedback-Formular	K	K	K	Word	Standardvorlage im Sharepoint		
Kommunikationsmatrix	K	M	M	PPT	Standardvorlage im Sharepoint		
Lessons Learned	K	K	K	Planisware	wird im Tool umgesetzt		
Präsentationsvorlage für LA	K	K	K	PPT	dzt. in Umsetzung		
Projektauftrag	K	K	K	Planisware	wird im Tool umgesetzt	X	Erstellung eines PA ist individuell mit AG zu vereinbaren
Projektsteckbrief	M	M	M	Planisware	wird im Tool umgesetzt	X	
Projektleiterreferenzbogen	K	M	M	Planisware	wird im Tool umgesetzt		
Projektstrukturplan	K	M	M	Planisware	wird im Tool umgesetzt		
Protokollvorlage	K	K	K	Word	dzt. in Umsetzung		
Risikomatrix	M	M	M	Planisware	wird im Tool umgesetzt		
Risikoanalyse	M	M	M	Planisware	wird im Tool umgesetzt		
Sprint- Productbacklog	M	M	M	Jira/Confluence	wird im Tool umgesetzt		nur für agile bzw. hybride Projekte relevant
Stakeholderanalyse	K	M	M	Excel	Standardvorlage im Sharepoint		
Schulungskonzept/ -unterlage	K	K	K	PPT	dzt. in Umsetzung		sofern erforderlich
Statusbericht	M	M	M	Planisware	wird im Tool umgesetzt		
ToDo-Liste	K	K	K	Excel	dzt. in Umsetzung		
Vorhabenssteckbrief	M	M	M				


M = MUSS
Empfehlung der Instrumente/Methoden, die für die Sicherstellung der Projektziele absolut erforderlich sind

K = KANN
Optionale Instrumente/Methoden, die für die Sicherstellung der Projektziele hilfreich sind

leeres Feld = nicht relevant

2.5 Einzelprojektmanagement-Toolunterstützung und Projektablage

Das PM-Tool „Planisware“ unterstützt den kompletten Projektlebenszyklus von der Vorhabensidee bis zum Projektabschluss. Alle Projektliefergegenstände lassen sich direkt im Tool abbilden. Die Dokumente, die toolseitig nicht unterstützt werden können, finden Sie als Vorlage im Intranet auf der Sharepoint-Seite „[Projektmanagement@ADAC](#)“.

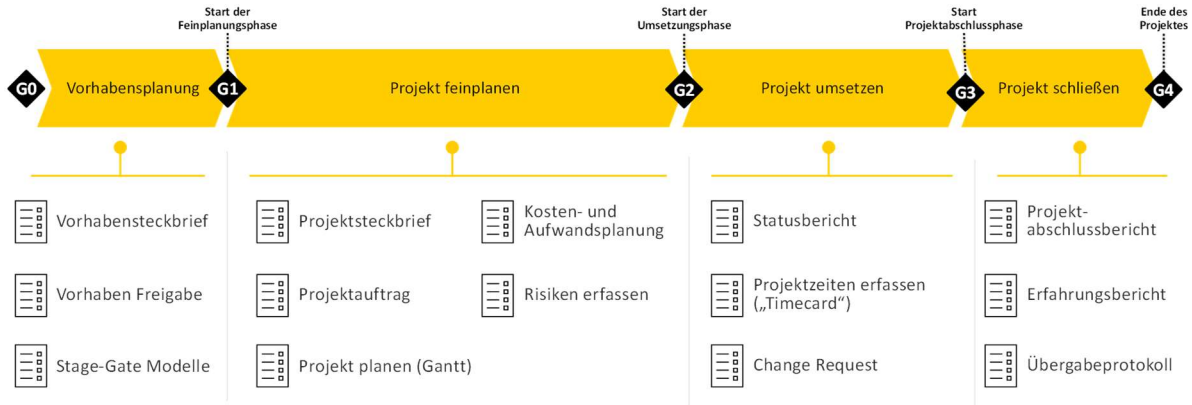

Eine genaue Beschreibung, wie das Tool die Projektmanagement-Methoden, die Projektanlage, Durchführung und Steuerung von Projekten unterstützt, finden Sie in den Planisware Quick Guides (abrufbar über das Hilfe-Symbol in Planisware bzw. über die Sharepoint Seite „[Projektmanagement@ADAC](#)“).

Eine genaue Übersicht, welche PM-Vorlagen toolseitig unterstützt werden und welche nicht, finden Sie im Kapitel 2.4 *Einzelprojektmanagement-Hilfsmittel und -Checklisten*.

Die folgenden Abbildungen stellen lediglich eine kleine Auswahl der Toolunterstützung dar und sollen dazu dienen einen ersten Eindruck zu Planisware und seinen Funktionalitäten zu erhalten.

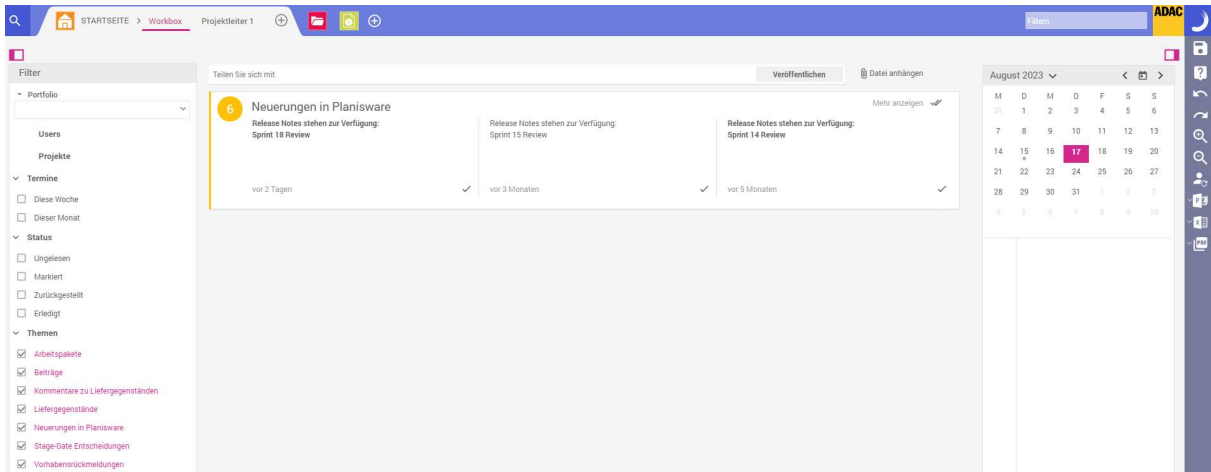


Abbildung 4: individuell konfigurierbare Start-Seite, in der u.a. relevante Entscheidungen oder offene Arbeitspakete angezeigt werden

ADAC

Projektauftrag: Digitalisierung Projektmanagement

Startdatum: 01.05.2023

Enddatum: 31.07.2025

Projekt ID: 2023-0221

Auftraggebende Bereich: ZEN/SE1/MOR/AIS

Motivation

Durch die voranschreitende digitale Transformation außerhalb als auch innerhalb des ADAC gewinnt die Projekt- und Portfolioarbeit zunehmend an Bedeutung. Entsprechend steigt die Wichtigkeit einer zentralen Verwaltung und Übersicht aller projekt- und portfoliorelevanten Aspekte.

Im Zuge dessen werden alte Systeme im ADAC, wie beispielsweise das Auftrags- und Verrechnungssystem „PAM“ oder der elektronische Statusbericht „Eistar“ ersetzt.

Messbare Ziele

- Digitalisierung aller PM-Dokumente nach Planisware bis zum 31.07.2025
- Einführung Planisware bis zum 30.05.2023
- Umsetzung der Projektmanagement-Funktionalitäten (Release 1) bis zum 30.06.2023
- Umsetzung der Projektportfolio-Funktionalitäten (Release 2) bis zum 31.12.2024
- Abschluss der Schulungen bis zum 30.06.2025
- Abschluss der Stablisierungsphase bis zum 31.07.2025

Top 3 Nutzen

- weniger Medienbrüche
- einheitliches Projektvorgehen
- gleichbleibende Projektqualität
- Erhöhung Reifegrad

Top 3 Risiken

- Planisware ist zu komplex und nicht eingängig genug
- fehlende Datenqualität aufgrund fehlender Qualitätssicherung durch Pilotuser
- überschneidende Urlaubszeiten und lange Abwesenheiten durch Elternzeit

Key Facts (Nettowert)

	Gesamt	Davon im Jahr 2025
Vsl. Budget AIS Intern in T€	150	
Vsl. Budget AIS Extern in T€	45	
Vsl. Budget restl. Kosten in T€	23	
Vsl. Aufwand FB in PT	365	

Abhängigkeiten

Verantwortliche Ressorts: AIS

Betroffene Ressorts: HLPDSQ,FDL,FINZ,AIS

Technische Zuordnung: IT-Tools & Infrastruktur

Betroffene Systeme: PAM

Inh. Komplexität: mittel

Org. Komplexität: hoch

Klassifizierung

Maßnahme

Basisprojekt

Vorstudie/Projekt

Großprojekt/ Programm

Abbildung 5: Der Projektauftrag (hier Seite 1) ist eine Vereinbarung zwischen AG und PL und stellt eine Erweiterung des Projektsteckbriefes dar. Zusätzlich zum Steckbrief werden Informationen zur Meilenstein-planung, Abgrenzungen oder der Projektstruktur angezeigt.

The screenshot displays the Planisware software interface for project management. The top navigation bar includes tabs for 'Eigenschaften', 'Steckbrief', 'Risiken', 'Status Report', 'Dokumente', 'Stage-Gate', 'Change Request', and 'Balkendiagramm'. The main workspace shows a Gantt chart for the project 'Digitalisierung Projektman...'. The chart lists various tasks such as 'Feinplanung', 'Konzept Release 1', 'Schulungskonzept abge...', 'Umsetzung', 'Sprints Release 1', 'finaler Regressionstest...', 'Umsetzung Release 1 ab...', 'finaler Regressionstest...', 'Umsetzung Release 2 ab...', 'Weiter zu Stabilisierung', 'Stabi & Abschluss', 'Pilotuser definieren', and 'Projektziele organisieren'. Each task is represented by a horizontal bar indicating its duration and dependencies. The chart is organized into a timeline from 2023 to 2025, with specific dates marked for each task's start and end. The interface also includes a sidebar with task details and a bottom status bar.

Abbildung 6: Mit Hilfe des Balkenplans können die Dauer und Abhängigkeiten zwischen Phasen und AP's definiert werden. Dies hilft vor allem bei komplexen neuen Aufgaben. Das iterative Vorgehensmodell kann so individuell ergänzt werden.

Projektmanagement Handbuch
Katrin Wegner, AIS-IMM

Version 1.0 vom 17.07.2024
Seite 30 von 50

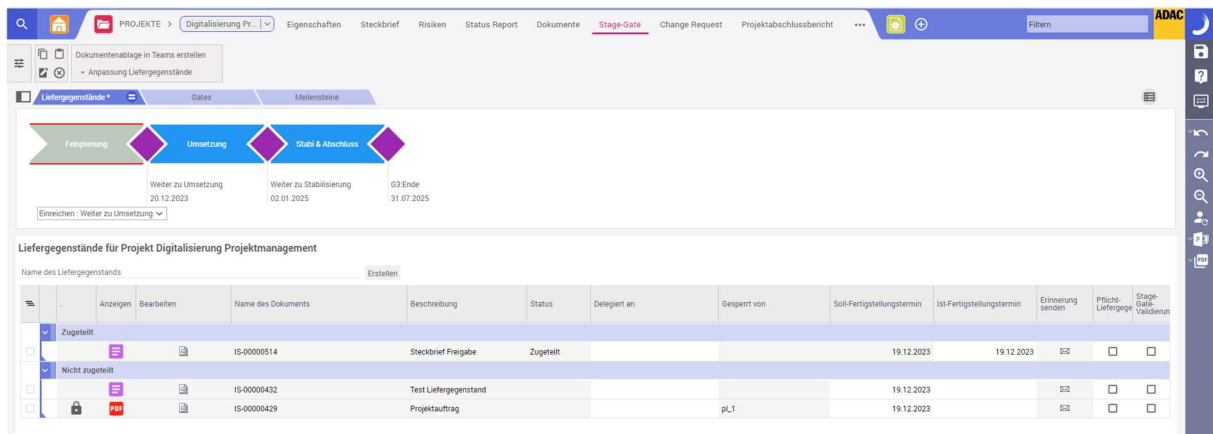


Abbildung 7: Anzeige des gewählten Vorgehensmodells (Stage-Gate) mit der Möglichkeit, Liefergegenstände und Meilensteine zu hinterlegen

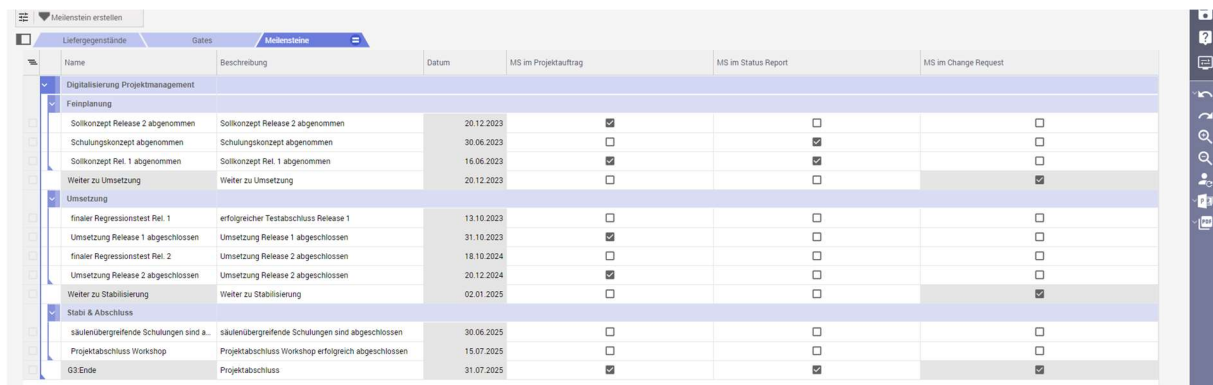


Abbildung 8: Die Meilensteine können individuell für die Anzeige im Projektantrag und im Status Report an- oder abgewählt werden.

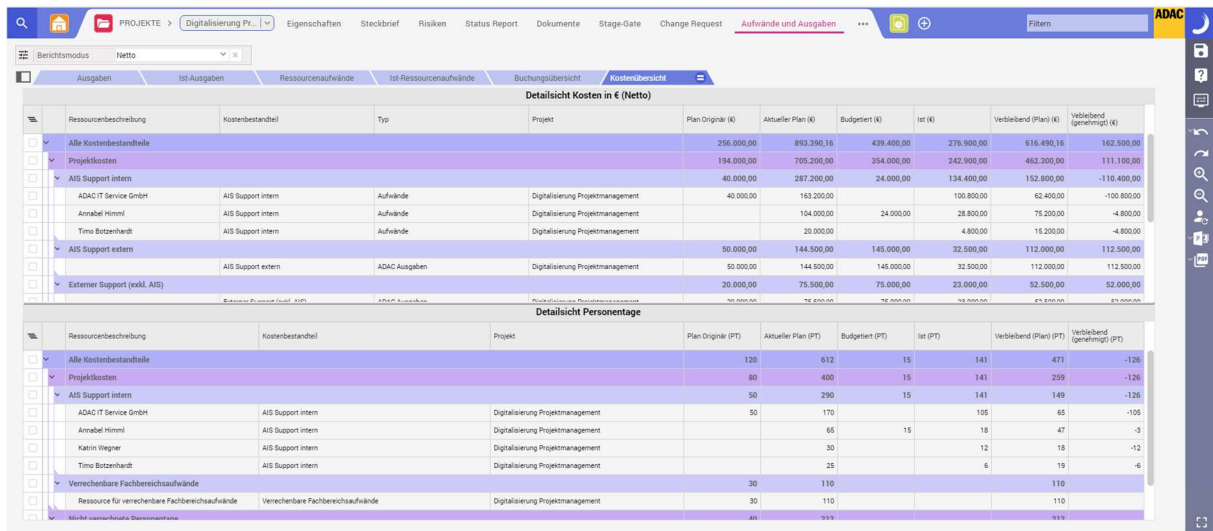


Abbildung 9: Unverzichtbar für die Projektsteuerung ist die Ausgaben- und Aufwandsplanung. Hier ein Beispiel der Netto-Darstellung in der Kostenübersicht.

ADAC		Status Report:		JUN-2024 - Digitalisierung Projektmanagement		Fertigstellungsgrad in %:		40									
Startdatum:		02.05.2023		Projektleitung:		Projektleiter 1		Projekt ID:		2023-0221							
Enddatum:		30.07.2025		Auftraggebende:		Bernhard Bahne		SG aktuelle Phase:		Digitalisierung Projektmanagement Feinplan							
Management Summary*																	
Hinweistext: Bitte tragen Sie ein, was im zurückliegenden Berichtszeitraum erreicht/erledigt/umgesetzt worden ist.								Gesamtstatus Projekt		Status Vormonat							
								●		●							
Kommentar zu Zeit /Qualität und Kosten:																	

PROJEKTE > Digitalisierung Pro... > Eigenschaftens | Steckbrief | Risiken | Status Report | Dokumente | Stage-Gate | Change Request | Projektabschlussberichte | Aufwände und Ausgaben | Projekt Controlling | Detaileingabe Aufwände | Dashboard | Ballfangdiagramm ...

🔍 📄 🗑️ ⌂ 🔒

📁 5.8 Projektabschluss... ➤ Print PDF

Suchen

- Ausblenden
- 1) Unterübersage
- 2) Erforderungsbild
- 3.1) Projektabschlussbericht Seite 1
- 3.2) Projektabschlussbericht Seite 2
- 3.3) Projektabschlussbericht Seite 3
- 3.4) Projektabschlussbericht Seite 4**

ADAC		Projektabschlussbericht für: Digitalisierung Projektmanagement		Erstellt am:	
Projekt-ID 2023-0221	Auftraggebende Bernhard Balne	Projektleitung Bereich	Projektziele Bereich	Projektziele 1 Bereich	2023/02/16 09:15:16 (PPM)
Projektabnahme: Hiermit wird das Projekt offiziell abgeschlossen. - Eine Projektziele-Referenz durch den Auftraggeber und Projektleiter wurde erstellt. - Eine Projektziele-Referenz durch den Auftraggeber und Projektleiter wird bis spätestens [] erstellt. - Ein Übergabeprotokoll ist erstellt, unterschrieben und im Projektordner abgelegt. - Die Archivierung der finalen Dokumente im Projektordner ist erfolgt.					
Projektleitung Projektleiter 1		Auftraggebende Bernhard Balne		Weitere (wie z.B. PPM falls notwendig)	
Datum, Unterschrift		Datum, Unterschrift		Datum, Unterschrift	

Auszug hilfreicher Features:

3 Projektportfoliomanagement (tbd)

Unter einem Projektportfolio (PPF) wird die Summe aller Projekte einer Organisationseinheit verstanden. Aus einer Fülle möglicher Projekte die richtigen auszuwählen, ist eine zentrale Aufgabe des Projektportfoliomanagements (PPM). Es beinhaltet die Prozesse, die notwendigen Strukturen sowie die unterstützenden Instrumente für die Initiierung, Planung und Steuerung der Gesamtheit von Projekten des Unternehmens. Ziel ist dabei die Optimierung im Sinn der Strategie des Unternehmens, um dessen Entwicklung voranzutreiben.

Hinweis:

Das Projektportfoliomanagement sowie die dezentralen Projektportfolien befinden sich derzeit im Aufbau. Sobald es abgestimmte Prozesse und eine passende Unterstützung im PM-Tool gibt, wird dieses Kapitel ergänzt.

4 Ressourcenmanagement (tbd)

Das Ressourcenmanagement als Teil des Projektmanagements dient dazu, alle Projektbeteiligten (Ressourcen) möglichst effektiv einzusetzen.

Die zeitliche und räumliche Disposition von Arbeitskräften, Maschinen, Werkzeugen und anderen für die Projektarbeit benötigten Hilfsmitteln ist Aufgabe des Ressourcenmanagements.

Hinweis:

Aktuell gibt es keinen säulenübergreifenden Standard, wie Projekt-Ressourcen geplant, angefordert und zugeteilt werden. Sobald dieser Standard vorliegt, wird dieses Kapitel ergänzt.

5 Anhang

5.1 Wissenswertes zur Eskalation

5.1.1 Grundvoraussetzungen für eine Eskalation

- Einer Eskalation geht immer (idealerweise nachweislich) ein bilaterales Gespräch, eine Abstimmung bzw. eine Lösungsfindung mit dem/ den Verursachenden voraus.
- Eine Eskalation an die nächsthöhere Ebene erfolgt immer mit einem konstruktiven Vorschlag zur Lösungsfindung. Also immer nach dem Motto: ich habe ein Problem und möchte daran etwas ändern, daher überlege ich mir passende Alternativen, um an der Situation etwas zu ändern
- Der eskalierende Mitarbeiter (→ Eskalation durch...) unterstützt aktiv bei der Lösungsfindung

5.1.2 Eskalationsstufen

Einzelprojektmanagement: Eskalation durch Projektleitung

1. Auftraggeber
2. In Abstimmung mit dem Auftraggeber der Lenkungsausschuss
3. *sofern vorhanden*: ein PPM-Gremium (wie z.B. der Projektportfolio-Ausschuss (PPA) bei der Versicherung)
4. *sofern sinnvoll*: ein Fachgremium (wie z.B. eine Plattform-Sitzung)
5. Geschäftsleitung

Projektportfoliomanagement: Eskalation durch (Teil-)Projektportfolio-Manager

1. Projektportfolio-Ausschuss
2. Geschäftsleitung

Ressourcenmanagement: Eskalation durch Projektleitung oder Ressourcenverantwortlichen

1. Ressortleitung
2. Auftraggeber
3. *Sofern vorhanden*: ein PPM-Gremium
4. Geschäftsleitung


5.2 Detailprozesse und -übersichten

5.2.1 Detailprozesse und -übersichten im Einzelprojektmanagement

5.2.1.1 Detailübersichten bezüglich der exakten Vorgehensweise hinsichtlich der Qualität, Zeit, Kosten und Ressourcen im Projekt

DETAILS	Leistungen/Inhalte	Termine	Kosten/ Aufwand	Interne Mitarbeiter
Allgemein			Kostenarten: NUR NETTO-Budget angeben! AIS Support intern, AIS Support ext., Externer Support (exkl. AIS), Verrechenbare Fachbereichsaufwände, Sonst. Kosten, Betriebskosten, Nicht verrechnete. Personentage	Ressourcenarten: auf Ressortebene, Mitarbeiterebene
Planung	Empfehlung: mindestens Teilaufgaben/AP-Ebene (2. Ebene)	mindestens auf Phasen-Ebene (1. Ebene)	mindestens auf Projekt-Ebene (0. Ebene)	mindestens auf Projekt-Ebene (0. Ebene)
Controlling	- mindestens auf Projekt-Ebene (0. Ebene) Empfehlung: mindestens Teilprojekt-Ebene 1 - Leistungsfortschritt in 10% Schritten auf Projektebene und in 25% Schritten auf AP-Ebene	- mindestens auf Phasen-Ebene (1. Ebene)	- Istaufwandserfassung auf Projektebene (0. Ebene) - Restaufwandsschätzung auf Projektebene (0. Ebene)	Iststundenerfassung auf Projekt-Ebene manuell durch MA oder durch PL keine Restaufwandsschätzung

Aufbau: Projektstrukturplan

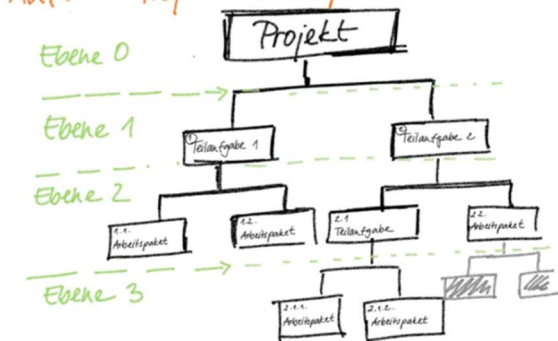



5.2.1.2 Detaillierte Beschreibung der Einzelprojektmanagement-Rollen und Gremien (1/4)

Rollen	Standard-Definitionen	Verantwortlichkeiten und Aufgaben	Befugnisse	wesentliche Ergebnistypen	Abgrenzung zu anderen Rollen
Sponsor	- interner Unterstützer aus der ersten Führungsebene - ggf. externer Geldgeber - ist eine Person, die das Projektmanagement unterstützt und die Unterstützung der Geschäftsleitung sichert	- Unterstützung bei der Auswahl der Projektleitung - Finanzierungsaushandlung und Vertretung des Projektmanagers gegenüber der Unternehmensführung - Identifikation der geschäftlichen Fragestellung, die dem Projekt zugrundelegt und Beauftragung eines zugehörigen Business Cases - Gewährleistung einer offenen Kommunikation der Projektziele im Unternehmen- Mitwirken an der anfänglichen Projektplanung und Definition des Projektumfangs - Definition der Erfolgskriterien des Projekts und Einbindung wichtiger Beteiligter für die Unterstützungssicherung - Darstellung des Projektwertes und Sicherung der Ressourcen für den Projekterfolg - beratende Unterstützung der Projektleitung - Sicherstellung einer stabilen Kommunikation - Überprüfung von Änderungen in der Projektumgebung	- Nennung in allen öffentlichen Projektaktivitäten		Abgrenzung Sponsor - Auftraggeber
Auftraggeber	Der Projektauftraggeber ist der Eigentümer des Projektes und trägt letztendlich auch die Ergebnisverantwortung. Der Projektauftraggeber stellt die Schnittstelle zwischen dem Projekt und den Unternehmensinteressen, sowie die Interessen weiterer Stakeholder dar und ist der Vertragspartner, der über den Erfolg des Projekts endgültig entscheidet.	- er steht organisatorisch an der Spitze eines Projektes - Auswahl und Benennung des Projektleiters - Rahmenbedingungen klären und Mitwirkung des Kunden sicherstellen - Formulierung des Projektauftrages und eindeutige und unmissverständliche Formulierung der Projektziele - Erteilung des Auftrags für die Projektarbeit an den PL und Vorgabe der Rahmenbedingungen - Abstimmung der Projektziele mit den Unternehmenszielen - Erstellung und Verantwortung des Business Case - Bereitstellung des Projektbudgets - Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Ressourcen für das Projekt - nimmt Kontroll- und Steuerungsfunktionen wahr - vertritt die Projektinteressen auf übergeordneter Stelle nach außen - bei tiefer gehenden Konflikten oder grundlegenden Projektrisiken stellt er eine wichtige Stelle zur Schlichtung dar - unterstützt den Projektleiter bei allen unerwarteten Problemen - Abnahme des Projekts -> Abnahmepflicht bei ordnungsgemäßer Ausführung -> Abnahme/Genehmigung von Teilergebnissen - soll Motivator und Visionär für sein Thema sein - Führung und erster Ansprechpartner des Projektleiters - Zusammenstellung und Einberufung des Lenkungsausschusses	- Bewilligung von Scope-, Termin- und Kostenänderungen - kann innerhalb des magischen Dreiecks (Termine, Inhalte, Kosten) Veränderungen verlangen - außerhalb des magischen Dreiecks ist eine Abstimmung mit dem LA notwendig (CR) - kann Verträge im Rahmen des bestehenden Sourcingprozesses schließen - Vetorecht bei Entscheidungen mit erheblichen Auswirkungen auf Projektziel bzw. auf das Unternehmen - Treffen finaler Entscheidungen zu Vorlagen, die vom PL vorbereitet werden - Verfügung über das Projektbudget (Erteilung von Aufträgen (s.o.), Beschaffung von Sachmitteln usw.) - Änderung des Projektauftrages (in Abstimmung mit der PL) - Recht auf aktuelle Informationen - Ablehnung der Ergebnisse bei Nichterfüllung - Übernahme gerechtfertigter Mehraufwendungen ggf. in Abstimmung mit dem LA und/ oder GL - kann ggf. das Projekt beenden (auch außerplanmäßig)	- Projektauftrag - abgenommener Statusbericht - abgenommener Projektsteckbrief - abgenommene Meilensteine - abgenommener Change Request - abgenommener Abschlussbericht	Abgrenzung Auftraggeber - Lenkungsausschuss: - Lenkungsausschuss wird gegründet, wenn das Thema weiter strahlt als der Auftraggeber es steuern und verantworten kann - Lenkungsausschuss erweitert Auftraggeber - Auftraggeber hat Vetorecht gegenüber den Entscheidungen des Lenkungsausschusses - Ziel: einvernehmliche bzw. einstimmige Entscheidungen - Informationsrecht über Entscheidungen, die vom PMT vorbereitet und durch den AG final getroffen wurden - Treffen von Entscheidungen, die der AG nicht alleine treffen kann/ will
Programm-Manager	Programme sind "Großprojekte mit einer Anzahl von Subprojekten" (= eine Reihe verknüpfter Vorhaben & Maßnahmen zur Erreichung einer übergeordneten Zielsetzung). Verantwortlich für ein Programm ist der Programmmanager. Er sorgt dafür, dass die Projekte innerhalb seines Programms hinreichend mit Ressourcen versehen, integriert, kommuniziert und im Rahmen der definierten Ziele umgesetzt werden. Diese Aufgabe umfasst neben der Budget- und Terminverantwortung für das Programm auch das Führen von Projektleitern sowie den Aufbau und die Führung eines Programm Office. - zeitlich befristete Aufgabe - wenn erforderlich, Eingriff in die Projekte	- Die Aufgaben des Programmmanagers sind für die Dauer des Programms zeitlich begrenzt. - Führung der Projektleiter - Planung und Steuerung der Projekte im Rahmen des Programms - Verantwortung für die Information der Stakeholder und Kunden - Überwachung des Programmfortschritts hinsichtlich des Programm Plans und des Business Planes - Management der Programm Risiken und Probleme - regelmäßige Abstimmung der Meilensteine des Hauptprojekts mit den Informationen und Ergebnissen aus den Projekten des Programms - Abstimmung der Schnittstellen zwischen den einzelnen Projekten - Wahrnehmung von Budget- und Personalverantwortung auf Programmebene -> Schwerpunkt: Führungsaufgaben + Koordination	- fachliche Weisungsbefugnis gegenüber seinen Projektleitern der Projekte des Programms - Genehmigung von Kostenüberschreitungen einzelner Subprojekte solange das Budgetziel des Programmes nicht gefährdet ist - äquivalent des Projektleiters auf der Stufe des Programm-Managers	- äquivalent zur Projektleitung	- Abgrenzung Programm-Manager zu Projektportfoliomanager: siehe Projektportfoliomanager - Abgrenzung Programm-Manager zu Projektleiter/-in: - Der Programm-Manager ist nicht für die Anforderung und Abstimmung der Ressourcen verantwortlich (Personaleinsatzplanung für das Einzelprojekt). Diese Verantwortung liegt bei der Projektleitung. Sollte es jedoch zu Ressourcenengpässen kommen fungiert der Programm-Manager als Eskalationsinstanz. (Eskalationskette sieht wie folgt aus: Programm-Manager -> AG -> Lenkungsausschuss -> GL)

Detaillierte Beschreibung der Einzelprojektmanagement-Rollen und Gremien (2/4)

Rollen	Standard-Definitionen	Verantwortlichkeiten und Aufgaben	Befugnisse	wesentliche Ergebnistypen	Abgrenzung zu anderen Rollen
Projektleiter/-in	Definition nach DIN 69 901: Die Projektleitung stellt eine "für die Dauer des Projekts geschaffene Organisationseinheit" dar, "welche gesamthaft für die Planung, Steuerung und Überwachung des Projekts verantwortlich ist". Die Projektleitung muss in der Lage sein, a) das Projekt zu managen b) das Team zu führen und c) als Schnittstelle zu den Stakeholdern (z.B. Auftraggeber, Management, Zulieferer) zu fungieren. Hierfür muss eine entsprechende Qualifikation vor Übernahme der Rolle bestehen.	Die Projektleitung hat die Verantwortung für das Projekt von der Initialisierungsphase bis zum Projektabschluss. Folgende Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind damit verbunden: Projektinitialisierung: - Vertragsmanagement & Verhandlungen im Rahmen des hausinternen Sourcingprozesses - Mitarbeiten an der Projektdefinition und Leiten des Prozesses der Zieldefinition Projektplanung: - Projektorganisation einrichten - Einrichtung und Koordination des Projektablaufs und der Berichterstattung - Planung von Projektphasen, Aufgaben, Terminen und Ressourceneinsatz (Hinweis: sofern IT-Anwendungsentwicklung betroffen: Orientierung an ALM-Vorgaben) - Teamentwicklung und Mitarbeiterführung (nur fachlich) - Eskalation von Problemen, die nicht gelöst werden können - verantwortlich für das Finanzmanagement Projektsteuerung: - Vertretung des Projekts (nach innen und außen) - Kommunikationsfluss regeln und Konfliktmanagement betreiben - Verfolgung und Steuerung des Projektfortschritts (Termine, Kosten, Inhalt) - Überwachung und Steuerung des Ressourceneinsatzes - Erkennung & Gegensteuerung drohender Planabweichungen - Änderungen prüfen, abstimmen und in Projektpläne einarbeiten (ggf. Anwendung des CR-Verfahrens) - Risiko- & Chancenmanagement, Kunden- & Partnermanagement Projektabschluss: - Koordination der Übergabe des Projekts in die Linie - Dokumentation von "lessons learned" - Erstellung eines Projektabschlussberichts - Hinweis: Der Projektleiter ist verpflichtet, den ALM-Prozess anzuwenden, sofern das Projekt eine IT-Anwendungsbezogenen Anteil aufweist. -> damit verbunden folgende Pflichten: Besetzung der IT-Rollen (z.B. Lösungsarchitekt), Festlegen der Ergebnistypen (Dokumente aus dem ALM) sowie Überwachung des Projekts bezüglich der ALM-spezifischen Vorgaben und Spielregeln	Verteilung der Befugnisse laut Daenzer: "Die Projektleitung hat größeren Einfluss auf das WAS, Wann, Wo und die Linieninstanzen auf das Wie, Womit, Woher und Wohin". - die Projektleitung hat die Befugnis, Termine für die jeweilige Projektphase zu setzen (Wann) - die Projektleitung hat in Abstimmung mit dem Auftraggeber die Befugnis zu bestimmen, unter welchen Bedingungen die Leistungsziele als erfüllt anzusehen sind (Was) - die Projektleitung stimmt sich mit den Bereichen ab, welche Mitarbeiter in seinem Projektteam mitarbeiten (Wer) - die Projektleitung hat Mitspracherecht bei der Auswahl seiner internen und externen Projektmitarbeitern (Wer) - die Projektleitung kann das bestehende Sourcingverfahren zur Auswahl notwendiger Unterauftragnehmer und Lieferanten anstoßen (Woher) - Mitwirkungsrecht bei der Projektzieldefinition im Hinblick auf die Projekthalte sowie Kosten und Termine - Projektbezogenes Informationsrecht über die regelmäßige Berichtspflicht der Beteiligten hinaus - projektbezogenes Weisungsrecht: die Projektleitung ist berechtigt, den beteiligten Bereichen projektbezogene Weisungen zu geben (z.B. Rahmenangaben zu Arbeitspaketen, Abgrenzung von Arbeitspaketen, Weitergabe von Projektergebnissen etc.) - interne Konflikte werden partnerschaftlich gelöst - bei Konflikten setzt sich die Projektleitung mit den Vorgesetzten der Mitarbeiter in Verbindung - projektbezogenes Entscheidungsrecht, d.h. erzielen die Mitglieder der Projektgruppe keine einvernehmliche Regelung, entscheidet die Projektleitung- Entscheidungsrecht bei der Vergabe von Arbeitspaketen und deren Verantwortliche (u.a. auch an externe Stellen) - Berechtigung, Projektergebnisse zu akzeptieren oder zurück zu weisen (z.B. an Meilensteinen) - Projekt-Inhalte aufgrund Effizienzsteigerungspotenzial zur Disposition stellen und dem AG zur Entscheidung vorlegen	- Verträge mit externen Dienstleistern - Projektleckbrief / Projektauftrag - Projektplanung (siehe Methodenliste) - Projektstatusbericht - Change Request - Übergabeprotokoll - Abschlussbericht	
Teilprojektleiter	Der Teilprojektleiter ist ein Angehöriger der Projektleitung. Wenn bei größeren Projekten zwischen Teilen des Projektes keine Fachzusammenhänge bestehen und eine logische, inhaltliche Abgrenzung gegeben ist, kann es sinnvoll sein, Teilprojekte einzurichten. Dasselbe gilt, wenn die Anzahl der im Projekt mitarbeitenden Personen so groß ist, dass eine sinnvolle Steuerung durch die Projektleitung allein nicht gewährleistet werden kann.	Hauptaufgabe bzw. -verantwortung besteht in der Erreichung der technisch-wirtschaftlichen Zielsetzung des Teilprojekts gemäß den internen Auftragsvereinbarungen. U.a. bestehen folgende Aufgaben: - Zeitplanung im Teilprojekt unter Berücksichtigung des Gesamtzeitplans - Überwachung und Steuerung des Teilprojektes - Verantwortung für die Erreichung von Termin-, Kosten- und Inhaltszielen des Teilprojektes - Transfer zur Projektleitung	- die Teilprojektleitung hat die Befugnis, Termine in Abstimmung mit dem Gesamtzeitplan für die jeweilige Projektphase zu setzen - die Teilprojektleitung hat in Abstimmung mit dem Projektleiter die Befugnis zu bestimmen, unter welchen Bedingungen die Leistungsziele als erfüllt anzusehen sind - die Teilprojektleitung hat Mitspracherecht bei der Auswahl seiner internen und externen Projektmitarbeitern - Projektbezogenes Informationsrecht über die regelmäßige Berichtspflicht der Beteiligten hinaus - interne Konflikte werden partnerschaftlich gelöst - bei Konflikten setzt sich die Teilprojektleitung mit dem Projektleiter in Verbindung - projektbezogenes Entscheidungsrecht, d.h. erzielen die Mitglieder der Projektgruppe keine einvernehmliche Regelung, entscheidet die Teilprojektleitung in Abstimmung mit dem Projektleiter - Entscheidungsrecht bei der Vergabe von Arbeitspaketen und deren Verantwortliche - Berechtigung, Projektergebnisse zu akzeptieren oder zurück zu weisen (z.B. an Meilensteinen)	- Projektplanung im Rahmen des Teilprojekts	

Detaillierte Beschreibung der Einzelprojektmanagement-Rollen und Gremien (3/4)

Rollen	Standard-Definitionen	Verantwortlichkeiten und Aufgaben	Befugnisse	wesentliche Ergebnistypen	Abgrenzung zu anderen Rollen
Kernteam-Mitglied (KTM)	Das Kernteam-Mitglied ist Teil des Projektteams und somit der Projektorganisation. Es berichtet der Projektleitung und ist ihr gegenüber projektbezogen weisungsgebunden. 	- Mitarbeit beim Know-how Transfer aus Vorprojektphase in das Projekt - Überprüfen der Projektziele gemeinsam mit dem Projektleiter - Mitarbeit bei der Erstellung adäquater Projektpläne - Übernahme von Verantwortlichkeiten für definierte Arbeitspakete - Spezifikation von entsprechenden, übernommenen Arbeitspaketen - Schätzung von Durchlaufzeiten, Aufwänden und Kosten für übernommene Arbeitspakete - Mitarbeit beim Design einer adäquaten Projektorganisation - Mitarbeit bei der Projektkulturentwicklung - Mitarbeit bei der Planung von Maßnahmen zum Risikomanagement, zur Krisenvermeidung und -vorsorge - Mitarbeit bei der Gestaltung von Projekt-Kontext-Beziehungen - Mitarbeit bei der Erstellung und Adaption der Projektmanagement-Dokumentation - Mitarbeit bei der Durchführung des Projektmarketings - Teilnahme am Projektstart-Workshop, an Projektsteuerungs-Sitzungen und am Projektabschluss-Workshop - Eigenverantwortliche Erfüllung von Arbeitspaketen - Operative Kontrolle der vereinbarten Qualität der übernommenen Arbeitspakete - Mitarbeit bei der Feststellung des Projektstatus - Vereinbarung und Vornahme steuernder Maßnahmen - Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Projektorganisation und der Projektkultur - Mitarbeit bei der Neugestaltung der Projekt-Kontext-Beziehungen - Inhaltliche Beiträge zur Krisenbewältigung und Schadenslimitierung - Mitarbeit beim inhaltlichen und emotionalen Abschluss des Projekts - Mitarbeit beim Know-how Transfer in die Stammorganisation und andere Projekte	Organisatorische Befugnisse: - Entscheidungen über die Übernahme der Verantwortlichkeit definierter Arbeitspaketen - Selbstständige Abarbeitung der übernommenen Arbeitspakete mit Unterstützung definierter Projektmitarbeiter - Entscheidung über den fachlichen Einsatz entsprechender Methoden, Verfahren, Werkzeuge, etc. unter Berücksichtigung der projektspezifischen Rahmenbedingungen - Koordination von Projektmitarbeitern im Subteam Systemtechnische Befugnisse: - Leserechte in den ihm zugeteilten Projekten - Erfassung und Freigabe von Ist-Aufwänden für die zugewiesenen Arbeitspakete - Einfügen und Bearbeitung von Dokumenten im PM-Tool	- Arbeitspaket-Status - qualitätsgesichertes Lasten- bzw. Pflichtenheft	Abgrenzung zwischen Kernteam-Mitglied und Projektmitarbeiter: Je nach Projekt kann das Kernteam-Mitglied auch Projektmitarbeiter in Subteams koordinieren. Der Projektmitarbeiter ist in diesem Fall Mitglied eines Subteams (arbeitet mit einem Kernteam-Mitglied und anderen Projektmitarbeitern in einem Subteam).
Projektmitarbeiter (PMA)	Der Projektmitarbeiter ist Mitglied der Projektorganisation. Er berichtet der Projektleitung oder dem zuständigen Kernteam-Mitglied und ist diesem gegenüber bezüglich des Arbeitspakets weisungsgebunden. 	- Unterstützung des AP-Verantwortlichen bei der Detailterminplanung, Aufwands- und Kostenschätzung entsprechend seiner Fachkompetenz und Erfahrungen - Erfüllung von Arbeitspaketen, Durchführung vereinbarter Tätigkeiten innerhalb ein oder mehrerer Arbeitspakete - Teilnahme an Projektcontrollingsitzungen nach Bedarf - Berichtet dem Arbeitspaket-Verantwortlichen über den Leistungsfortschritt und von voraussichtlich der Planung abweichenden Terminen, Aufwänden und Kosten - Mitarbeit bei der Projektkrisenbewältigung - Mitarbeit beim Know-how Transfer in die Stammorganisation und in andere Projekte	Organisatorische Befugnisse: - Operative Entscheidungen im Bezug auf die Erfüllung von Arbeitspaketen - Mitsprache beim Einsatz entsprechender Verfahren, Methoden, Werkzeuge, etc. Systemtechnische Befugnisse: - Leserechte in Bezug auf spezifische Arbeitspakete - Erfassung von eigenen Ist - Aufwänden für spezifische Arbeitspakete - Einfügen und Bearbeitung von Dokumenten im DMS für spezifische Arbeitspakete	- keine	Abgrenzung zwischen Kernteam-Mitglied und Projektmitarbeiter: Je nach Projekt kann das Kernteam-Mitglied auch Projektmitarbeiter in Subteams koordinieren. Der Projektmitarbeiter ist in diesem Fall Mitglied eines Subteams (arbeitet mit einem Kernteam-Mitglied und anderen Projektmitarbeitern in einem Subteam). Hinweis: Falls der AE-Prozess relevant ist (IT-Anwendungsentwicklung): Jede/r Projektleiter/in kann (je nach Bedarf bzw. Größe des Projekts) mindestens eine oder auch mehrere definierte Rollen aus dem AE-Prozess einnehmen.
Product Owner (Rolle nur bei agilem Projektmanagement relevant)	Der Produkteigner - der Drehbuchautor: vertritt in einem agilen Projekt die Interessen der Anwender und Stakeholder und ist für die strategische Entwicklung und den wirtschaftlichen Erfolg des Projekts (Qualität, Kosten, Zeit) verantwortlich.	- stellt die Schnittstelle zum Auftraggeber und weitere Stakeholder des Projektes dar und vertritt deren Interessen - er hat additiv die Aufgaben des fachlichen, bzw. Gesamtprojektleiters inne. - gemeinsam mit dem Scrum Master erstellt er die Inhalte des Projektstatusberichts und sorgt für die pünktliche Lieferung des Berichts - er bestimmt die Features und Anpassungsbedarfe des Produkts anhand des von ihm zu pflegenden Product Backlog und priorisiert die Anforderungen und entscheidet somit, was und in welcher Reihenfolge in einem Sprint umgesetzt wird - er arbeitet eng mit dem Entwicklungsteam zusammen - er validiert Arbeitsergebnisse, oder lehnt diese ab - er führt das Sprint Planungsmeeting durch	- in der Außensicht analog Rolle "Projektleitung"	- Product Backlog	


Detaillierte Beschreibung der Einzelprojektmanagement-Rollen und Gremien (4/4)

Rollen	Standard-Definitionen	Verantwortlichkeiten und Aufgaben	Befugnisse	wesentliche Ergebnistypen	Abgrenzung zu anderen Rollen
Scrum-Master (Rolle nur bei agilem Projektmanagement relevant)	Der Scrum Master - <i>der Regisseur</i> - stellt sicher, dass die Scrum-Regeln und Werte eingehalten werden und hilft dem Team, selbstorganisiertes Arbeiten so anzuwenden, dass bessere Ergebnisse und damit eine höhere Produktivität erzielt werden.	- Führt die Scrum-Regeln ein und überwacht deren Einhaltung - moderiert Meetings und kümmert sich um jede Störung des Scrum-Prozesses - Arbeitsmittel des Scrum-Masters ist das Impediment Backlog - der Scrum-Master ist verantwortlich für die Lösung der Hindernisse, die er im Impediment-Backlog dokumentiert - er stellt eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten sicher - er stellt sicher, dass der Product Owner sich nicht in die Organisation des Teams einmisch und schützt das Team vor externen Störungen - gemeinsam mit dem Product Owner erstellt er die Inhalte des Projektstatusberichts und sorgt für die pünktliche Lieferung des Berichts	- Er ist nicht weisungsbefugt, weder in fachlichen noch in personellen Fragen, sondern fungiert als Moderator und versteht sich als Dienstleister des Projektteams und organisiert die Scrum-Meetings	Impediment Backlog (laufend): Darin festgehalten sind alle Hindernisse („Impediments“), die das Entwicklungsteam an effektiver Arbeit hindern (z.B. mangelnde Kommunikation und Zusammenarbeit, persönliche Konflikte), im Scrum-Team (z.B. in der Zusammenarbeit zwischen Product Owner und Entwicklungsteam) als auch Störungen von außen (z.B. Aufforderungen der Fachabteilung zur Bearbeitung zusätzlicher Aufgaben während eines Sprints).	Abgrenzung zum Projektleiter bzw. PTM: Der Scrum-Master gehört selbst nicht zum Entwicklungsteam. Er ist gegenüber dem Entwicklungsteam eine Führungskraft, aber kein Vorgesetzter. Weder kann er einzelnen Team-Mitgliedern konkrete Arbeitsanweisungen geben noch kann er diese beurteilen oder disziplinarisch belangen. Seine Rolle ist die eines "Servant Leaders" - der Scrum-Master sichert sich Anerkennung und Gefolgschaft, indem er sich der Bedürfnisse der Team-Mitglieder annimmt.
agiles Entwicklungsteam (AET) (Rolle nur bei agilem Projektmanagement relevant)	Das agile Team - <i>die Darsteller</i> : entscheidet unter Berücksichtigung der gewünschten Reihenfolge und unter Einhaltung der vereinbarten Qualitätsstandards gemeinsam, wie die Vorgaben des Product Owners in einem Sprint umgesetzt werden	- Team ist für die Lieferung der Produktfunktionalitäten in der vom Product Owner gewünschten Reihenfolge verantwortlich. Zudem trägt das Entwicklungsteam die Verantwortung für die Einhaltung der zuvor vereinbarten Qualitätsstandards. Hierzu geht es im Sprint Planning ein „Commitment“ ein, in dem es sich zum Erreichen der freiwillig ausgewählten Ziele verpflichtet. - Scrum-Teams arbeiten interdisziplinär, ohne Hierarchien und mit einer optimalen fixen Teamgröße von 7 +/-2 Mitgliedern. - Die Teilnehmer des Teams werden idealerweise über einen längeren Zeitraum in gleicher Besetzung gehalten. Team kann besser zusammenwachsen und die Velocity (Entwicklungs-Geschwindigkeit) erhöhen. - es führt die Aufwandsschätzung des Sprintinhaltes durch und implementiert und testet das Increment - Team präsentiert dem Product Owner und interessierten Stakeholdern die Arbeitsergebnisse.	- Das Entwicklungsteam ist autonom, da es allein entscheidet, wie viele Funktionalitäten es in einem Sprint liefern will. - es wählt den Sprintumfang und spezifiziert die technische Umsetzung der Arbeitsergebnisse	- Sprint Backlog	Abgrenzung zum PMA: Das Entwicklungsteammitglied entscheidet selbst über den Umfang der Sprints und passt diese an seine eigenen Möglichkeiten an. Er ist gegenüber dem Scrum-Master nicht weisungsgebunden. Das ideale Teammitglied ist sowohl Spezialist als auch Generalist, damit es Teamkollegen beim Erreichen des gemeinsamen Ziels helfen kann.
Einzelprojekt-Gremien	Standard-Definitionen	Verantwortlichkeiten und Aufgaben	Befugnisse	Abgrenzung zu anderen Rollen	
Lenkungs-ausschuss	Der Lenkungsausschuss (auch Steering Committee) ist Teil des obersten beschlussfassenden Gremiums in der Projektorganisation und unterstützt den Auftraggeber bei der Erfüllung der Ergebnisverantwortung. Als Vertreter der Stakeholderinteressen sowie der übergeordneten Unternehmensinteressen entscheidet er gemeinsam mit dem Auftraggeber über Projekt (Zwischen-)Ergebnisse. Bei Entscheidungen, die über die Befugnisse des Projektleiters hinausgehen, ist der Lenkungsausschuss auch Eskalationsinstanz. - Kontroll-/ Berichtsinstanz des Projektmanagements - Gremium aus bevollmächtigten	- Bereitstellung der budgetären Voraussetzungen für Projektressourcen - Entscheidung grundlegender Fragen wie Projektziele, Projektbudget, Ressourcen, gravierende Änderungen der Rahmenbedingungen und Ergebnisse - Wahrnehmung der Aufsichtspflicht gegenüber dem Projekt - Sicherstellung der für den Projekterfolg notwendigen Rahmenbedingungen - Abstimmung des Projektauftrages und -ziele mit dem Auftraggeber - Freigabe von Projektphasen - Unterstützung der Projektleitung, Treffen von Entscheidungen (außerhalb der Kompetenz des Projektleiters) - Durchsetzen übergeordneter Unternehmensinteressen - Abnahme der PL-Vorschläge INNERHALB der Parameter (Kosten, Inhalt, Termin)	- zuständig für Entscheidungen, die über die Befugnisse der Projektleitung hinausgehen - ist Eskalationsinstanz - Entscheid über Neuausrichtung oder gar Abbruch eines Projekts - projektseitige Genehmigung von Terminänderungen, Change Requests und Änderungen des Projektsscopes - Abnahme von (Zwischen-) Ergebnissen		

Teilprozess	Schritte	Inputs	Stakeholder								Outputs	
			VL	AG	PL	PO	KTM	PMA	RL/ LB	PPM		GL
Teilprozess der Vorhabensplanung												
Prüfung der Idee auf Relevanz	- Ressortleiter bzw. Leiter Business-Einheit prüfen den strategischen Fit des Vorhabens	Erstansatz Vorhaben	M						V			geprüfte Vorhabensidee (m)
Grobplanung des Vorhabens im PM-Tool	- Vorhabensleiter erstellt Vorhaben-Steckbrief im PM-Tool	geprüfte Vorhabensidee	V				M					fertiger Vorhabenssteckbrief (m)
Entscheid des Gremiums (ggf. GL / AG bzw. PPA)	- Entscheid hinsichtlich Durchführungsweg (Projekt/ Maßnahme etc.) - Freigabe, Rückstellung bzw. Ablehnung des Vorhabens - bei Freigabe: Beauftragung der Feinplanung (bei VES: gemäß des genehmigten Budgetrahmens)	Agenda AG-Sitzung, Fertiger Vorhabenssteckbrief	V	M/ E			M				M/ E	Aktuelle Entscheidungen (k), Entscheidung weiteres Vorgehen bzgl. Vorhaben (k), freigegebener Vorhabenssteckbrief (m)
Überführung des Vorhabens im PM-Tool	- Statusanpassung des Vorhabenssteckbriefs gemäß der Entscheidung freigegeben, zurückgestellt oder abgelehnt - Projektklassifizierung gemäß Gremiums-Entscheid - Wahl des Vorgehensmodells	Protokoll der AG- bzw. LA-Sitzung	V				M					(Erstansatz) Projektsteckbrief
Erstellung Projektsteckbrief im PM-Tool	- Aktualisierung der überführten Texte aus dem Vorhabenssteckbrief - Umfeld- und Stakeholderanalyse - ggf. Korrektur der Key Facts aus der Grobplanung	(Erstansatz) Projektsteckbrief			V	M	M					aktualisierter Projektsteckbrief (m) --> gemäß der Grobplanung und der Gremiums-Entscheidung
Information an AIS & CON	- Weiterleitung des Projektsteckbriefs und des Sitzungsprotokolls an AIS & CON	aktualisierter Projektsteckbrief Sitzungsprotokoll			V	M				I		aktualisierte Projektportfolio-Übersicht
Teilprozess Projektstart												

Beschreibung Funktionendiagramm: V = Verantwortung; M = Mitarbeit; (M) = Mitarbeit (optional); E = Entscheidung; I = Information

Klassifizierung von Outputs: (m) = muss; (k) = kann

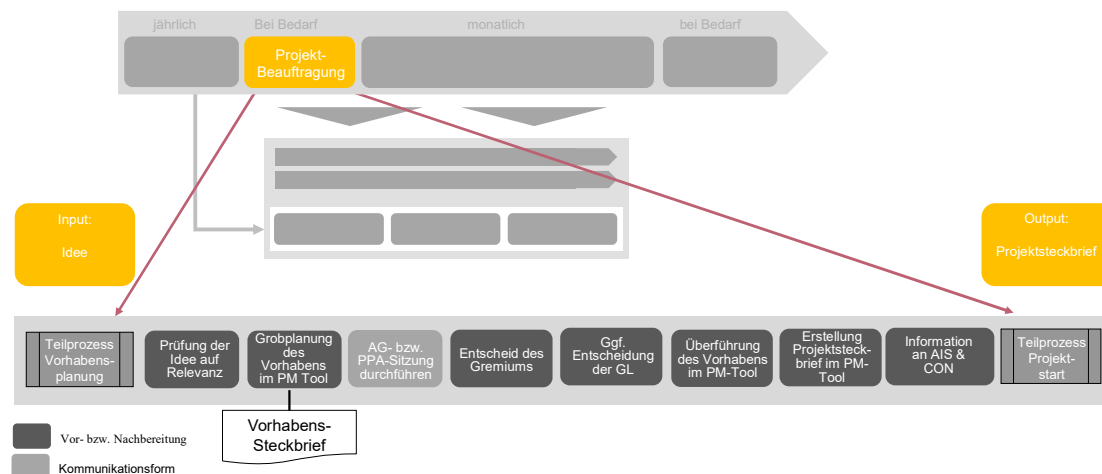

5.2.1.3

Projektmanagement Handbuch

Katrin Wegner, AIS-IMM

Detaillierte Prozessbeschreibung der Projekt- bzw. Maßnahmenbeauftragung

Version 1.0 vom 17.07.2024


Seite 41 von 50

5.2.1.4

Detaillierte Prozessbeschreibung des Projektstart-Prozesses

Teilprozess	Schritte	Inputs	Stakeholder									Outputs
			LA	AG	PL	PO	KTM	PMA	RL/ LB	PPM	GL	
PM-Planungs-Sitzungen vorbereiten	- Sammlung relevanter Themen - Erstellung der Agenda für die Planungssitzungen - Expertenschätzungen einholen	aktueller Projektsteckbrief			V	M	M					Agenda PM-Planungs-Sitzungen(k), Expertenschätzungen
PM-Planungs-Sitzungen durchführen	- Aktualisierung und Verfeinerung der Grobplanung - Erstellung Risikoanalyse - Ressourcenanalyse	Agenda zur Projektplanungs-Sitzung, Erstanatz ausgewählter PM-Pläne laut Methodenliste, Expertenschätzungen			V	M						aktualisierte PM-Pläne (m)
Ressourcenanforderung	- Abstimmung mit relevanten Ressourcenverantwortlichen hinsichtlich der Verfügbarkeit - Klärung von Abhängigkeiten zu bereits laufenden Themen	Ressourcenschätzung durch Kernteam und Experten; Ergebnisse der Abstimmungsgespräche mit Ressortleitern bzw. Leitern der Business Einheiten			V	M	M		M			aktualisierte Ressourceneingabe (m)
PM-Planung im PM-Tool aktualisieren	- Aktualisierung der PM Pläne im Tool (u.a. Balkenplan, Meileinstein-Planung, Risiken - Verfeinerung der Kosten- und Aufwandsplanung - Aktualisierung des Projektsteckbriefs - Finalisierung des Projektauftrags	Ergebnisse der PM-Planungs-Sitzungen			V	M						aktualisierte PM-Pläne (m), Fertiger Projekt-Steckbrief und -Auftrag (m)
AG-Sitzung durchführen - Abnahme Projektplanung	- Vorstellung PM Pläne und Organigramm - Abnahme des Projektvorgehens, des Projektsteckbriefs und des Projektauftrags	Agenda AG-Sitzung, PM Pläne aus PM-Tool, Projekt-Steckbrief und -Auftrag		M / E	V	M						Aktuelle Entscheidungen (k), finale PM Pläne (m), abgenommener Projektsteckbrief (m), unterschriebener Projektauftrag (m)
Info + ggf. Freigabe durch LA / GL	- Information des Lenkungsausschusses zum Projektvorgehen und den definierten Projektzielen - bei "Leuchtturm-Projekten" Empfehlung der zusätzlichen Freigabe durch die Geschäftsleitung - Projektstart-Workshop mit Projektbeteiligten	Fertiggestellte PM Pläne im PM-Tool, Finaler Projektsteckbrief, LA- bzw. GL-Foliensatz, Agenda für Projektstart-Workshop, Entscheidungen aus AG-Sitzung	E	V/ M E	M						E	Aktuelle Entscheidungen (k), Entscheidung weiteres Vorgehen bzgl. CR (k), ggf. freigegebener CR

Beschreibung Funktionendiagramm: V = Verantwortung; M = Mitarbeit; E = Entscheidung; I = Information
Klassifizierung von Outputs: (m) = muss; (k) = kann

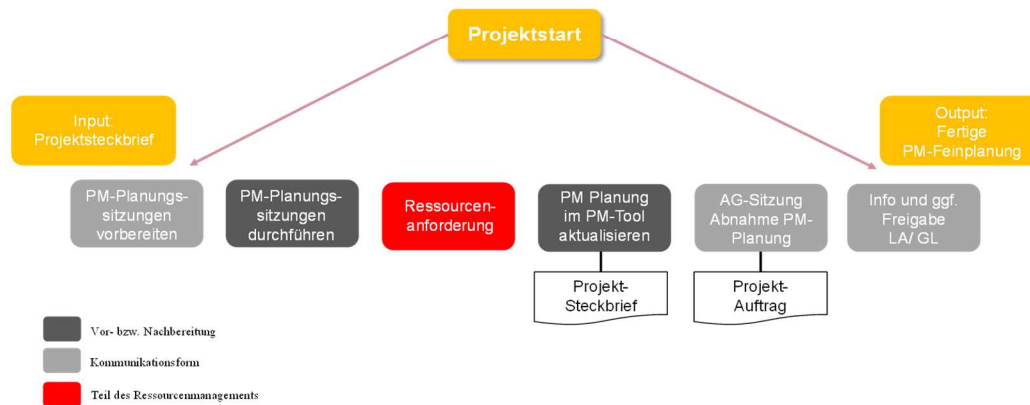


Teilprozess	Schritte	Inputs	Stakeholder										Outputs
			LA	AG	PL	PO	KTM	PMA	RL/ LB	PPM	GL		
Projektsteuerung-Sitzung vorbereiten	- Sammlung relevanter Themen - Erstellung der Agenda für die Projektsteuerungs-Sitzung	Ist-Aufwände im PM-Tool Meilensteinplan, Balkenplan, Ressourcenplan, Kostenplan, Risikanalyse, Statusbericht des Vormonats			V	M	M					Agenda Projektcontrolling-Sitzung (m)	
Projektsteuerung-Sitzung durchführen	- Abstimmung der Projektfortschritte - Abgleich Plan vs. Ist und ggf. Maßnahmen bei Planabweichungen definieren	Agenda Projektsteuerung-Sitzung: aktuelle Ist-Aufwände in Planisware Projektpläne letztes Controlling: IMeilensteinplan, Balkenplan, Ressourcenplan, Kostenplan, Risikanalyse			V	M	M					(Erstansatz) Statusbericht (k), Aktualisierte PM-Pläne in Planisware (m), Optional: Erstansatz CR (k)	
PM-Planung aktualisieren	- Aktualisierung vom Balkenplan, Meileinsteinplanung, Fertigstellungsgrad, Kosten- und Aufwandsplanung und kommentierung des Status Reports --> ggf. im Rahmen der Steuerungs-Sitzung	(Erstansatz) Statusbericht, Aktualisierte PM-Pläne in Planisware, Optional: Erstansatz CR			V	M						aktualisierte PM-Pläne (m), Fertiger Statusbericht (m), Fertiger CR (k)	
AG-Sitzung durchführen	- Sammlung relevanter Themen - Erstellung der Agenda für die Auftraggeber-Sitzung - Erstellung des Status Reports (und ggf. CR)	Agenda AG-Sitzung, Final aktualisierte PM-Pläne, Fertiger Statusbericht, Fertiger CR		M/ E	V							Aktuelle Entscheidungen (k), Entscheidung weiteres Vorgehen bzgl. CR (k), Freigegebener Statusbericht (m)	
Optional: LA-Sitzung durchführen	- Sammlung relevanter Themen - Erstellung der Agenda für die Lenkungsausschuss-Sitzung - Vorbereitung der LA-Präsentation und Entscheidungsfolien	Agenda LA-Sitzung, Final aktualisierte PM-Pläne, frei gegebener Statusbericht, eingereichter CR	M/ E	V/ M/ E	M							Aktuelle Entscheidungen (k), Entscheidung weiteres Vorgehen bzgl. CR (k), ggf. freigegebener CR	
Daten im PM-Tool anpassen	- Aktualisierung der PM-Pläne im PM-Tool (Balken-Meilensteinplanung; Kosten & Aufwände) gemäß der AG- bzw. LA-Entscheidungen - ggf. neue Baseline ziehen - ggf. Anpassung vom Projektsteckbrief	Bisherige PM Pläne: Meilensteinplan, Balkenplan, Ressourcenplan, Kostenplan, Risikanalyse Statusbericht, CR			V	M						Final aktualisierte PM-Pläne (m), aktualisierter Projektsteckbrief (m), ggf. neue Baseline (aufgrund CR) (k)	

Beschreibung Funktionendiagramm: V = Verantwortung; M = Mitarbeit; (M) = Mitarbeit (optional); E = Entscheidung; I = Information

Klassifizierung von Outputs: (m) = muss; (k) = kann

5.2.1.5 Detaillierte Prozessbeschreibung der Projektsteuerungs-Prozesse

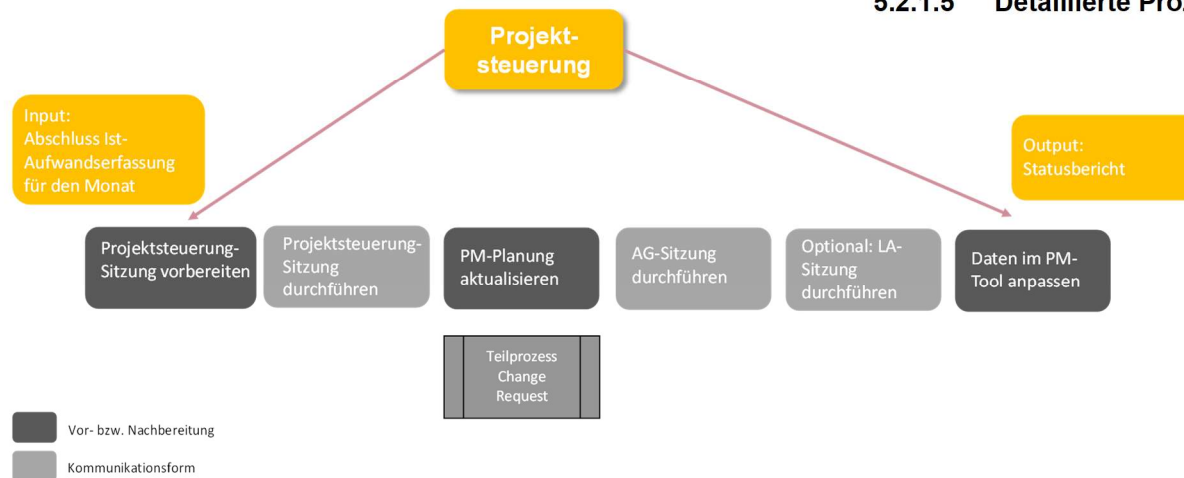


5.2.1.6

Detaillierte Prozessbeschreibung des Change Request-Prozesses

Teilprozess	Schritte	Inputs	Stakeholder									Outputs
			LA	AG	PL	PO	KTM	PMA	RL/ LB	PPM	GL	
Zeit, Kosten und Qualität mit genehmigter Planung abgleichen	- Abgleich der Kosten- und Aufwandsplanung mit den budgetierten Kosten und Aufwänden - Überprüfung der Termin- und Ablaufplanung sowie der inhaltlichen Projektziele (Plan vs. Ist)	Ist-Aufwände im PM-Tool (Erstansatz) Statusbericht, Aktualisierte PM-Pläne in Planisware, Meilensteinplan, Balkenplan, Ressourcenplan, Kostenplan, Risikoprüfung, Statusbericht des Vormonats			V	M	M					(Erstansatz) Change Request (k)
Planabweichungen hinsichtlich Ursache und Maßnahmen prüfen	- Analyse der Planabweichungen im Rahmen der Projektsteuerungssitzung	(Erstansatz) Change Request, Abweichungen zwischen Plan und Ist			V	M	M					Kommentierung von Ursache und Maßnahmen (k)
Planabweichungen im CR-Formular dokumentieren und kommentieren	- Change Request Erstellung im PM-Tool - Ampelanpassung im Tool	Informationen zur Höhe der Abweichungen sowie zu Ursachen und ergriffenen Maßnahmen			V	M						Fertiger CR (k), Aktualisierter Statusbericht
Change Request mit AG und ggf. LA abstimmen und entscheiden lassen	- Abstimmung und Entscheid zum eingereichten Change Request	Agenda AG-Sitzung, Final aktualisierte PM-Pläne, Fertiger CR	M E	M E	V							Aktuelle Entscheidungen (k), Entscheidung weiteres Vorgehen bzgl. CR (k), freigegebener Status Report (m), freigegebener CR (m)
PPM über LA/ AG- Entscheid informieren	- Information des (Teil-) Projektportfoliomanagements zum CR-Entscheid	Protokoll der AG- bzw. LA-Sitzung			V	M				I		
Daten im PM Tool anpassen	- Aktualisierung der PM-Pläne im PM-Tool (Balken-Meilensteinplanung; Kosten & Aufwände) gemäß der CR-Entscheidung (Genehmigung/ Teilgenehmigung/ Ablehnung); CR-Baseline ziehen - Anpassung vom Projektsteckbrief	Bisherige PM Pläne: Meilensteinplan, Balkenplan, Ressourcenplan, Kostenplan, Risikoprüfung, Statusbericht, CR			V	M						Final aktualisierte PM-Pläne (m), aktualisierter Projektsteckbrief (m), ggf. neue Baseline (aufgrund CR) (k)

Beschreibung Funktionendiagramm: V = Verantwortung; M = Mitarbeit; (M) = Mitarbeit (optional); E = Entscheidung; I = Information

Klassifizierung von Outputs: (m) = muss; (k) = kann

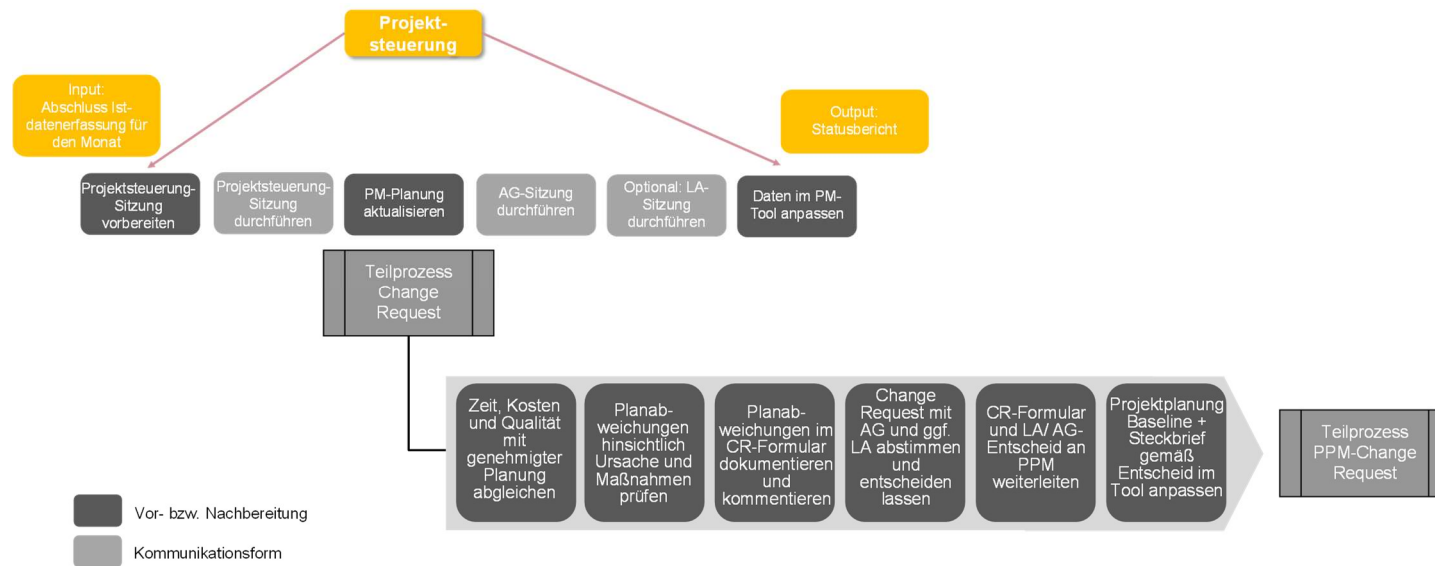


5.2.1.7

Detaillierte Prozessbeschreibung des Projektabschluss-Prozesses

Teilprozess	Schritte	Inputs	Stakeholder								Outputs	
			LA	AG	PL	PO	KTM	PMA	RL/ LB	PPM		GL
Abnahme von Lieferobjekten durch die Linie vorbereiten	- Abstimmung mit Kernteam zu offenen Punkten	aktuelle PM-Pläne in Planisware			V	M	M					finaler Stand der Liefergegenstände (m), Finaler Stand der Fertigstellungsgrade (k)
Übergabe an die Linie durchführen	- Übergabegespräch mit Linienverantwortlichen	Finaler Stand der Liefergegenstände			V	M	M		M/ E			Übergabe- bzw. Abnahmeprotokoll (m),
Projektabschluss-Workshop vorbereiten	- Sammlung relevanter Themen - ggf. Feedback von Projektmitarbeitern einholen - Erstellung der Agenda für den Projektabschluss-Workshop	Übergabeprotokoll, aktuelle PM-Pläne in Planisware (u.a. Phasen, Teilprojekte bzw. APs erhalten Ist-Ende-Datum)			V	M	M					finaler Stand Ist-Aufwände in Planisware (m), Finaler Stand der PM-Pläne (m)
Projektabschluss-Workshop durchführen	- ggf. Lessons Learned durchführen (Erfahrungsbericht im Tool ausfüllen) - Projektabschlussbericht ausfüllen	Agenda Projektabschluss-Workshop, finaler Stand Ist-Aufwände, Finaler Stand PM-Pläne, Risikoanalyse, Meilensteine, Balkendiagramm, etc.			V	M	M	(M)				Projektanalysen (m), Erstansatz Projektabschlussbericht (k), ggf. Lessons Learned (k)
Abschließende AG-Sitzung (LA-Sitzung) durchführen	- Vorstellung der finalen PM Pläne, ggf. der Projektanalysen und des Projektabschlussberichts - Unterschriften einholen - offizielles Projektende bestätigen lassen	Agenda AG-Sitzung, Letztstand PM Pläne, Fertiger Projektabschlussbericht inkl. Projektanalysen		E	V							Abnahme des Projekts durch den AG (m), unterschriebener Projektabschlussbericht (m)
Finalisierung Projektdokument, Projektablage	- Projektdokumente finalisieren und ggf. unterschreiben lassen (z.B. Abschlussbericht) - finale Projektdokumente im Teams-Ordner ablegen - Projektablage auf Vollständigkeit prüfen	Aktuelle Projektablage in Teams			V	M						alle relevanten Projekt-Dokumente sind gemäß dem PM-Handbuch in der Projektablage abgelegt (m)
Info an PPM und Projektschließung	- Information per Mail, dass abschließende AG-Sitzung stattgefunden hat und Projektende bestätigt wurde - Prüfung durch PPM bzgl. Vollständigkeit der Dokumentenablage - Projektende-Datum im PM-Tool setzen	Unterschriebener Projektabschlussbericht			M					V		Abnahme des Projekts durch PPM und Projektbeendigung im PM-Tool (m)

Beschreibung Funktionendiagramm: V = Verantwortung; M = Mitarbeit; (M) = Mitarbeit (optional); E = Entscheidung; I = Information

Klassifizierung von Outputs: (m) = muss; (k) = kann

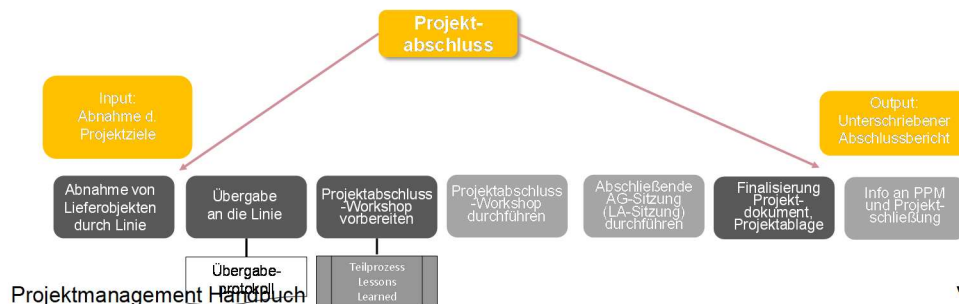

Projektmanagement Handbuch

Version 1.0 vom 17.07.2024


Kat. **Wegner-AIS-IMM**

Seite 47 von 50

Kommunikationsform


5.2.1.8

Liefergegenstände beim sequenziellen Vorgehensmodell

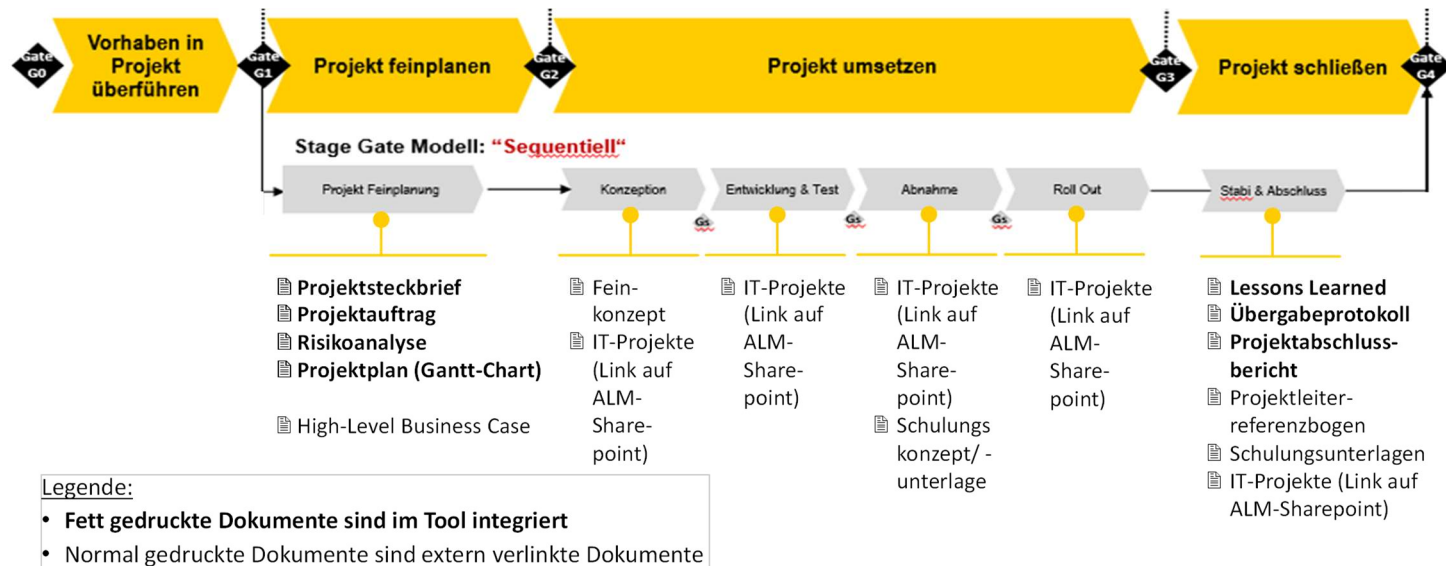

5.2.1.9

Liefergegenstände beim iterativen Vorgehensmodell

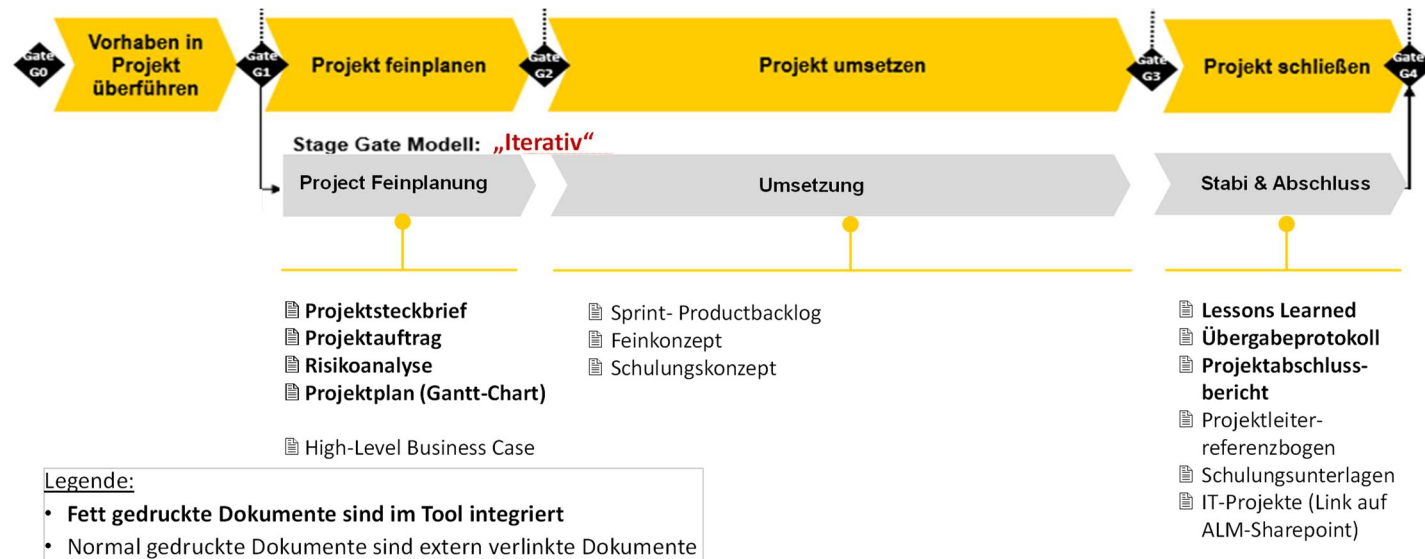

5.2.1.10

Übersicht wichtiger Stichtage und der dazugehörigen Aktionen

Zeit	System	Aktion	Workflow	Hinweise
bis 2. Werktag des Folgemonats (Empfehlung 1x pro Woche)		Erfassung der Ist-Aufwände im Projekt mindestens auf Phasen-Ebene		Projekt-mitarbeitende
Am 10. Kalendertag eines Monats (keine Berücksichtigung, ob WE oder Feiertag)	Aufforderung zur Erstellung des Statusberichts		- Standard-Mail an PLs - Workbox (mit Link zum Projekt)	PLs mit mehreren Projekten erhalten mehrere <u>Workbox</u> -Einträge
bis 10. Werktag des Folgemonats		- Durchführung der Projektsteuerungssitzung - Abstimmung mit <u>RV's</u> bei Verschiebungen - Aktualisierung der Projektpläne im Tool - Abstimmung der aktuellen Planung, des Statusberichts (und ggf. des CR) mit AG		
Am 13. Kalendertag eines Monats (keine Berücksichtigung, ob WE oder Feiertag)	<u>Reminder</u> zur Abgabe der Statusberichte	- ggf. Anpassung der Projektpläne im PM-Tool gemäß der AG-Abstimmung - Finalisierung des Statusberichts	- Standard-Erinnerungs-Mail an PLs	Kein <u>Reminder</u> durch <u>Workboxen</u> !
Am 15. Kalendertag eines Monats (keine Berücksichtigung, ob WE oder Feiertag)	„Freeze“ der Statusreporte			Admin kann den Bericht freischalten!
25. Werktag des Folgemonats	<u>Reminder</u> zur Erfassung der Ist-Aufwände		Standard-Mail an Projektmitarbeitende	Kein <u>Reminder</u> durch <u>Workboxen</u> und keine Links!
