

ADAC

Richtlinie

Projektmanagement

in der

ADAC SE

Version 1.1 vom 30.11.2017

Inhalt

1	Präambel	3
2	Geltungsbereich	3
3	Definition Projekt.....	4
4	Verbindliche Projektdokumente	5
5	Zentrale und projektübergreifende Verfahren	7
	5.1 Projektkosten.....	7
	5.2 Freigabe von Projekten.....	7
	5.3 Monitoring von Projekten	8
	5.4 Generelle Regelung.....	9
6	ADAC Project Management Office	9
	6.1 ADAC Project Management Office (ADAC PMO)	9
	6.2 Project Management Office eines Ressorts (Ressort PMO).....	10
7	Projektorganisation.....	11
	7.1 Der Auftraggeber	13
	7.2 Der Lenkungsausschuss.....	14
	7.3 Der Projektleiter	15
	7.4 Das Projektteam	15
	7.5 Projektassistenz (Projektunterstützung).....	16
8	Auswahl und Qualifizierung/Zertifizierung für Projektleiter	16
	8.1 Ausgangslage und Zielsetzung	16
	8.1.1 Ausgangslage	16
	8.1.2 Zielsetzung.....	16
	8.2 Einstufung von Projekten und Anforderungen an Projektleiter/Teilprojektleiter	17
	8.3 Entwicklungssystematik der Projektleiterauswahl für Projekte der Stufe 3	17
	8.4 Einrichtung eines Projektleiterpools	18
	8.5 Neu eingestellte Mitarbeiter mit bereits vorhandener PL-Erfahrung, die außerhalb des ADAC erworben wurde.....	18
	8.6 Externe Projektleiter	18
	8.7 Projektmanagement Beratung, Mentoring, Projektleiter Coaching	18
	Versionshistorie	19

1 Präambel

Viele innovative und komplexe Aufgaben, denen sich der ADAC stellen muss, werden in Projekten bearbeitet.

Dabei ist oberstes Ziel, die Projekte im ADAC effektiv und kostengünstig durchzuführen und sie zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Ziel des Projektmanagements im ADAC ist es:

- Transparenz über laufende Projekte zu gewährleisten
- Klarheit über Verantwortung und Einbindung der beteiligten Rollen
- Leitplanken und Standards für die Abwicklung von Projekten bereit zu stellen.
- Sicherstellen, dass nur Personen die Projekt- und Teilprojektleitung für ein Projekt/Teilprojekt übernehmen dürfen, die über die entsprechenden Erfahrungen und Kompetenzen verfügen (Auswahl, Qualifizierung und Zertifizierung, siehe Kapitel 9)

Die Richtlinie Projektmanagement im ADAC ermöglicht:



1. Einen schnellen Überblick über die vorgegebenen Regularien
2. Eine definierte Zuordnung von Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Aufgaben in Projekten
3. Die Festlegung einer angemessenen und wirksamen Projektorganisation
4. Ein standardisiertes Vorgehen bei der Planung, Organisation und Steuerung von Projekten
5. Ein Verfahren zur Auswahl, Qualifizierung und Zertifizierung von Projektleitern

Alle in der Richtlinie vorgestellten Themen finden Sie auch im ADAC-Intranet unter der Rubrik **„Projektmanagement“**

2 Geltungsbereich

Die Anwendung dieser Richtlinie zum Projektmanagement ist für alle Projekte in der ADAC SE und deren jeweils mehrheitlich verbundenen Tochterunternehmen, im Folgenden „ADAC“ genannt, verbindlich.

Ausnahmen sind durch den Vorstand der ADAC SE zu genehmigen.

Für alle in dieser Richtlinie aufgeführten Angaben zum „ADAC Projektmanagement Office“, im Folgenden auch „ADAC PMO“ genannt, beziehen sich für die **mehrheitlich verbundenen Tochterunternehmen** auf den im Produkt- und Leistungskatalog zu den Leistungsvereinbarungen im Rahmen des Servicevertrags beschriebenen Leistungen des ADAC SE – Leistungserbringers: ADAC Project Management Office (ADAC PMO).

Richtlinie Projektmanagement im ADAC

Für die ADAC SE selbst gilt, dass die Umsetzung dieser Richtlinie und die Einhaltung der Standards während der Planung und Steuerung von Projekten vom ADAC Projektmanagement Office in der ADAC SE (im Folgenden auch „ADAC PMO“ genannt) in Zusammenarbeit mit den Ressort-PMO's verantwortet (Definition PMO siehe Kapitel 7) wird.

Alle in dieser Richtlinie genannten Währungsbeträge verstehen sich ohne Umsatzsteuer.

3 Definition Projekt

Kriterium	Merkmal
1) Einmaligkeit, relative Einmaligkeit der Aufgabenstellung	- relative Einmaligkeit, da z.B. Produkteinführungen nach ähnlichen Prozessschritten ablaufen - keine sich wiederholende Standardaufgabe des operativen Geschäfts - Neuartigkeit
2) komplexe Aufgabenstellung und Zielvorgabe	- hoher Planungs- und Durchführungsaufwand - teilweise bereichsübergreifende interdisziplinäre Aktivitäten - hoher Koordinationsaufwand, Schnittstellenmanagement erforderlich - Strukturiertes Vorgehen durch die Bündelung von Teil-Aktivitäten in Arbeitspaketen - Lösungsweg häufig nicht eindeutig
3) zeitliche Begrenzung	- Anfang und Ende des Projektzeitraums sind klar definiert - keine dauerhafte Tätigkeit
4) finanzielle Begrenzung	Zur Erfüllung der Aufgabe wird ein konkretes Budget ermittelt und freigegeben
5) projektspezifische Organisation	Ernennung eines Projektleiters, Zusammenstellung eines Projektteams
6) besondere Bedeutung	- Projektziel ist für die Performance des operativen Geschäfts sehr wichtig - Hoher politischer oder strategischer Stellenwert für das Gesamtunternehmen
7) innovativ / risikoreich	- Zur Aufgabenerfüllung sind neue, innovative Prozesse erforderlich - Die Zielerreichung ist mit einem hohen Risikofaktor verbunden (z.B. Fehleranfälligkeit eines neuen Systems, Zielkonflikt durch Abhängigkeit zwischen Projekten) - Eine Verzögerung führt zu außerordentlichen Kosten (z.B. Konventionalstrafe, Systemausfallkosten, etc.)

Die Kriterien 1) bis 5) müssen alle erfüllt sein, damit ein Vorhaben den Status eines Projektes erhält. Die Kriterien 6) und/oder 7) sind ergänzend um die besondere Bedeutung eines Projekts für den ADAC hervorheben zu können.

Richtlinie Projektmanagement im ADAC

Das ADAC Project Management Office unterstützt bei der Klärung, ob die genannten Kriterien für ein Vorhaben zutreffen oder nicht.

Es gilt standardmäßig folgende Kategorisierung von Projekten (alle Beträge verstehen sich ohne Umsatzsteuer):

Projekt der Stufe 1:	Projektkosten	ab 50 bis 200 T€
Projekt der Stufe 2:	Projektkosten	über 200 bis 1 Mio T€
Projekt der Stufe 3:	Projektkosten	über 1 Mio € bzw.

Die Zusammensetzung der Projektkosten sind unter 5.1. Projektkosten geregelt

Ein Projekt darf nur durch einen jeweilig eingestuften Projektleiter geleitet werden (siehe Kapitel 9 „Auswahl und Qualifizierung/Zertifizierung für Projektleiter“).

Ein zuständiges Vorstandsmitglied der ADAC SE kann unabhängig von dieser Budgetgrenze festlegen, ob ein Vorhaben als Projekt der Stufen 1-3 definiert wird oder nicht.

4 Verbindliche Projektdokumente

Verbindliche Projektdokumente bilden den Rahmen des Projekts und dokumentieren den Fortschritt im Verlauf. Änderungen am Projektrahmen werden bewusst entschieden und dokumentiert. Mit der Freigabe der Projektabschlussklärung ist das Projekt beendet.

Folgende Dokumentationen sind verbindlich zu erstellen:

- Projektantrag
- Projektauftrag
- Change Request (nur bei Änderung an Inhalten des Projektauftrag)
- Projekt Reporting (siehe 6.2 Reporting, zur Zeit: in ELSTAR)
- Projektabschlussklärung
- Projekterfahrungsbericht
- Projektleiterreferenz

Vorlagen siehe im Intranet unter „Projektmanagement“.

Die Planung und Steuerung des Projekts ist wesentlich von den Inhalten des Projektauftrags abhängig. Dem Projektauftrag kommt eine besondere Bedeutung zu, damit der Projektfortschritt berichtet, Änderungen eingebracht und die Zielerreichung festgestellt werden können.

Wesentliche Inhalte des **Projektantrags** sind:

- Grobe Beschreibung der übergeordneten Ziele und erwarteter Nutzen des Vorhabens
- Grober Projektinhalt: Projektziele, Liefer- und Leistungsumfang, Abgrenzung
- Grobe Termine
- Grobe Personalkapazitäten
- Erste erkannte Risiken
- Erste Version der Projektorganisation
- Datum und Unterschriften

Wesentliche Inhalte des **Projektauftrags** sind:

- Beschreibung der übergeordneten Ziele und erwarteter Nutzen des Vorhabens
- Projektinhalt: Projektziele, Liefer- und Leistungsumfang, Abgrenzung
- Termine
- Personalkapazitäten
- Risiken
- Projektorganisation (incl. der Beschreibung von Projektrollen, die nicht in dieser Richtlinie beschrieben (siehe Kapitel 8 „Projektorganisation“) sind.
- Freigabedatum und Unterschriften

Wesentliche Inhalte des **Change Request** sind:

- Bezeichnung der beantragten Änderung
- Ausgangslage
- Beschreibung des Changes (ggf. inkl. Varianten) inkl. Auswirkung auf Leistungsergebnisse, Kosten, Ressourcen und Termin
- Beschlussempfehlung
- Freigabedatum und Unterschriften

Wesentliche Inhalte der **Projektabschlusserklärung** sind:

- Zielerreichung
- Termine, Personalkapazitäten und Kosten
- Kurz-Zusammenfassung des Projektes
- Weiteres Vorgehen (evtl. Folgeprojekte)
- Projektabschluss und Unterschriften

Wesentliche Inhalte des **Projekterfahrungsberichts** sind:

- Projektverlauf
- Lessons learned
- Risikobetrachtung

Wesentliche Inhalte der **Projektleiterreferenz** sind:

- siehe Gesamtbetriebsvereinbarung „Auswahlverfahren und Qualifizierung für Projektleiter“

5 Zentrale und projektübergreifende Verfahren

5.1 Projektkosten

Projektkosten setzen sich zusammen:

- § Externe Kosten (die durch Liefer- und/oder Leitungsbezug außerhalb des Verbundes der ADAC-Säulen und Gesellschaften verursacht werden)
- § Kosten der SE-Serviceeinheiten (auf Basis von Einzelbeauftragungen. Nicht pauschal sondern themenbezogen)
- § Kosten der Projektorganisation (z.B. Bewirtungskosten)

Mit Projektfreigabe sind nicht automatisch auch alle Sachmittel (z.B. Berateraufträge) freigegeben. Für deren Beschaffung/Beauftragung ist nach wie vor eine Einzelfreigabe gemäß Unterschriftenregelung einzuholen.

Zu erwartende Betriebskosten des Projektergebnisses (z.B. bei IT-Systemen) zählen nicht zu den Projektkosten, werden aber im Projektauftrag aufgeführt, bzw. im Verlauf des Projektes geklärt.

Nicht zu verrechnende Kosten, sind die Kosten von z.B. Stabseinheiten, z.B. Gewerbeeinheiten, des ADAC e.V. und der ADAC Stiftung. Hier wird von der Verrechnung abgesehen, da grundsätzlich im Eigeninteresse eine Mitarbeit erfolgt.

5.2 Freigabe von Projekten

Alle Projekte im ADAC unterliegen einer formellen Freigabe.

Die Freigabe erfolgt, auf der Basis des Projektauftrages und der unter 5.1. genannten Projektkosten, nach folgenden Wertgrenzen (alle Beträge verstehen sich ohne Umsatzsteuer):

Wertgrenzen	freigabeberechtigt
bis 200 T€	Leiter einer Geschäftseinheit (Ressortleiter)
über 200 T€	zuständiges Vorstandsmitglied der ADAC SE

Die Freigabe von Projekten ist immer durch den Auftraggeber zu erwirken.

Vor Projektfreigabe ist eine Qualitätssicherung des Projektauftrages durch das ADAC PMO oder ein Ressort-PMO durchzuführen.

5.3 Monitoring von Projekten

Projekte werden generell im Projekt Reporting Tool (zurzeit: ELSTAR) eingetragen und es erfolgt monatlich, jeweils spätestens bis zum siebten Arbeitstag, eine Statusmeldung durch den Projektleiter, welcher durch den Auftraggeber bis zum zehnten Arbeitstag kommentiert wird.

Die operative Projektsteuerung erfolgt durch den Projektleiter in Zusammenarbeit mit seinen Arbeitspaketverantwortlichen und Teilprojektleitern, das Projektcontrolling in Zusammenarbeit mit dem Fachbereichscontroller des Auftraggebers.

Der Projektleiter informiert formal den Auftraggeber durch die monatliche Projektstatusberichte.

Der Auftraggeber stellt das Projekt nach außen im Reporting dar, durch seine Einschätzung des Projektstandes (zurzeit: in ELSTAR), bezogen auf die Key Parameter

- „Termintreue“
- „genehmigte Projektkosten“
- „Verfügbarkeit der benötigten Personalressourcen“
- „Qualität der zu liefernden Leistung“

Die Einschätzungen des Projektstandes erfolgen unter Anwendung folgender Ampellogik:

- § **Grün:** das Projekt läuft komplett innerhalb der abgestimmten Key Parameter, Maßnahmen sind höchstens innerhalb der Umsetzung erforderlich, die aber zu keiner Gefährdung der Key Parameter führen.
- § **Gelb:** die Einhaltung der Key Parameter ist gefährdet, mit geeigneten Gegenmaßnahmen kann jedoch davon ausgegangen werden, dass eine Umsetzung noch innerhalb der Parameter möglich ist
- § **Rot:** die Key Parameter können voraussichtlich nicht eingehalten werden oder wurden bereits nicht eingehalten, eine Kompensation ist nicht mehr möglich oder unwahrscheinlich.

Um Transparenz über die Projekte ab der Stufe 2 im ADAC zu schaffen, fließen die Projektedaten aus den Statusberichten in eine monatliche Projektübersicht für den Vorstand der ADAC SE.

5.4 Generelle Regelung

Der Auftraggeber veranlasst die Übermittlung folgender Projektdokumente (unabhängig von Wertgrenzen) an das ADAC-, bzw. Ressort- Project Management Office:

- § Projektauftrag (vor Freigabe zur Qualitätssicherung): Das verbindliche Projektdokument ist gemäß Vorlage (siehe Intranet) zu erstellen.
- § Statusbericht (monatlich zu erstellen bis spätestens zum siebten Arbeitstag und kommentiert bis spätestens zum zehnten Arbeitstag des Folgemonats)
Dieser wird elektronisch mit dem Projekt Reporting System (zurzeit: ELSTAR-System) vom Projektleiter in Abstimmung mit dem Auftraggeber des Projekts erzeugt.
Ein Projektstatusbericht (zurzeit: ELSTAR-Bericht) ist ab dem faktischen Projektstart oder bei Entstehung der ersten – auch internen – Kosten zu erstellen, auch wenn noch kein unterschriebener Projektauftrag vorliegt.
- § Projektabschlusserklärung (vor Freigabe zur Qualitätssicherung), Projekterfahrungsbericht und Projektleiter-Referenz sind verbindliche Projektdokumente und gemäß Vorlage (siehe Intranet) zu erstellen.

6 ADAC Project Management Office

6.1 ADAC Project Management Office (ADAC PMO)

Das ADAC Project Management Office unterstützt bei der Umsetzung der Standards dieser Richtlinie.

Für die **mehrheitlich verbundenen Tochterunternehmen** gelten die Aufgaben des ADAC PMO nicht wie folgt, sondern wie im Servicevertrag mit der ADAC SE geregelt (siehe Rubrik 2 „Geltungsbereich“)

Für die ADAC SE selbst ist das ADAC PMO für die Projektmanagementkonzepte und Standards verantwortlich, bildet damit die Klammer über alle Aspekte des Projektmanagements im ADAC und hat folgende Aufgaben.

Aufgaben:



- § Gibt Standards zu Projektmanagement und Projektleitung vor und fordert diese ein.
- § Support, Beratung und Coaching für Projekte
- § Weiterentwicklung des PM-Konzepts, Bereitstellung von PM-Tools
- § Bereitstellen von PM-Schulungen
- § Zentrale Sammlung und Qualitätssicherung der Projektaufträge, Change Request und Projektabschlusserklärungen.
- Führt auf Anfrage des Projektleiters eine Projektstartberatung durch
- § Fordert fehlende Statusberichte ein
- § Übernimmt nicht die Einsatzplanung von aufgeführten Projektleitern.
- § Verantwortet den Beraterpool für Projektmanagement und berät die Projektleiter bei der Auswahl der Berater.
- § Listet den Projektleiterpool für Projekte/Teilprojekte > 1 Mio. € und achtet auf Vollständigkeit und Aktualität
- § Ist verantwortlich für die Kommunikation/Information rund um das Thema Projektmanagement (z.B. ADAC Intranetauftritt „Projektmanagement“).
- § Für Ressorts ohne eigenes PMO, übernimmt das ADAC PMO dessen Verantwortlichkeiten (siehe z.B. Gliederungspunkt 7.2)

Das ADAC Project Management Office

hat gegenüber den Projekten ein Kontrollrecht bezüglich der Einhaltung der verabschiedeten Richtlinien und hat die Befugnis über etwaige Eskalationsfälle im Vorstand der ADAC SE zu berichten.

Die Aufgaben und die Verantwortung des ADAC Project Management Office (ADAC PMO) werden durch das in der ADAC SE angesiedelte ADAC PMO wahrgenommen. Der Leistungsumfang ist im „Produkt- und Leistungskatalog zu den Leistungsvereinbarungen im Rahmen des Servicevertrages“ mit der ADAC SE beschrieben.

6.2 Project Management Office eines Ressorts (Ressort PMO)

Ein Ressort PMO ist ein mögliches, zusätzlich durch ein Ressort bereitgestelltes PMO, welches sich in seinem Leistungsprofil noch detaillierter die Belange eines Ressorts unterstützt, z.B.:

Aufgaben:



- § Führung des <<Bezeichnung Ressort-Projektleiterpools im Hinblick auf Vollständigkeit und Aktualität.
- § Informiert das ADAC PMO turnusmäßig über Änderungen im Projektleiterpool für Projektleiter der Stufe 3.
- § Qualitätssicherung der Projektaufträge, Change Request und Projektabschluss-erklärungen aus dem Ressort.
- § Sind an die in dieser Richtlinie vereinbarten Standards zum Projektmanagement sowie die evtl. darüber hinausgehenden im jeweiligen Bereich vereinbarten Standards gebunden.
- § Arbeiten eng mit dem ADAC PMO zusammen (z.B. bzgl. Beraterpool, Mentoring, Schulung, Meldung der Potenzialkandidaten für Stufe 3).

7 Projektorganisation

Projekte werden in der Regel zusätzlich zu den Routineaufgaben bearbeitet und benötigen ebenso wie die Linienarbeit eine Organisation (Rahmen), um das zielgerichtete Zusammenwirken aller am Projekt Beteiligten zu ermöglichen und die schnelle und flexible Bearbeitung komplexer Aufgaben zu gewährleisten.

Da die meisten Projektmitarbeiter in der Linie und im Projekt (und hier eventuell mit veränderten Kompetenzen!) mitarbeiten, werden im Besonderen die Zuständigkeiten innerhalb des Projektes als auch gegenüber der Linienorganisation in dieser Richtlinie geklärt.

Wesentliche Aufgaben in einem Projekt können nur durch das Zusammenspiel von übergeordnetem Management, Projektleitung und dem Linienmanagement, das die Projektmitarbeiter zeitlich begrenzt zur Verfügung stellt, bewältigt werden.

Um Reibungsverluste und Zeitverzögerungen im Projekt zu minimieren, gilt es:




- § eine klare Zuordnung von Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen zu schaffen.
- § die Zusammenarbeit, Kommunikation und die Abstimmung der am Projekt Beteiligten zu steuern.
- § eine schnelle Anpassung der Projektorganisation an geänderte Rahmenbedingungen oder Ziele zu gewährleisten.

Eine Projektorganisation besteht aus dem Auftraggeber, ggfs. einem weiteren Entscheidungsgremium (siehe 8.2 Lenkungsausschuss), einem Projektleiter und dem Projektteam.

Dies gewährleistet, dass Projekte vergleichbar aufgebaut und Verantwortung und Kompetenzen klar definiert und verteilt sind.

Der Projektleiter ist erster Ansprechpartner bei Problemen und Störungen in den Teilprojekten. Bei allen außerhalb des Projektes zusätzlich konsultierten Abstimmungsgremien muss der Auftraggeber und Projektleiter über die Ergebnisse umgehend informiert und idealerweise eingebunden werden.

Projektrollen die im Folgenden nicht aufgeführt sind, müssen in den jeweiligen Projektaufträgen zusätzlich definiert werden (z.B. Sponsor, Steuerungskreis, Sounding Board, Projektsteuerer, etc).

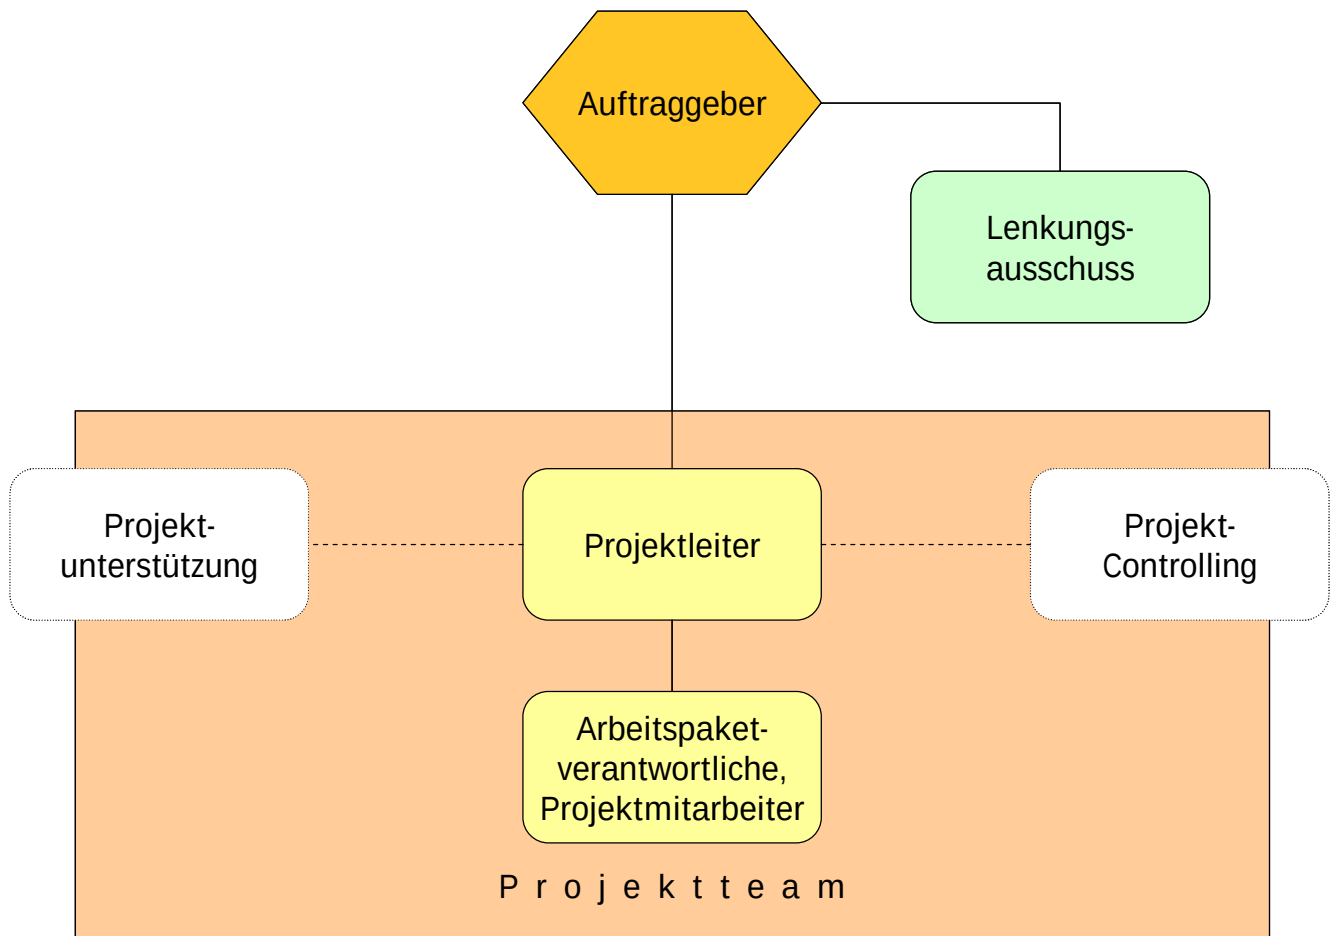

Die Besetzung des Projektteams erfolgt derart, dass alle zur Erfüllung der zugeordneten Aufgaben notwendigen Kompetenzen vertreten sind.

7.1 Der Auftraggeber

Der Auftraggeber erkennt für sich einen Projektbedarf, veranlasst die Freigabe und gibt das Projekt in Auftrag. Somit ist der Auftraggeber Kunde im klassischen Kunden – Lieferanten - Verhältnis. Vertragsgrundlage ist der Projektauftrag.

Ohne klaren Auftraggeber kein Projekt!

Der Auftraggeber eines Projektes ist Initiator, Promotor, Geldgeber und Entscheider.

Die Auftraggeberrolle wird von einer Person wahrgenommen. Auftraggeber kann jede Führungskraft sein. In Fällen, in denen Projekte von Gremien initiiert werden, wird die Auftraggeberrolle ebenfalls mit einer Einzelperson besetzt. Diese übernimmt die Auftraggeberrolle „in Vertretung“ oder „im Auftrag“ des Gremiums.

Der Auftraggeber ist verantwortlich für Kosten und Nutzen und damit für die Wirtschaftlichkeit eines Projekts.

Aufgaben:



- § Projektleiter berufen unter Berücksichtigung des Kapitel 9 Auswahl und Qualifizierung/Zertifizierung für Projektleiter
- § Auftragsklärungsgespräche führen
- § Für die Bereitstellung des Budgets und die Freigabe des Projekts sorgen
- § Ggfs. Lenkungsausschuss bilden (der Auftraggeber hat den Vorsitz)
- § Mitglieder des Lenkungsausschusses zu Promotoren des Projektes machen
- § Projekt beauftragen (Projekthalt, Projektbudget, Termine)
- § Projekt nach außen vertreten
- § Gibt ggf. Änderung des Projektauftrags frei
- § Unterstützung des Projektleiters bei der Ressourcenbeschaffung
- § Regelmäßige Abstimmung mit dem Projektleiter
- § Einschätzung des Projektstandes zum Statusbericht des Projektleiters im Projekt Reporting (zurzeit in ELSTAR) abgeben
- § Höchste Eskalationsstufe sein
- § Projektergebnis abnehmen
- § Projekt offiziell abschließen
- § Projektleiter-Referenz ausstellen

7.2 Der Lenkungsausschuss

Der Lenkungsausschuss ist die Beratungs-, Koordinations- und Schlichtungsinstanz eines Projektes. Er kann für die Dauer eines Projektes vom Auftraggeber gebildet werden und sollte sich aus Auftraggeber und den beteiligten Bereichen zusammensetzen. Im Lenkungsausschuss stehen Fachdiskussionen nicht im Vordergrund, diese werden im Projektteam geführt.

Aufgaben:	Profil des Lenkungsausschusses in der Zusammensetzung seiner Mitglieder:
 § klare Zieldefinition des Projektes mit dem Auftraggeber und dem Projektleiter erarbeiten / abstimmen	§ eine dem Umfang und dem Inhalt des Projektes entsprechende Entscheidungsbefugnis (Personal- und Sachmittel sowie strategische Entscheidungen)
§ Personalressourcen sicherstellen	§ fachliche Kompetenz zur Erfüllung der Aufgaben
§ Entscheidungen treffen	
§ Stolpersteine aus dem Weg räumen	
§ Zwischenergebnisse (Meilensteine) abnehmen	
§ Änderung des Projektauftrags, Weiterführung oder Abbruch des Projektes freigeben bzw. entscheiden	
§ Das Projekt im eigenen Bereich und nach außen vertreten	
§ Die Umsetzung oder Nutzung der Projektergebnisse sicherstellen	

Der Lenkungsausschuss soll grundsätzlich so „tief“ wie möglich (Nähe zum Projekt) und so „hoch“ wie nötig (Linienkompetenz) angesiedelt sein. Bei der Bildung des Lenkungsausschuss ist zu versuchen, die bestmögliche Mischung aus diesen beiden Kriterien zu erreichen, um zu gewährleisten, dass das Gremium seiner Hauptaufgabe und Verantwortung – Entscheidungen zu treffen – nachkommen kann.

Mitglieder im Lenkungsausschuss sind in der Regel:

- der Auftraggeber, der auch den Vorsitz inne hat
- der Projektleiter (berichtet aus dem Projekt, hat kein Stimmrecht)
- ein Vertreter je am Projekt beteiligter Auftragnehmerressort
- ein Vertreter je am Projekt beteiligter Fremdfirma (optional, entscheidet der Auftraggeber)

Bei Bedarf kann der Kreis erweitert werden.

7.3 Der Projektleiter

Dem Projektleiter kommt die verantwortliche Leitung eines Projektes zu, insbesondere bzgl. inhaltlicher und terminlicher Ausgestaltung (Managen von Qualität, Zeit und Kosten; Planungs-, Steuerungs- und Überwachungsaufgaben).

Der Projektleiter hat keine disziplinarische Kompetenz – er ist fachlich weisungsbefugt. Damit die Projektarbeit effektiv durchgeführt werden kann, muss der Projektleiter Rahmenbedingungen schaffen, in denen jeder Mitarbeiter seine persönliche Rolle und Verantwortung erkennt.

Der Projektleiter verantwortet die professionelle Projektdurchführung, sowie die Einhaltung von Kosten, Terminen und Lieferumfang/Qualität. Er kommuniziert in erster Linie mit dem Auftraggeber.

Aufgaben:



- § Auftrag klären
 - ø Ausgangslage klären
 - ø Eine klare Zieldefinition des Projektes mit dem Auftraggeber erarbeiten und abstimmen
 - ø Liefer-, Leistungsumfang zur Erreichung der Projektziele abstimmen
 - ø Projektantrag und Projektauftrag erstellen und diesen prüfen und freigeben lassen
- § Ressourcen in Abstimmung mit den beteiligten Bereichen festlegen
- § Übernahme der verantwortlichen Leitung des Projekts, insbesondere bezüglich der Steuerung der inhaltlichen und terminlichen Ausgestaltung (managen von Qualität, Zeit, Kosten und Ressourcen)
- § Projekt planen, überwachen und steuern
 - ø Arbeitspakete definieren und Verantwortlichkeiten festlegen
 - ø Ein Planungs-, Überwachungs-, Steuerungs- und Informationssystem installieren
 - ø Alle am Projekt beteiligten Mitarbeiter und Stellen koordinieren
- § Entscheidungen vorbereiten und herbeiführen
- § Konfliktlösung bei der Projektabwicklung und Eskalation bei nicht in seiner Kompetenz liegenden Probleme
- § Transparenz über den Projektfortschritt für den Auftraggeber schaffen
 - ø Berichterstattung im Projekt Reporting (zur Zeit: ELSTAR, siehe 6.2)
- § Projektabschlussklärung und Projekterfahrungsbericht erstellen
- § Für Teilprojektleiter ein Projektleiter-Referenz ausstellen

7.4 Das Projektteam

Das Projektteam ist eine in der Aufgabenstellung angemessene Arbeitsgruppe, bestehend aus den Projektmitarbeitern. Das Projektteam arbeitet im Rahmen der freigegebenen Kapazitäten an der gestellten Aufgabe. Es wird speziell für ein Projekt gebildet und nach dessen Abschluss wieder aufgelöst. Die Projektmitarbeiter sind dem Projektleiter fachlich unterstellt.

Das Projektteam erarbeitet die für die Zielerreichung notwendigen Ergebnisse und ist verantwortlich für deren fachliche Qualität.

Mitarbeiter des Projektteams können innerhalb des Projekts die Rolle von **Arbeitspaketverantwortlichen** oder **Teilprojektleitern** übernehmen. Sie unterstützen den Projektleiter in der Feststellung des Projektfortschritts, in der Vorbereitung von Entscheidungen und in der Ausarbeitung von Lösungsalternativen.

7.5 Projektassistenz (Projektunterstützung)

Eine Projektassistenz ist eine dem einzelnen Projekt zugeordnete Funktion die den jeweiligen Projektleiter bei allen Themen der Abwicklung seines Projektes unterstützt.

Damit sich der Projektleiter auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann, ist bei umfangreichen Projekten der Einsatz von entsprechenden Projektassistenzen zu prüfen. (z.B. für Protokolle, Terminabsprachen, Präsentationsunterlagen, Tools etc.).

Qualifiziertes Personal für das Projektassistenzen kann beim ADAC Project Management Office angefragt werden.

8 Auswahl und Qualifizierung/Zertifizierung für Projektleiter

8.1 Ausgangslage und Zielsetzung

8.1.1 Ausgangslage

- § Die Bedeutung und Anzahl von Projekten nimmt kontinuierlich zu. Mit den Projekten sind in der Regel erhebliche finanzielle Risiken verbunden. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren sind die Kompetenzen der Projektleiter, die einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, ob Projekte erfolgreich abgeschlossen und die Projektziele erreicht werden.
- § Im Hinblick auf die Zielerreichung sowie die finanziellen Risiken, ist es für Projekte erforderlich, Projektleiter einzusetzen, die die entsprechende Ausbildung haben und die notwendigen Kompetenzen und Erfahrungen zur Führung derartiger Projekte mitbringen.
- § Mit dem Betriebsrat wurde eine Gesamtbetriebsvereinbarung "Auswahlverfahren und Qualifizierung für Projektleiter" geschlossen. Diese regelt das Auswahlverfahren für Projektleiter und Teilprojektleiter von Projekten/Teilprojekte und beschreibt das Sollkompetenz-Profil für Projektleiter im ADAC und zeigt die stufenweise Qualifizierung auf, die der Mitarbeiter für die Leitung eines Projektes durchlaufen muss.


8.1.2 Zielsetzung

- § In Zukunft soll sichergestellt werden, dass nur Personen die Projekt- und Teilprojektleitung für ein Projekt/Teilprojekt übernehmen dürfen, die über die entsprechenden Erfahrungen und Kompetenzen verfügen.
- § Projekte/Teilprojekte werden nur noch von Projektleitern verantwortet, die neben dem Nachweis von bislang erfolgreich beendeten Projekten auch in einem Projektleiter Assessment Center die Projektleiter-spezifischen Kompetenzen nachgewiesen haben und eine gültige, anerkannte Projektleiterzertifizierung abgeschlossen haben.
- § Schaffung eines Standards bei der Auswahl und Ausbildung von Projektleitern und Teilprojektleitern, um Projekte/Teilprojekte professionell steuern zu können.

8.2 Einstufung von Projekten und Anforderungen an Projektleiter/Teilprojektleiter

Es gilt die, wie in der unter 9.1.1 genannte Gesamtbetriebsvereinbarung ausgeführt, eine stufenweise Projektleiterqualifizierung im ADAC.

Demnach greift nachfolgender Prozess bezüglich Ausbildung, Einsatz und Nachweis für erfolgreiche Projektdurchführung.

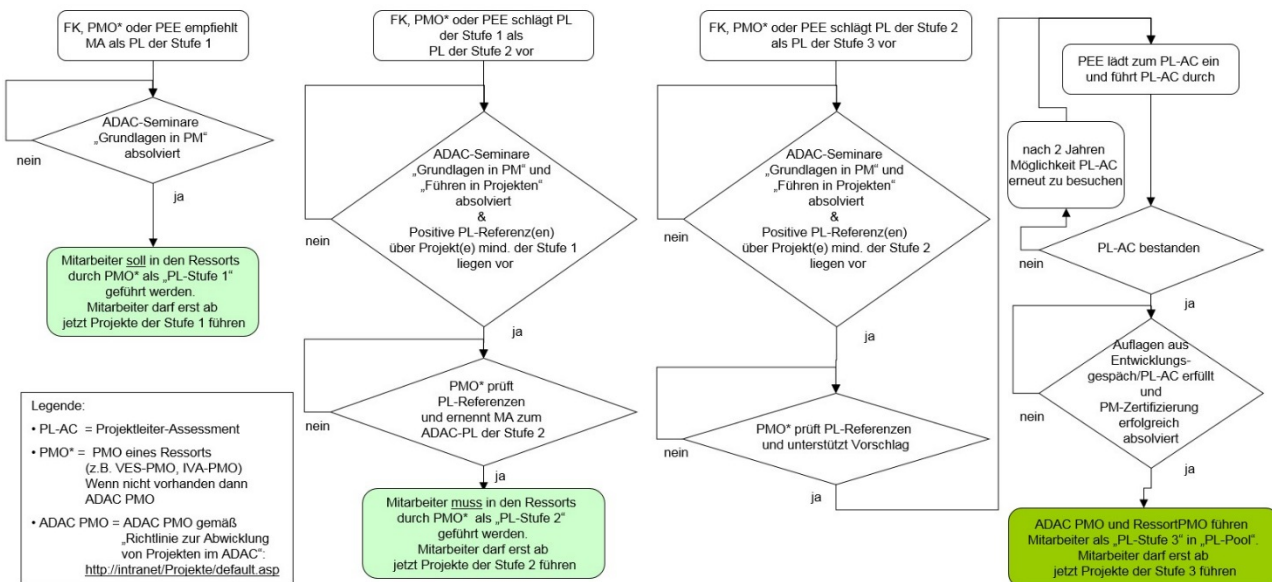

8.3 Entwicklungssystematik der Projektleiterauswahl für Projekte der Stufe 3

Führungskraft und Mitarbeiter besprechen im Rahmen des Mitarbeitergesprächs das Interesse und die Eignung für Projektleitung von Projekten der Stufe 3. Bei Interesse, Eignung und Erfüllung der Voraussetzungen wird dies im B2 Bogen vermerkt und von der Führungskraft an das ADAC PMO gemeldet. In der Personaldurchsprache*¹ werden die potenziellen Kandidaten besprochen.

Die in der Personaldurchsprache identifizierten neuen Kandidaten für Projektleitertätigkeiten der Stufe 3 nehmen nach Zustimmung in der Potenzialdurchsprache*² und in den entsprechenden Gremien der Fachbereiche an einem Projektleiter Assessment Center teil und werden hinsichtlich ihrer Kompetenzen für Projekte der Stufe 3 geprüft.

*¹ Die Personaldurchsprache ist ein Instrument im Rahmen der Entwicklungssystematik bei dem sich die Führungskräfte mit Personal über die Entwicklungen in ihrem Bereich bzw. ihren Mitarbeitern austauschen. Dies dient auch der Identifizierung der Potenzialkandidaten im Bereich.

*² In der Potenzialdurchsprache werden die in der Personaldurchsprache identifizierten Potenzialträger zusammengefasst und die weiteren Entwicklungsmaßnahmen festgelegt.

8.4 Einrichtung eines Projektleiterpools

Jeder Projektleiter sollte in einem Projektleiterpool geführt sein, um den gewünschten und erforderlichen Qualitätsstandard im Haus zu sichern.

Zielsetzung eines solchen Pools ist:

- § die Einstufung, das Potenzial des Projektleiters sowie die Projektleitungserfahrung (Benennung der bereits durchgeführten Projektleitungen) zu dokumentieren
- § den derzeitigen Ausbildungsstand zu kennen
- § eine bessere Einsatzplanung der Projektleiter und damit Kapazitätsplanung sicherstellen zu können
- § Bildungsmaßnahmen und Neuerungen zum Thema Projektmanagement empfängerorientiert platzieren zu können

Dieser Pool wird im Ressort PMO geführt, falls kein Ressort PMO vorhanden ist, übernimmt diese Aufgabe das ADAC PMO, sowie generell für Potentialkandidaten der Stufe 3 sowie Projektleiter der Stufe 3.

8.5 Neu eingestellte Mitarbeiter mit bereits vorhandener PL-Erfahrung, die außerhalb des ADAC erworben wurde

Mitarbeiter, die neu in/im ADAC eingestellt werden und Projekte der Stufe 3 leiten sollen, durchlaufen verpflichtend das hausinterne PL AC und verfügen über eine anerkannte Projektleiterzertifizierung bzw. holen diese nach.

Die hausinternen Qualifizierungsseminare zum Projektmanagement müssen nicht absolviert werden, wenn bereits vergleichbare Qualifikationen vorliegen. Die Projektmanagement-instrumente des ADAC muss der Kandidat kennen und anwenden können.

Unterstützung dazu erhält der Kandidat beim Ressort PMO / ADAC PMO.

8.6 Externe Projektleiter

Externe Mitarbeiter, die im ADAC ein Projekt der Stufe 3 leiten sollen, durchlaufen verpflichtend das hausinterne PL-AC und verfügen über eine anerkannte Projektleiterzertifizierung.

Die hausinternen Qualifizierungsseminare zum Projektmanagement müssen nicht absolviert werden, wenn bereits vergleichbare Qualifikationen vorliegen. Die Projektmanagementinstrumente des ADAC muss der Kandidat kennen und anwenden können.

Unterstützung dazu erhält der Kandidat beim Ressort PMO / ADAC PMO.

8.7 Projektmanagement Beratung, Mentoring, Projektleiter Coaching

Unterstützende Qualifizierungsmaßnahmen bei der Projektleitung können sein:

- Inhouse Mentoring durch erfahrene Projektleiter aus dem Haus sowie externe Projektmanagement Beratung speziell zur professionellen Durchführung eines größeren Projektes .Dies wird durch ADAC PMO organisiert.
- Persönlichkeitsentwickelndes Coaching für Projektleiter durch externe Coaches. Dies wird durch Personalentwicklung organisiert.

Als begleitende Unterstützung empfiehlt sich ab einer Projektleitung der Stufe 2, in jedem Falle ab Stufe 3, erfahrene Projektleiter/Führungskräfte oder einen Projektmanagement- Berater für die Projektbegleitung eines ersten Projektes der jeweiligen Stufe zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für die Entwicklungsmaßnahmen des Projektleiters werden im Rahmen der Linienverantwortung getragen.

Versionshistorie

Die **Versionsnummern** werden sequentiell hochgezählt. An Hand der Versionsnummer wird festgelegt, ob sich ein Dokument in Bearbeitung befindet oder freigegeben wurde. So bedeutet z.B. x.0, dass das Dokument freigegeben wurde. Eine Version x.y mit $y > 0$ bedeutet, dass sich das Dokument in Bearbeitung befindet (z.B. Version 1.3). Falls von einem Dokument in mehreren kleinen Schritten häufiger neue Versionen bis zur Freigabe erstellt werden, können für die Versionsnummer auch mehrere Nachkommastellen benutzt werden (z.B. Version 1.91).

Version	erstellt am	durch	Änderungen
Version 1.0	15.11.2016	J. Liebold, UNS W.Maertsch, UNS	Anlässlich der Überarbeitung im Rahmen der Säulentrennung wurden die seitherigen Richtlinien „Richtlinie zur Abwicklung von Projekten im ADAC“ und „Richtlinie zur Auswahl und Qualifizierung/Zertifizierung für Projektleiter im ADAC“ in einer Richtlinie zusammengefasst, sowie um die Aspekte der Auswahl und Qualifizierung/Zertifizierung für Projektleiter gekürzt, dessen Inhalte nun in der Gesamtbetriebsvereinbarung „Auswahlverfahren und Qualifizierung für Projektleiter“ enthalten sind.
Version 1.1	30.11.2017	J. Liebold, UNS	Einarbeitung folgender Beschlüsse: • Sitzung des Vorstand der ADAC SE vom 18.09.2017 (Top 2.4): Verrechnungsgrundsätze bei säulenübergreifender Zusammenarbeit (Projekte) • Sitzung des Vorstand der ADAC SE vom 23.10.2017 (Top 2.6): Projekte sind immer in den jeweiligen Einheiten gemäß Wertgrenze freizugeben

Dokument-Informationen

Autor(en):	Jens Liebold, UNS
Version:	1.1
vom:	06.12.2017
Freigabe durch:	Vorstand der ADAC SE
am:	11.12.2017
